



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.ค. 66

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเศรณี ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนและปักเสา บริเวณแหล่งปทุมมันคงดี-Disชั่วคราวบางปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สฟ.๒	๐๘/๐๗/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน,ปักเสา,พาดสาย เส้นเสียงเมืองบางปลาหมอ	DDE แพล้น ปทุมมันคงดี	Disชั่วคราว บางปลาหมอ	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ชง.๖ (สช.) โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเศรณี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 9A009 จาก DDE (พื้นที่ปทุมมันคงดี) ถึง DIS ชั่วครว บางปลาหมอ

ในวันที่ ๖ ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1014/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรวิทย์ เภมาฉิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ท.ช.น.ร. สุวรรณประทีป
29 มิ.ย. 66

(นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล)

จ.ศ.ก.๔ 1 แทน น.ท.ด.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แพลันปูนมันคังตี ถึง บางปลาหมอ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ค. 66	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	รีดออก, ปักเสา, พาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1014/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 29 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายมโนช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		- Load = 6.16 MW
3	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R Load = 0.5 MW
4	- ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB04						
5	DOA09S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
6	DIS ชั่วคราว SPB10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บางปลาหมอ
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	แจ้งขุดงานปลดโหลดออก ตั้งแต่ DIS ชั่วคราวบางปลาหมอ ถึง จุดตัด DDE แพลันปูนมันคังตี						
9	เมื่อขุดงานปลดโหลดออก ตั้งแต่ DIS ชั่วคราวบางปลาหมอ ถึง จุดตัด DDE แพลันปูนมันคังตี แล้วเสร็จ						
10	แจ้งขุด Hot Line 22kV ตัด DDE บริเวณ แพลันปูนมันคังตี ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
11	เมื่อขุด Hot Line 22kV ตัด DDE บริเวณ แพลันปูนมันคังตี ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้ง กฟจ.สพ Test ไฟ Shot Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟจ.สพ Test ไฟ Shot Ground จุด G2						
15	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ Shot Ground ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติงานได้						
16	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
17	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R วัดพันตำลึง
** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า **							
18	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
19	แจ้ง กฟจ.สพ ปลด Shot Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟจ.สพ ปลด Shot Ground จุด G2						
21	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
22	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R วัดพันตำลึง
23	แจ้งขุด Hot Line 22kV เชื่อม DDE บริเวณ แพลันปูนมันคังตี เข้าทั้ง 3 เฟส						
24	เมื่อขุด Hot Line 22kV เชื่อม DDE บริเวณ แพลันปูนมันคังตี เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
25	- ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนกลับจาก SPB09						
26	DIS ชั่วคราว SPB10	ปลด	สับ		สพ.		DIS บางปลาหมอ
27	DOA09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	
29	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	วัดพันต่ำลิ่ง
** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ป.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖


ด้วยในวันที่...๘...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...แฉล้มปูนเส้นเสียงเมือง-Disชั่วคราวบางปลาหมอ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ๒... ตั้งแต่บริเวณ ..แฉล้มปูนเส้นเสียงเมือง-Disชั่วคราวบางปลาหมอ

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ปรีชา ทองระย้า ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๐-๑๔๓๕๑๑๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๘-๒๗๕๓๖๔๐..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

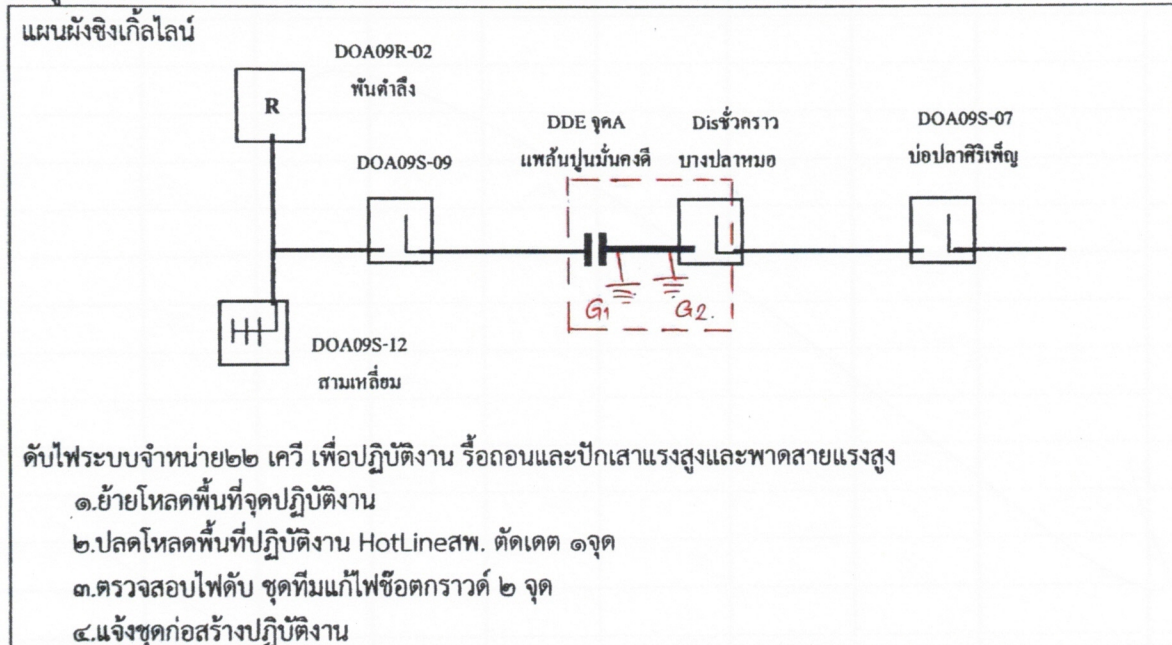

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเขต ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊สไฟช็อตกราวด์ ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคร์เดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.สพ. ถึง ผจก.สพ.
เลขที่ ก.ทกฟง.คพ.๒๕๖๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ฉบับ

เรียน ผจก.สพ./ทผ.กส.

ตามอนุมัติที่ ก.ทสพ.(กส.)๐๐๐๒๖๔/๖๔ ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้าง
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูงระบบ ๒๒ เควี ป.ป.สถานีสุพรรณบุรี ๒ ถึง สะพาน
สามเหลี่ยม ช่วงที่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง ตรงข้ามปากทางเข้าวัดบางปลาหมอ ถึง ร้าน
ประสานโต๊ะจีน WBS P-TDD๐๒.๓-I-SPINA.๐๐๐๙ พง. ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า โทร
๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔

ปัจจุบันแผนกก่อสร้างได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

๑. พาดสาย AERIAL CABLE ขนาด ๑๘๕ มม. ๒ วงจร ระยะทาง ๑.๒๕ วงจร-กม.(ระยะที่ ๒)
๒. ถอนเสาแรงสูง ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน ๓๐ ต้น (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)
๓. ปักเสาแรงสูง ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมตอม่อ จำนวน ๓๐ ต้น (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)

ขอทูลกระเข้า กฟจ.สพ. ปลดไลน์ และ เชื่อมไลน์ เข้าในระบบ

ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ ตามวันและเวลาดังนี้

ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผ.บ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว
 - ดำเนินการ ตัดกระแสไฟฟ้าและช็อตกราวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย
- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายธนกฤต พวงดอกไม้)

ช.ผ.กส.กฟจ.สพ.

อนุมัติ

-ทผ.ป.บ.สพ.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทนผจก.สพ.

ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖
