


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บิ๊กเสาระบบสายส่งแรงสูงขนาด ๒๒ เมตร ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน = ๒ = แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	SMV๐๓	๓ มิ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ชุด ผศส.กทบ. และชุด งานช่างไฟกร. บิ๊กเสาระบบ สายส่ง ๑๓๕ เควี และชุด งาน ผศส.กทบ. ย้ายสายแรง สูงระบบ ๒๒ เควี เข้าเสไฟฟ้า บริเวณใบระกา หมู่ ๑๖ กิ่ง อำเภอวังน้ำเขียว นครเขื่อน	VE๑ SMV ๐๓๑ ๐๕	DIS ชั่วคราว (D.๑) ปากซอย คลองมะเดื่อ ๑๗/๙'	นายวิชา แก้วสัมพันธ์ หม.กส.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๕๔๕๔๓	
๒	KTA๐๒	๓ มิ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DE๑ KTA ๐๒5 ๑๐	DIS ซอยข้างวัดใหม่ คลองมะเดื่อ		DIS KTA ๐๒5 ๑๒ เมือง ผญ.ชาญ DIS ชั่วคราว (D.๒)
๓	KTE๐๕	๓ มิ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สแยก รร.บ้าน ดอน	SI ๖ KTA๐๕5 ๐๑' ตรงข้ามโอเอเซียน DIS KTE๐๕5-๐๘ ปากซอย รร.บ้านดอน		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๒๐๐ ราย จากการดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๕๔๕๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรุด ผศส.กส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-3 ฟีดเดอร์SMV 3
KTA 2
KTESSMV 35-05
KTA 25-11
DIS ๒๐หม.กส. 19/9
KTA 25-12
KTE 55-09

ในวันที่ 3 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1078/2565

[] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **นครินทร์ อธิสภานันท์** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **หม.สมชาย มาบัณฑิตย์**(**นครินทร์ อธิสภานันท์**)
๐๘๓. 61๓4 พว. ๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. **หม.อ. ๕๑.**, **หม.อ. กทบ.**

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกโรงเรียนบ้านดอน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1078/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวาศิน			วันที่	27 มิถุนายน 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 มิถุนายน 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 มิถุนายน 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายจนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SMV-TP1	"OI TC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
3	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
4	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
5	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
6	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
7	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
8	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
9	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTL		
10	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTL		
11	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
12	ย้ายโหลดวงจร KTE05 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMV05						
13	KTE05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานโอเอเซียน
14	SMV03S-10	ปลด	สับ		สค.		ตลาดนัดก่อนซอยต้นรวงทอง
15	KTE05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		ปากซอย รร.บ้านดอน
16	KTE05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานโอเอเซียน
17	ย้ายโหลดวงจร SMV03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMV02						
18	DIS ชค. SMV02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เยื้องปากซอย ม.บัวศรี
19	DIS ชค. SMV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ปากซอยคลองมะเดื่อ 17/9
20	ย้ายโหลดวงจร KTA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก KTE10						
21	KTA02S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 โค้งมะขวิด
22	KTA02S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ริม ถนนสายไยรัก
23	DIS ชค. KTA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS สี่แยก รร.บ้านดอน
24	KTA02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ริม ถนนสายไยรัก
25	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	KTA02S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	ปากซอยวัดใหม่คลองมะเดื่อ
27	DIS ชค. KTE05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	เชิงสะพานสี่แยก ๖๖.บ้านดอน(ริมคลอง)
28	SMV03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ปากซอย กม.12
29	แจ้ง Hot Line กระเช้าทำการปลดจุดจัม ก่อนเข้า SMV03S-05 ตามผังแนบ							
30	หลังจาก Hot Line กระเช้าทำการปลดจุดจัม ก่อนเข้า SMV03S-05 ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย							
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กทบ. รับทราบ							
32	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
33	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
34	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
35	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
36	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
37	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
38	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7							
39	แจ้งให้ กฟอ.กทบ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
40	แจ้ง กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
41	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV			
42	SMVBR-02	Nonreclosing, AI T	Normal		SMV			
43	SMVBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV			
44	SMVBR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV			
45	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
46	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
47	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
48	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
49	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
50	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****								
51	หลังจาก กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
52	เมื่อ กฟอ.กทบ. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยัน We Safe							
53	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV			
54	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV			
55	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV			
56	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV			
57	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA			
58	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			
59	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE			
60	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE			
61	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
62	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
64	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
65	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
66	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก						
67	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลด Short ground จุด G5 ออก						
68	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลด Short ground จุด G6 ออก						
69	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลด Short ground จุด G7 ออก						
70	- จ่ายไฟ						
71	แจ้ง Hot Line กระจายทำการจุ่มจุดจุ่ม ก่อนเข้า SMV03S-05 ตามผังแนบ						
72	หลังจาก Hot Line กระจายทำการจุ่มจุดจุ่ม ก่อนเข้า SMV03S-05 ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
73	KTA02S-11	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ปากซอยวัดใหม่คลองมะเดื่อ
74	DIS ชค. KTE05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เซิงสะพานสี่แยก รร.บ้านดอน(ริมคลอง)
75	SMV03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากซอย กม.12
76	ย้ายโหนดวงจร KTA02 บางส่วน กลับจาก KTE10						
77	KTA02S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ริม ถนนสายไยรัก
78	DIS ชค. KTA02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS สี่แยก รร.บ้านดอน
79	KTA02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ริม ถนนสายไยรัก
80	KTA02S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 โค้งมะขวิด
81	ย้ายโหนดวงจร SMV03 บางส่วน กลับจาก SMV02						
82	DIS ชค. SMV03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ปากซอยคลองมะเดื่อ 17/9
83	DIS ชค. SMV02	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เยื้องปากซอย ม.บัวศรี
84	ย้ายโหนดวงจร KTE05 บางส่วน กลับจาก SMV05						
85	KTE05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานโอเซียน
86	KTE05S-08	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ปากซอย รร.บ้านดอน
87	SMV03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตลาดนัดก่อนซอยตันรวงทอง
88	KTE05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานโอเซียน
89	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
90	SMVBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
91	SMVBR-03	Nonreclosing, ALI	Normal		SMV		
92	SMVBR-05	Nonreclosing, ALI	Normal		SMV		
93	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
94	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
95	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
96	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
97	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
98	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		

***** สิ้นสุด Switching *****

แผนผัง ก้อนดับไฟ บริเวณตั้งแต่ปากกม.๑๒ (ฝั่งซ้ายมือ) ถึงปากซอยคลองมะเดื่อ ๑๗/๕ และตั้งแต่หน้าวัดใหม่คลองมะเดื่อ ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านคอน
 เพื่อให้ ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานปักเสาระบบสายส่งแรงสูงขนาด ๒๒ เมตรเข้าสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ สุวรร
 ขอดับไฟวันอาทิตย์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามอนุมัติที่ กฟ.๒(สร)-๑๐๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕ WBS:P-TDD02.1-I-KTNT0.0003)

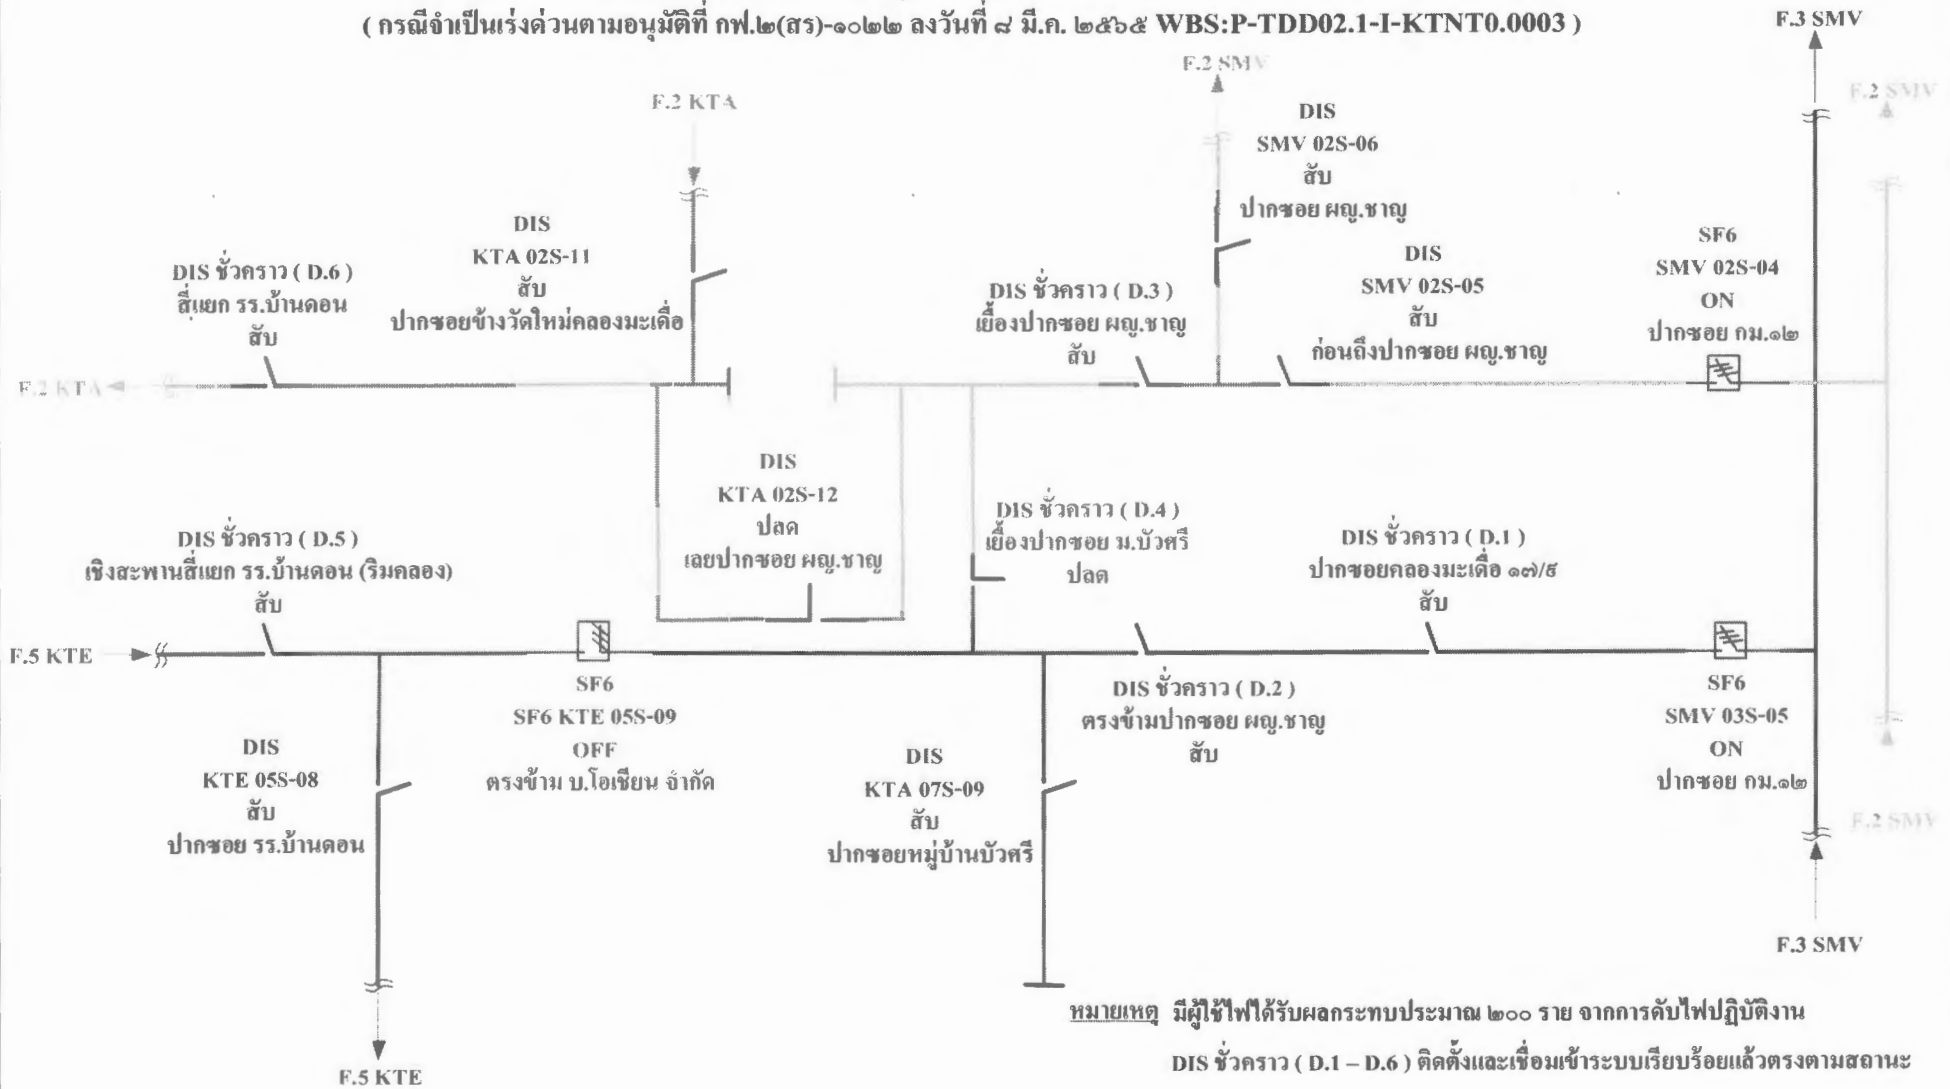

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณตั้งแต่ปากกม.๑๒ (ฝั่งซ้ายมือ) ถึงปากซอยคลองมะเดื่อ ๑๗/๕ และตั้งแต่หน้าวัดใหม่คลองมะเดื่อ ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านดอน เพื่อให้ ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานบักเสาระบบสายส่งแรงสูงขนาด ๒๒ เมตรเข้าสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐ ฐานาร
 ขอดับไฟวันอาทิตย์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามอนุมัติที่ กฟ.๒(สร)-๑๐๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕ WBS:P-TDD02.1-I-KTNT0.0003)

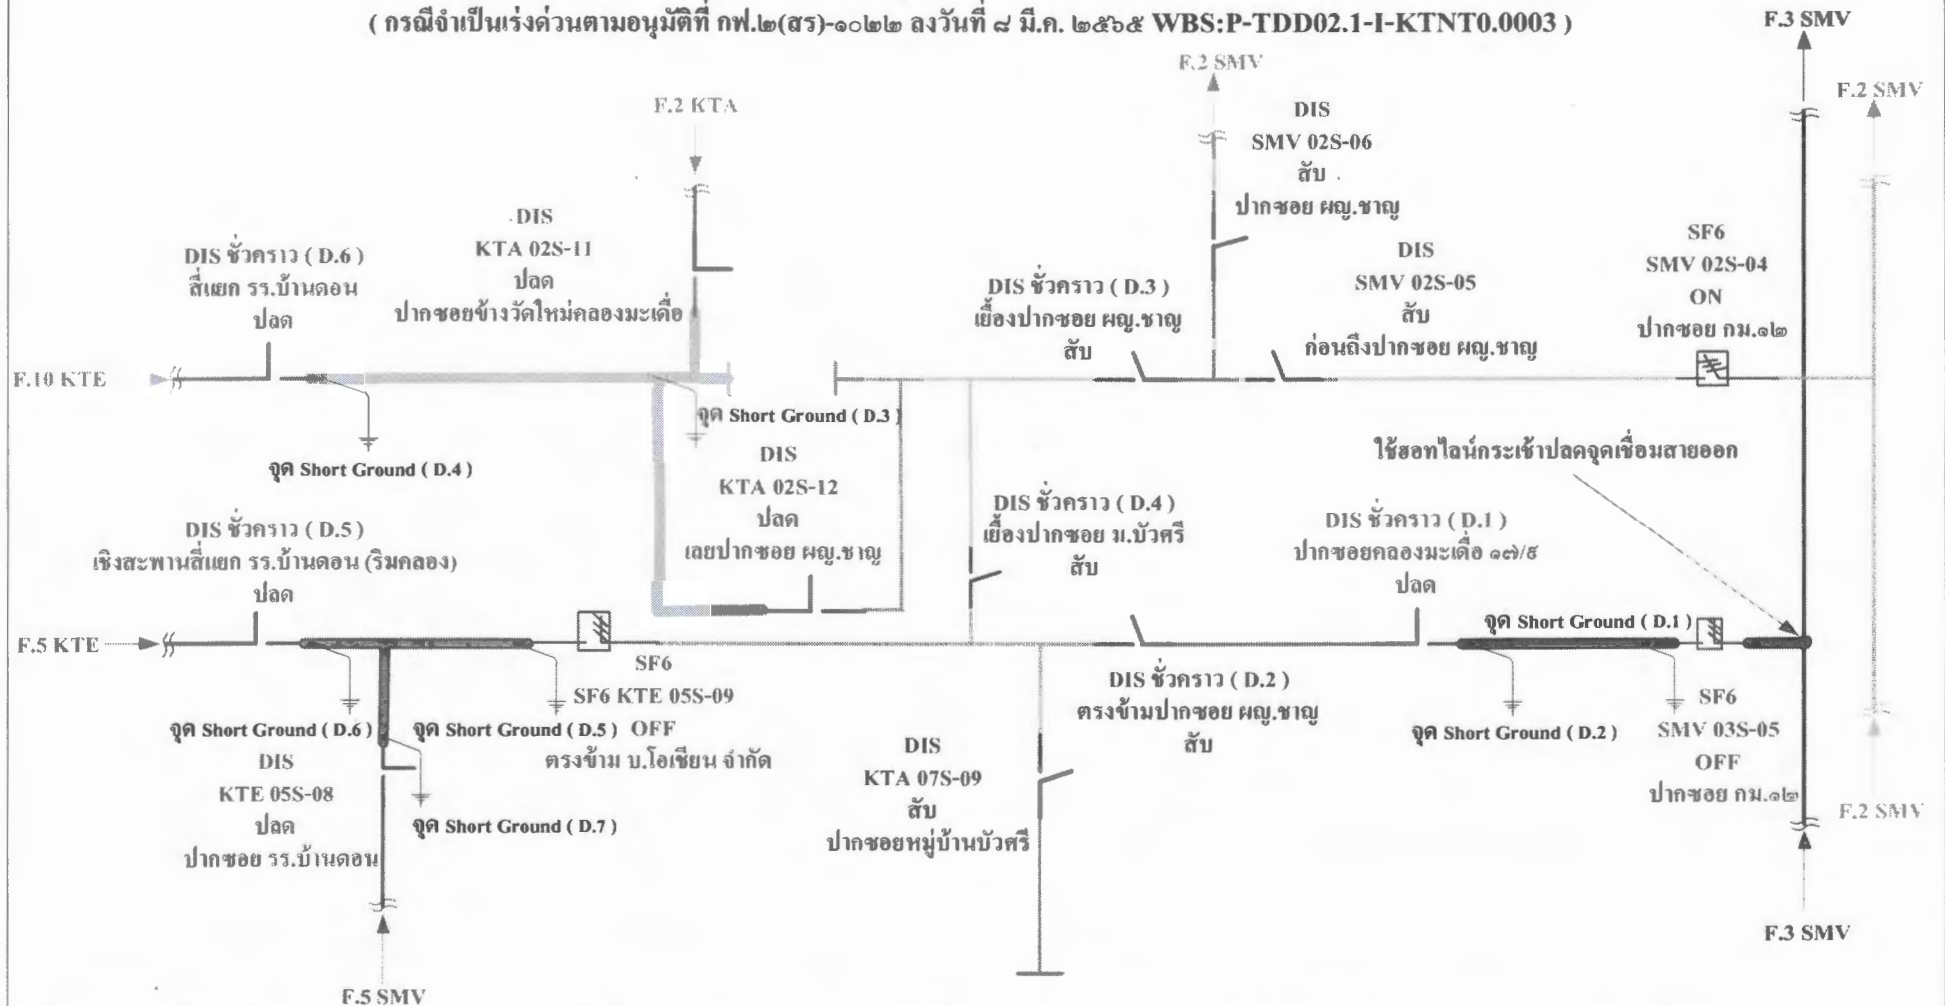

หมายเหตุ มิใช่ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๒๐๐ ราย จากการดับไฟปฏิบัติงาน
 DIS ชั่วคราว (D.1 - D.6) ติดตั้งและเชื่อมเข้าระบบเรียบร้อยแล้วตรงตามสถานะ
 จุด Short Ground (D.1 - D.7)

หมายเหตุ

- เส้นทึบสีน้ำเงิน ไลน์วงจรฟีดเดอร์ ๓ สค.๑๐ ดับไฟปฏิบัติงาน
- เส้นทึบสีเหลือง ไลน์วงจรฟีดเดอร์ ๒ กทบ.๑ ดับไฟปฏิบัติงาน
- เส้นทึบสีฟ้า ไลน์วงจรฟีดเดอร์ ๕ กทบ.๕ ดับไฟปฏิบัติงาน
