



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.) 689/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณเชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 11 ก.ค. 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูงบริเวณวงจร DBA01 ตามแผนผังสังเขปแนบ

จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี DBA01	26 ก.ค. 66 26 ก.ค. 66	08.30 น. 08.30 น.	15.30 น. 15.30 น.	ปักเสา/ถอนเสาแรงสูง บริเวณตรงข้ามวัดผาโถ	DBA1YS-03 เปิดนายเอี่ยม จุดปลดเตตตรงข้ามวัดผาโถ (ฮล.สุพรรณ)	DAA1S-03 สถานี ด้านข้าง DISชั่วคราว บ้านท่าข้าม	นายศักรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 2,3 ต.หัวนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ขพ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก DBA1YS-03 ถึง DAA1YS-07
ในวันที่ 26 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1081/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA01 จาก จุดตัด DE ตรงข้ามวัดผาโถ ถึง DIS ชั่วคราว บ้านท่าข้าม.
ในวันที่ 26 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
พนักงานศูนย์ฯ นาย ปุณทอง ฟ้าอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ รจก.วรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. ดบ.

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ เปิดนายเอี่ยม-สถานีฯด่านช้าง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 15.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสา 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1081/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัฒน์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
4	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
5	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาศิรี
6	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA.		
7	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
8	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
9	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	ก่อนถึงสถานีฯเดิมบาง
10	ย้ายโหลด DBA 1 ไปจ่ายจาก DAA 4						
11	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
12	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หัวนา
13	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
14	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS บ้านท่าข้าม
15	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
16	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
17	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
18	-ตรวจสอบ DBA1YS-03 LBS 115 KV ว่าไม่ไขว้ LOW GASS						
19	DBA01YB-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	LBS	เปิดนายเอี่ยม
20	-ตรวจสอบ เบรกเกอร์ DAA01YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
21	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
22	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
23	แจ้งช่างกฟอ.ดบ. โหลดใหม่แปลงในไลน์ ตั้งแต่จุดตัดเตส- DISชั่วคราวบ้านท่าข้าม ออกทั้งหมด						
24	หลังจาก กฟอ.ดบ. โหลดใหม่แปลงในไลน์ ตั้งแต่จุดตัดเตส- DISชั่วคราวบ้านท่าข้าม ออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
25	แจ้งHL.สพ. ตัดเตสบริเวณตรงข้ามวัดผาไถ ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	หลังจากHL.สพ. ตัดเดสบริเวณตรงข้ามวัดผาโถ ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
27	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
28	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
29	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
30	หลังจาก กพอ.ตบ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
31	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ตบ.	SCADA	ก่อนถึงสถานีฯเดิมบาง
32	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
33	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
34	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
35	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ตบ.	SCADA	R เขาศิรี
36	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA.		
37	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
38	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
40	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
41	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
42	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
43	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
44	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ตบ.	SCADA	ก่อนถึงสถานีฯเดิมบาง
45	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
46	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
47	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
48	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ตบ.	SCADA	R เขาศิรี
49	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA.		
50	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
51	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
52	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
53	แจ้งHL.สพ. จั้มเดสบริเวณตรงข้ามวัดผาโถ เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ						
54	หลังจากHL.สพ. จั้มเดสบริเวณตรงข้ามวัดผาโถ เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
55	แจ้งช่างกพอ.ตบ.นำโหด หม้อแปลงในไลน์ ตั้งแต่จุดตัดเดส- DISชั่วคราวบ้านท่าข้าม เข้าทั้งหมด						
56	หลังจาก กพอ.ตบ. นำโหด หม้อแปลงในไลน์ ตั้งแต่จุดตัดเดส- DISชั่วคราวบ้านท่าข้าม เข้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
57	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
58	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
59	-ตรวจสอบ DBA1YS-03 LBS 115 KV ว่าไม่โชว์ LOW GASS						
60	DBA01YB-03	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		ตบ.	LBS	เปิดนายเข็ม
61	ย้ายโหด DBA 1 กลับจาก DAA 4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หัวนา
63	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
64	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		DIS บ้านท่าข้าม
65	DBA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
66	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
67	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
68	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
69	DBA-KT2A/3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
70	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
71	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
72	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA.		
73	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
74	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
75	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	ก่อนถึงสถานีฯ เดิมบาง
76	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาแรงสูง
 สายส่ง 115 เควีตั้งแต่ DBA1YS-03 โหลดเบรคเปิดนายเย็ม ถึง DAA1YB-01 สถานีด้านซ้าย
 วงจร DBA 01 ตั้งแต่จุดปลดตัดตรงข้ามวัดฝักโล่ ถึง DISชั่วคราวบ้านท่าข้าม

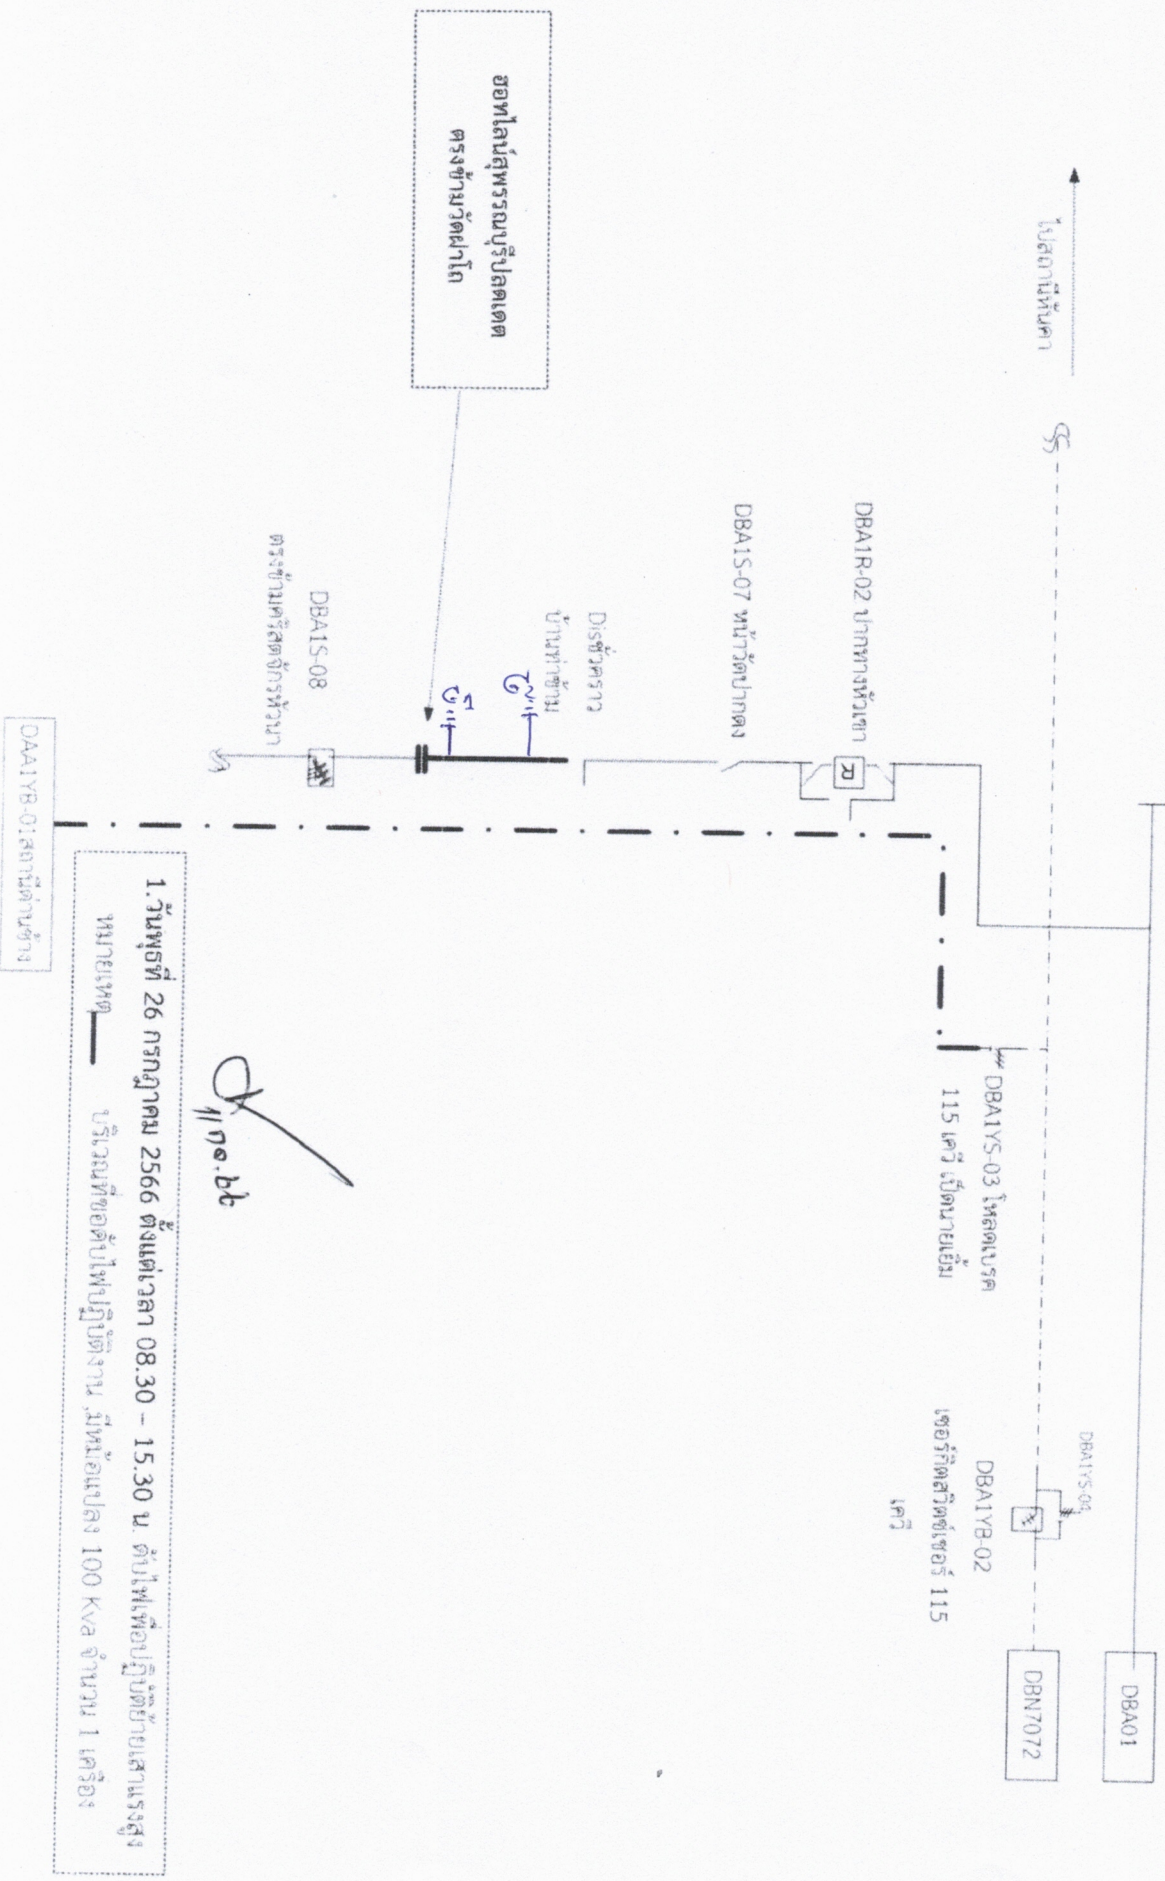

Signature

1. วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาแรงสูง
 หมายเหตุ - ปริมาณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีหม้อแปลง 100 Kva จำนวน 1 เครื่อง

DAA1YB-01 สถานีด้านซ้าย
