




หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าวัดป่าเลไลยก์ (KCC03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4, 18 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1106/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	19 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
3	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	-
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	TTNBR-02, 03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	-
6	ย้ายโหลดดวงจร KCC03 บางส่วน ไปรับไฟจาก TTN02						
7	KCC03S-08	ปลด	สับ		ลญ.	SF6	หน้า สนง.ลาดหญ้า
8	KCC03S-06	ปลด	สับ		ลญ.	SF6	บ้านโป่งกระต่าย
9	Dis. โล้น KCC03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.	DIS	ชั่วคราว ตรงข้ามเขาสอนไก่
10	KCC03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.	SF6	หน้า สนง.ลาดหญ้า
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	Dis. โล้น KCC03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.	DIS	ชั่วคราว ร้านอาหารตามสั่ง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
18	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	-	-
19	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	TTNBR-02, 03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	R	-
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 4, 18 ส.ค. 66) *****							
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 4, 18 ส.ค. 66)						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
25	หลังจากผู้ควบคุมงานทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
26	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
27	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	-
28	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	TTNBR-02, 03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R	-
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
31	Dis. ไลน์ KCC03	ปลด	สับ		ลญ.		DIS	ชั่วคราว ร้านอาหารตามสั่ง
32	ย้ายโหลดวงจร KCC03 บางส่วน กลับจาก TTN02							
33	KCC03S-08	ปลด	สับ		ลญ.		SF6	หน้า สนง.ลาดหญ้า
34	Dis. ไลน์ KCC03	ปลด	สับ		ลญ.		DIS	ชั่วคราว ตรงข้ามเขาชนไก่
35	KCC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6	บ้านโป่งกระท้าย
36	KCC03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6	หน้า สนง.ลาดหญ้า
37	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC			
38	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-	-
39	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
40	TTNBR-02, 03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (วันที่ 4, 18 ส.ค. 66) *****								

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

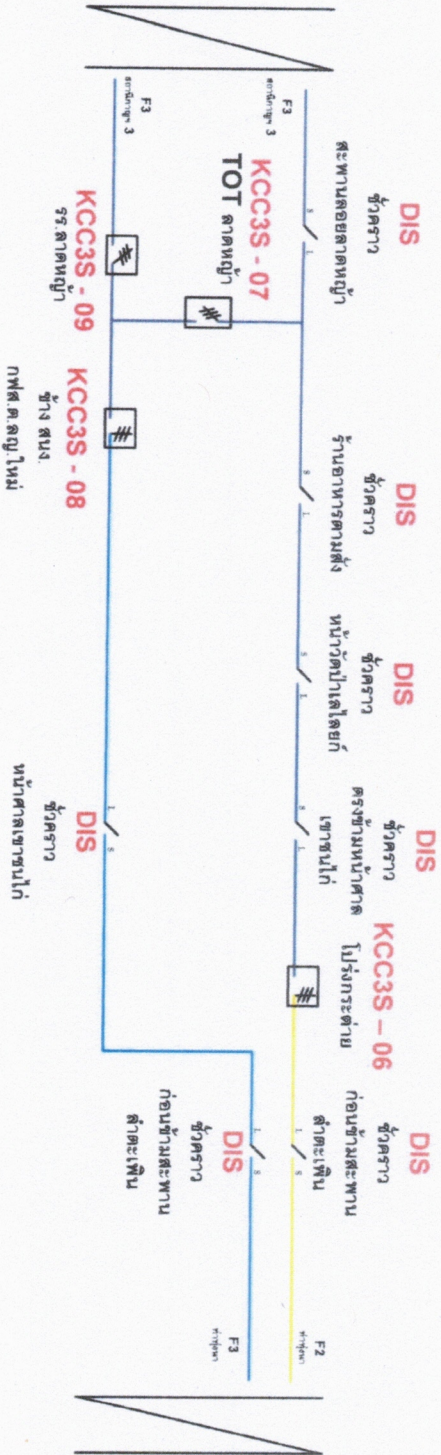

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

