



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๑๕๙/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสูกรี

## วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

Switching Deadline

10 ส.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งตรงข้ามวงจร KTE๐๔) สถานีไฟฟ้า กระทบแบบ ๕ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๔ SM๑ KTE ๑๐	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายใยรัก (ฝั่งตรงข้ามวงจร KTE๐๔)	ปากทาง ถนนสายใยรัก - ตอนไถ่ดี ซอย ๔ (ท้ายซอยมงคล)	เสาไฟต้น DDE ถัดจาก บริษัท ออคิด เลข จำกัด	นายพนพร ชาวไชยศรี ท.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ปากทาง ถนนสายใยรัก - ตอนไถ่ดี ซอย ๔ (ท้ายซอยมงคล) จนถึง เสาไฟต้น DDE ถัดจาก บริษัท ออคิดเลข จำกัด มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๑๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat, Long : ๑๓.๖๔๘๕๑๓, ๑๐๐.๒๖๓๕๑๗  
๓.๒ สิ้นสุด Lat, Long : ๑๓.๖๔๗๑๖๐, ๑๐๐.๒๖๔๙๔๔

(นายมาโนช วาสูกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTE10 จาก Dis.ร.ก.ถนนสายใยรัก SM๑4S-04, ปลายวงจร ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1136/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SM๑4 จาก DDE ถนนสายใยรัก ถึง DPE ปากซอยมงคล ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เทียงแดง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.พนพร ชาวไชยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก. กฟส.กทบ.

(นายมาโนช วาสูกรี)  
ท.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น  
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก๓)


หน้า 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนสายไยรัก (KTE10, SMJ04)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1136/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง					วันที่	6 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	6 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	6 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ	-	-
3	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ	-	-
4	SMJ04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	Load = 1.9 MW
5	SMJ09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	-	
6	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	
7	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
8	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	Load = 2.2 MW
9	ย้ายโหลด SMJ04 บางส่วนไปรับไฟจาก KTA02						
10	SMJBVB-01	ปลด	สับ		SMJ	-	ขนานบัส
11	KTA02S-08	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 แยกศาลฟอปปู
12	KTA02S-10	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 रिमถนนสายไยรัก
13	KTE10S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามหมู่บ้านล้อมสุข
14	KTA02S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 แยกศาลฟอปปู
15	SMJBVB-01	สับ	ปลด		SMJ	-	ขนานบัส
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	Dis.ไลน์ KTE10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชั่วคราว ก่อนแยกหนองรี
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลด วงจร SMJ04 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออก						
19	หลังจากทำการปลดโหลด วงจร SMJ04 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออก เรียบบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร SMJ04 บริเวณก่อนแยกหนองรี (วงจรบน ตามแผนผัง) ออก						
21	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร MJ04 บริเวณก่อนแยกหนองรี (วงจรบน ตามแผนผัง) ออก เรียบบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลดจุดเชื่อมสาย วงจร SMJ04 บริเวณต้นบักอาร์มแยกหนองรี (ตามแผนผัง) ออก						
23	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร SMJ04 บริเวณต้นบักอาร์มแยกหนองรี (ตามแผนผัง) ออก เรียบบร้อย						
24	จ่ายไฟวงจร SMJ04 ถึง DDE วงจร SMJ04 บริเวณก่อนแยกหนองรี (วงจรบน ตามแผนผัง)						
25	KTE10S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามหมู่บ้านล้อมสุข
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
30	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบบร้อยแล้ว						
31	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ	-	
32	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
33	SMJ04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	
34	SMJ09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	
35	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	
36	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	
37	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	
38	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้</b>							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
39	<b>หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>							
40	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1							
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2							
42	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3							
43	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
44	SMJ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-	
45	SMJ-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMJ		-	
46	SMJ04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-	
47	SMJ09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ		-	
48	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-	
49	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	
50	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	
51	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>							
52	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อมสาย วงจร SMJ04 บริเวณต้นบักอาร์มแยกหนองรี (ตามแผนผัง) เข้า							
53	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมสาย วงจร SMJ04 บริเวณต้นบักอาร์มแยกหนองรี (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย							
54	<b>ดับไฟวงจร SMJ04 เชื่อม DDE วงจร SMJ04 บริเวณก่อนแยกหนองรี (วงจรถน ตามแผนผัง)</b>							
55	KTE10S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	ตรงข้ามหมู่บ้านล้อมสุข
56	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร SMJ04 บริเวณก่อนแยกหนองรี (วงจรถน ตามแผนผัง) เข้า							
57	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE วงจร SMJ04 บริเวณก่อนแยกหนองรี (วงจรถน ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย							
58	Dis.ไลน์ KTE10	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ชั่วคราว ก่อนแยกหนองรี
59	<b>ย้ายโหลด SMJ04 บางส่วนกลับจาก KTA02</b>							
60	SMJBVB-01	ปลด	สับ		SMJ		-	ขนานบัส
61	KTA02S-08	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	แยกศาลพ่อบู่
62	KTE10S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ตรงข้ามหมู่บ้านล้อมสุข
63	KTA02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ริมถนนสายไยรัก
64	KTA02S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	แยกศาลพ่อบู่
65	SMJBVB-01	สับ	ปลด		SMJ		-	ขนานบัส
66	SMJ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-	
67	SMJ-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMJ		-	
68	SMJ04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	
69	SMJ09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ		-	
70	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	
71	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	
72	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								


แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณ ถนนสายไยรัก - ดอนไม้ไต้ ซอย 4 (ท้ายซอยมงคล)  
 ตั้งแต่ ปากทาง ถนนสายไยรัก - ดอนไม้ไต้ ซอย 4 (ท้ายซอยมงคล) จนถึง เสาไฟต้น DDE ถัดจาก บริษัท ออคิดเลข จำกัด  
 เพื่อให้ช่างงาน ผกส.ภพส.ททบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายไยรัก (ฝั่งตรงข้ามจร KTE04)  
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

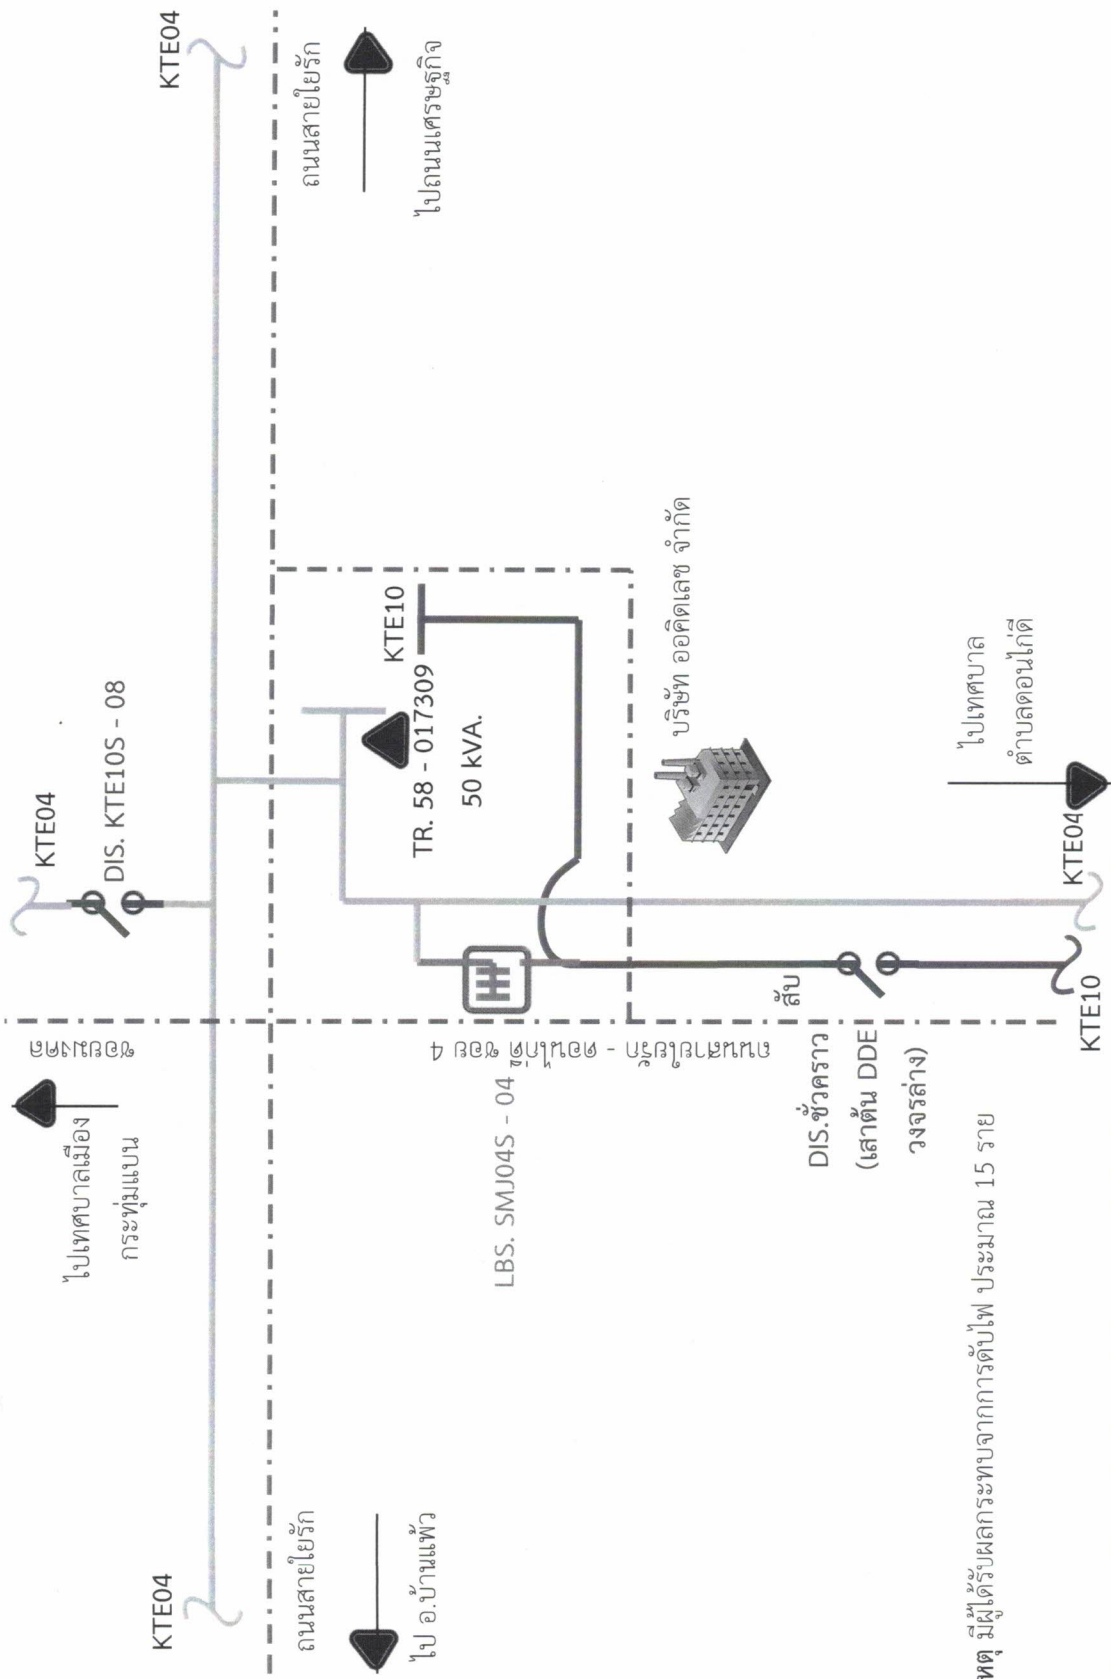

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 15 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังตัดไฟ บริเวณ ถนนสายไยรัก - ดอนไม้ไต้ ซอย 4 (ท้ายซอยมงมงคล)  
ตั้งแต่ ปากทาง ถนนสายไยรัก - ดอนไม้ไต้ ซอย 4 (ท้ายซอยมงมงคล) จนถึง เสาไฟต้น DDE ถัดจาก บริษัท ออคิดเลข จำกัด  
เพื่อให้ชุดงาน ผกส.ภท.บ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนสายไยรัก (ฝั่งตรงข้ามจร KTE04)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

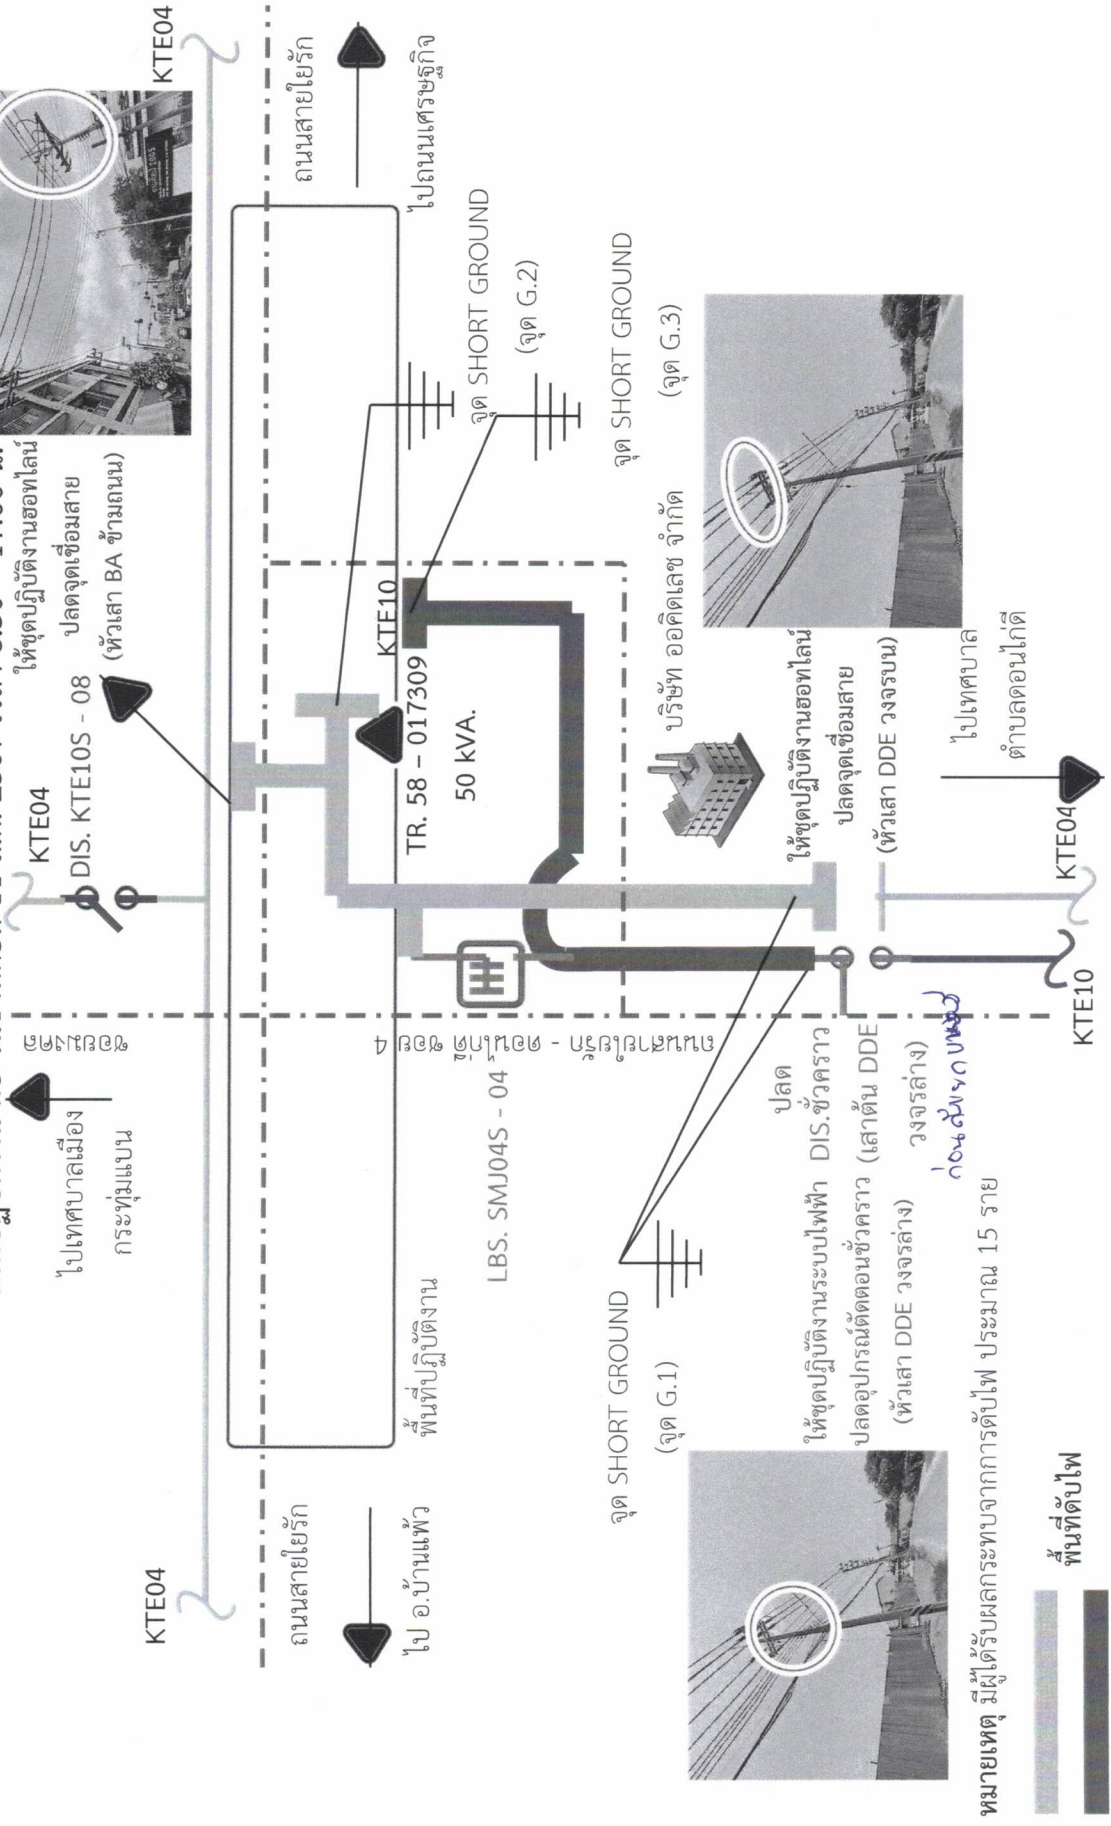

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 15 ราย

พื้นที่ปฏิบัติงาน  
พื้นที่ตัดไฟ
