



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGULATORY ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 830/2567

วันที่ 23 ส.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DAA๐๕ เพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานพาดสายแรงสูง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA 05	3 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง หลัง DAA5R-01	DAA5R-01 หนองหิน	ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่	นายศันรินทร์ แก้ว ปานกัน โทร.080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 3 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.875703... Long: ...99.848629.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.89532... Long: ... 99.838016.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA5 จาก DAA5R-01 ถึง ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่
ในวันที่ 3 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1220/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนิธา ราชภูมิเยี่ยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ศรี

(นายศันรินทร์ แก้วปานกัน)
ร.จก.5 แทน ผจก.กฟอ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๑๗

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

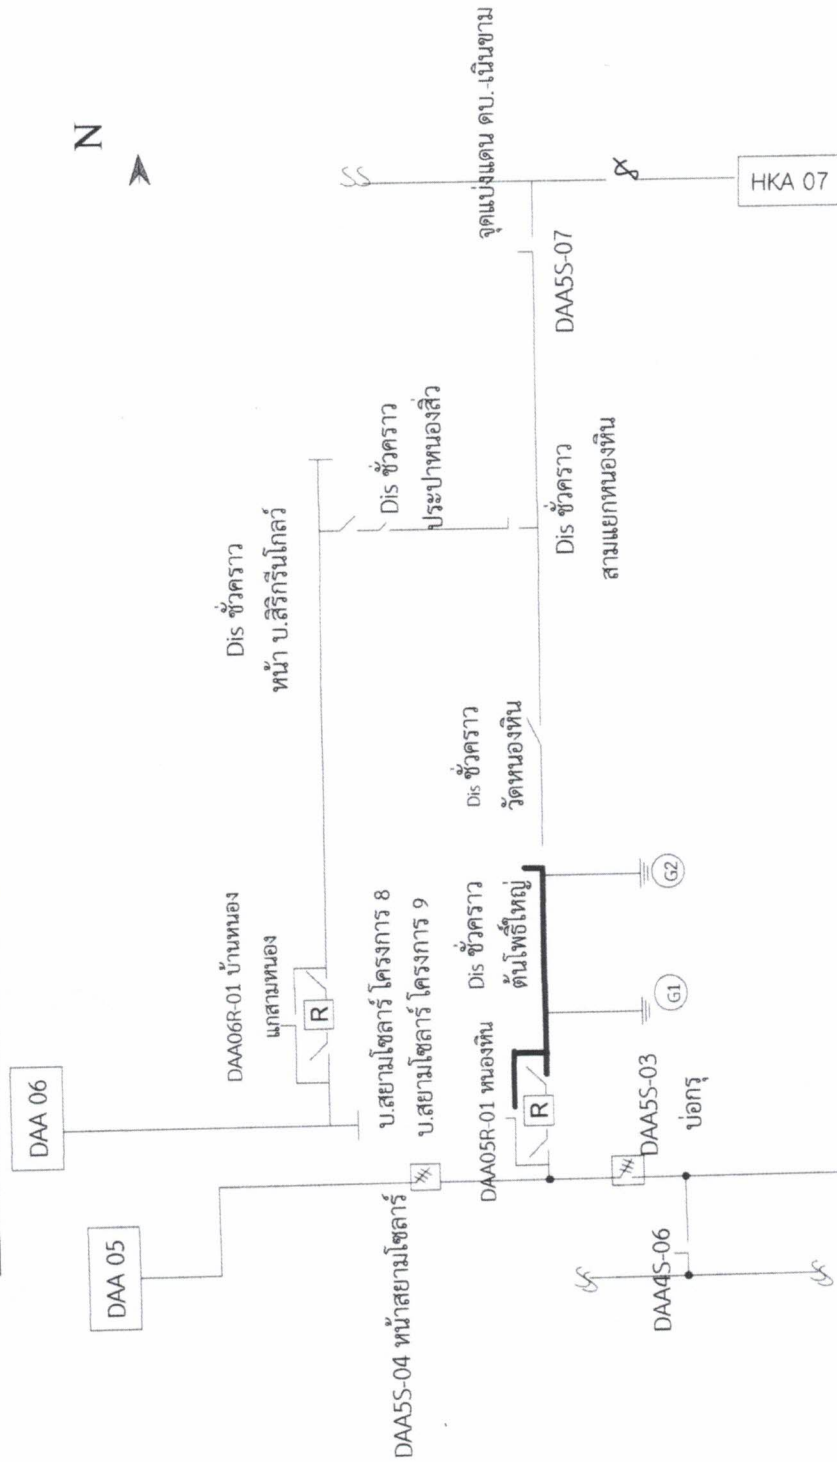
1. สถานที่ทำงาน	หนองกระทุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1220/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชกรัณิยม				วันที่	27 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	27 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	27 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DAA05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.		R หนองหิน
5	DAA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
6	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน ผ่าก DAA06						
7	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
8	DIS ชค. DAA6	ปลด	สับ		ดบ.		DIS สามแยกหนองหิน
9	DIS ชค. DAA5	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ต้นโพธิ์ใหญ่
10	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
12	DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.		R หนองหิน
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดใบมีดด้าน Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) ออกทั้ง 3 เฟส						
14	ตรวจสอบ Sw. Bypass ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุดจุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุดจุด G2						
17	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
18	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
19	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
20	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
21	DAA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
23	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
24	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
25	DAA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดช.		R บ้านหนองแกสามหนอง
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G2						
28	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับใบมีดด้าน Load ของ DAA05R-01 (R.วัดหนองหิน) เข้าทั้ง 3 เฟส						
30	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		ดบ.		R หนองหิน
31	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วน กลับจาก DAA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		-	ขนานบัส
33	DIS ชค. DAA5	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ตันโพธิ์ใหญ่
34	DIS ชค. DAA6	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	สามแยกหนองหิน
35	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		-	ขนานบัส
36	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
37	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
38	DAA05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	หนองหิน
39	DAA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดช.		R	บ้านหนองแกสามหนอง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่จัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
วงจร DAA 05 บริเวณ DAA5R-01หนองหิน ถึง Disชั่วคราวต้นโพธิ์ใหญ่
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายหลังรีเคลเซอร์ DAA5R-01 หนองหิน
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
