

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓...../๑๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย...เชิดชูสุวรรณ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟง.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา, รื้อถอนและทาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผัง
สิ่งเขปแบบ จำนวน...๓...แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๙สท.	27/07/65	08.00	17.00	ปักเสาแรงสูง ร่องรับงาน สถานีสุพรรณบุรี2	DDE ดิจราม ถนนจุด A	Dis บ้านจามจุรี SPA07S-08	โทร.๐๘๕-๒๙๐๙๐๔๓ นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่บ้านจามจุรี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญ สุวรรณประทีป...ตำแหน่ง ท.บ.๒ (สข.)...โทร. ๐๘๑-๘๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย...เชิดชูสุวรรณ)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟง.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด SPA09 จาก DDE อิงพื้นที่ถนนจุด A SPA 9S-08

ในวันที่ 27 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1223/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิกัด..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชุนทอง ฝาเงิน

22 ก.ค. 65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัชชัย สุวรรณประทีป

ร.จ.ก.ท. ดันดีเกษตรกิจ

(0๐๓ ๗ นายชัชชัย)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. กฟผ.(คฟ.)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหมู่บ้านจามจรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูงรองรับงานสถานีฯสุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1223/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายขุนทอง ฝาเงิน	วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	แจ้ง กฟจ.สพ. โหลดคองจร SPA09 ตั้งแต่บริเวณ SPA07S-08 (DIS หมู่บ้านจามจรี) - จุดตัด DDE A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนน						
5	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งโหลดคองจร SPA09 ตั้งแต่บริเวณ SPA07S-08 (DIS หมู่บ้านจามจรี) - จุดตัด DDE A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนน แล้วเสร็จ						
6	แจ้ง กฟจ.สพ. ตัด DDE A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนน (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
7	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งตัด DDE A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนน แล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง We safe ให้เรียบร้อย						
12	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
17	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้ง กฟจ.สพ. เชื่อม DDE วงจร SPA09 จุด A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนน โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
20	เมื่อ กฟจ.สพ. เชื่อม DDE วงจร SPA09 จุด A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนน แล้วเสร็จ						
21	แจ้ง กฟจ.สพ. นำโหลดคองจร SPA09 ตั้งแต่บริเวณ SPA07S-08 (DIS หมู่บ้านจามจรี) - จุดตัด DDE A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนนเข้า						
22	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งนำโหลดคองจร SPA09 ตั้งแต่บริเวณ SPA07S-08 (DIS หมู่บ้านจามจรี) - จุดตัด DDE A บริเวณช่วงดิ่งข้ามถนน แล้วเสร็จ						
23	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

ถึง ผจก.กฟง.สพ.

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๗..เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ . DDEตึงข้ามถนนจุดA,-- DISบ้านจามจรี...เพื่อ...ปักเสาและทาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง๒๒เค
วี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดติดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ติดเตอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณDDEจุดA ถึงDISบ้านจามจรี

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
...๐๘๕-๒๕๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายทิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟง.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
...๐๘๘-๒๗๕๓๖๕๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แนบผังเชิงเกิดไลน์(หลังจ่ายไฟ)

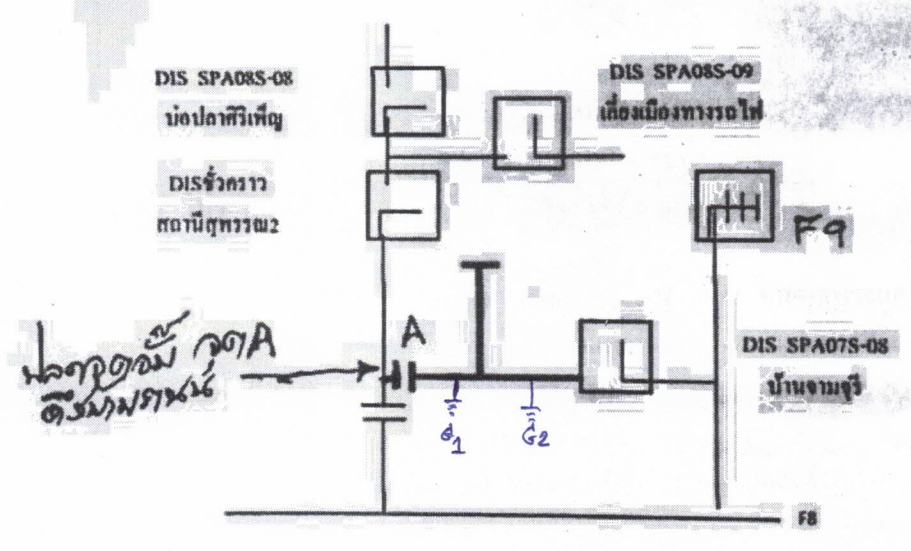

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗(สข.) ผ.บ.กฟง.สพ.

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)
รจก.(ท.)กฟง.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
