



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.๔๙๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบางแพรก ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....กาญจนบุรี ๔.....ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔YB-๐๑	๔ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ เมตร และติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสา ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี	สถานีไฟฟ้า ด้านมะขาม เตี้ย ๑	สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี ๔ (ชั่วคราว)	นายอรรถ บุญญาลัย โทร.๐๘๑- ๓๗๘๐๗๖๓
๒.	๔YB-๐๑	๕ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ เมตร และติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสา ใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี	สถานีไฟฟ้า ด้านมะขาม เตี้ย ๑	สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี ๔ (ชั่วคราว)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชูเกียรติ มาลาคำ.....ตำแหน่ง.....พขง.๓.....โทร.๐๙๘-๔๘๗๕๒๕๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายจรัญ ศรีบางแพรก.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ดมข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ 115kV จาก DMA ถึง KCE
ในวันที่ 4 สค 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1227/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ 115 kV จาก DMA ถึง KCE
ในวันที่ 5 สค 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1227/2565

พนักงานศูนย์ นาย.....อินทร์ อังสหาสิน.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....ผจก.กฟส.อ.ดมข.....

(.....นายอินทร์ อังสหาสิน.....)
๑๑ก. 6 กกน นว.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.ดมข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....๒.....แผ่น
แผนผังแนบ.....๑.....แผ่น
ผจก. ๒ (สถานี..... KCE.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนถึงสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ดับไฟช่วงเช้า และจ่ายไฟช่วงเย็น)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4,5 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1227/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน			วันที่	28 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 2 วัน						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
4	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
5	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
6	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		-
7	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) รับไฟจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	- แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ใบมีด 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งให้ กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย และลง Wesafe						
18	เมื่อ ผู้ควบคุมงาน ลง We Safe แล้วเสร็จ						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
21	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
22	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		ตมข.		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
25	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
26	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		-
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี
30	DMA04YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ย้ายโหลดสถานีฯ กายูจบุรี 4 (ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
32	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		- ไบมีด 115 เควี
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	- แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-
37	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
38	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
39	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		-
40	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนงานดับไฟระบบสายส่ง 115 เควี จาก สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ถึง
สถานีกาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) เพื่อปกเสา 12.20
เมตรและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหุ้มเสา ให้ได้ 115 เควี
วันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2565

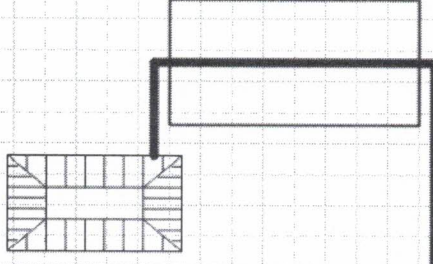

สถานีกาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)

สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย I

