



Switching Deadline

3 ก.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.ท.สค.(ปน) ๔๙๙๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่าวไพวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV รองรับการจ่ายไฟสถานีฯ สค. ๑ บริเวณ ปากซอยโรงแรมพาลาด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTBo๘	๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ kV รองรับการ จ่ายไฟสถานีฯ สค.๑ บริเวณ ปากซอยโรงแรมพาลาด	จุดปลดสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ kV ปากทางซอย หมื่นปรม	KTBo๘S-๐๖ ปากซอยโรงแรม พาลาด	นายไชยรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร. ๐๙๐๙๑๗๗๑๙๑
๒	SMGo๘	๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ kV หน้าโรงแรม พาลาด	KTBo๘S-๐๖ ปากซอยโรงแรม พาลาด	
๓	SMGo๙	๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ kV หน้าโรงแรม พาลาด	ปลายสาย ปากทางซอยหมื่น ปรม	
๔	๑๑๕ kV	๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๗	KTBo๒YS-๐๖ หน้าโรงแรมท้อบ อิน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลงเฉพาะไลน์ ๒ เครื่อง (แจ้งประกาศดับไฟแล้ว)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอ่าวไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ UTB8 จาก ชุดพัดตรา UTB8S-06
ในวันที่ 4 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1271/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMG8 จาก DDE โขงหมาก UTB8S-06
ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " " " " " " " "
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ SMG9 จาก DDE โขงหมาก ว่างควบคุมหม้อแปลง
ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " " " " " " " "
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ 115 จาก SMG9 ABS UTB2S-06
ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " " " " " " " "
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " " " " " " " "
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " " " " " " " "
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " " " " " " " "
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ " ตั้งแต่เวลา " น. ถึง " น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ " " " " " " " "


พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ ชนากาศ ประธานงานการขอดับไฟกับ ราชมงคลวิมล มุขมนตรี

ร.จ.ช.
(นางสาวสุภาวษา วงศ์บุญมงคล)
ชก. 5 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓-คท.
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี SMG)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยโรงแรมพาลาด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ย. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1271/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	1 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	**งานที่ทำ** เปลี่ยนจุดจัม TIELINE KTB08S-06 DIS โรงแรมพาลาด ไปจัม KTB03 (ตามผังแนบ)						
3	**งานที่ทำ** ติดตั้ง DISชค.ข้างโรงแรมพาลาด และพาดไลน์ระบบจำหน่าย22kV ไปจัม KTB08 (ตามผังแนบ)						
4	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
5	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
6	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
7	SMG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	CB	115kV
8	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	CB	115kV
9	ตรวจสอบSMC01YB-01 และ SMC03YB-01 CLOSE LOOP ปกติ						
10	- OPENLOOP						
11	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG	CB	115kV
12	SMG04YS-02	สับ	ปลด		SMG	ใบมิด	115kV
13	SMG04YS-03	สับ	ปลด		SMG	ใบมิด	115kV
14	- ดับไฟ 115kV						
15	KTB02YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	หน้าโรงแรมทอปอิน
16	- ดับไฟ ไลน์ SMG08,09 และ KTB08 เวลา 08.00น.						
17	แจ้งสค. ทำการปลดโหลดก่อนทำการตัด DDE						
18	แจ้ง Hotline สค. ตัด DDE หน้าโรงแรมพาลาด ในไลน์วงจร SMG08 ออกจากกันทั้งสามเฟส						
19	หลังจาก Hotline สค. ตัด DDE หน้าโรงแรมพาลาด ในไลน์วงจร SMG08 แล้วเสร็จ						
20	แจ้ง Hotline สค. ตัด DDE หน้าโรงแรมพาลาด ในไลน์วงจร SMG09 ออกจากกันทั้งสามเฟส						
21	หลังจาก Hotline สค. ตัด DDE หน้าโรงแรมพาลาด ในไลน์วงจร SMG09 แล้วเสร็จ						
22	แจ้ง Hotline สค. ปลดสาย ปากทางซอยหมื่นปรม ในไลน์วงจร KTB08 ออกจากกันทั้งสามเฟส						
23	หลังจาก Hotline สค. ปลดสาย ปากทางซอยหมื่นปรม ในไลน์วงจร KTB08 แล้วเสร็จ						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
25	แจ้งพนักงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งพนักงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
27	แจ้งพนักงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G4							
29	เมื่อไฟฟ้าหน้างานลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
30	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
31	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG			
32	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG			
33	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
34	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		CB	115kV
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า								
35	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
36	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1							
37	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2							
38	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G3							
39	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G4							
40	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
41	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG			
42	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG			
43	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
44	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB			
45	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		CB	115kV
46	- จ่ายไฟ 22kV โลင်း SMG08,09 และ KTB08							
47	- ตรวจสอบ DIS ช่างโรงแรมพาเลท ติดตั้งเรียบร้อย อยู่สถานะ "ปลด" ไบมีดจากกันทั้งสามเฟส							
48	แจ้ง Hotline สค. เชื่อมสาย ปากทางขอยหมื่นปรม ในโลน่วงจร KTB08 เข้าทั้งสามเฟส (โลนใหม่ ตามผังแนบ)							
49	แจ้ง Hotline สค. เชื่อมสาย ปากทางขอยหมื่นปรม ในโลน่วงจร KTB03 เข้าทั้งสามเฟส (เปลี่ยนจัม ตามผังแนบ)							
50	หลังจาก Hotline สค. เชื่อมสาย ปากทางขอยหมื่นปรม ในโลน่วงจร KTB03 แล้วเสร็จ							
51	หลังจาก Hotline สค. เชื่อมสาย ปากทางขอยหมื่นปรม ในโลน่วงจร KTB08 แล้วเสร็จ							
52	แจ้ง Hotline สค. เชื่อม DDE หน้าโรงแรมพาเลท ในโลน่วงจร SMG08 เข้าทั้งสามเฟส							
53	หลังจาก Hotline สค. เชื่อม DDE หน้าโรงแรมพาเลท ในโลน่วงจร SMG08 แล้วเสร็จ							
54	แจ้ง Hotline สค. เชื่อม DDE หน้าโรงแรมพาเลท ในโลน่วงจร SMG09 เข้าทั้งสามเฟส							
55	หลังจาก Hotline สค. เชื่อม DDE หน้าโรงแรมพาเลท ในโลน่วงจร SMG09 แล้วเสร็จ							
56	แจ้งสค. ทำการจ่ายโหลดคืนระบบ							
57	- จ่ายไฟ 115kV							
58	KTB02YS-06	ปลด	สับ, ล็อคกุญแจ		สค.		ABS	หน้าโรงแรมท้อปอิน
59	- CLOSELOOP							
60	SMG04YS-02	ปลด	สับ		SMG		ไบมีด	115kV
61	SMG04YS-03	ปลด	สับ		SMG		ไบมีด	115kV
62	SMG04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB	115kV
63	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG			
64	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
66	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB			
67	SMG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		CB	115kV
68	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		CB	115kV
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

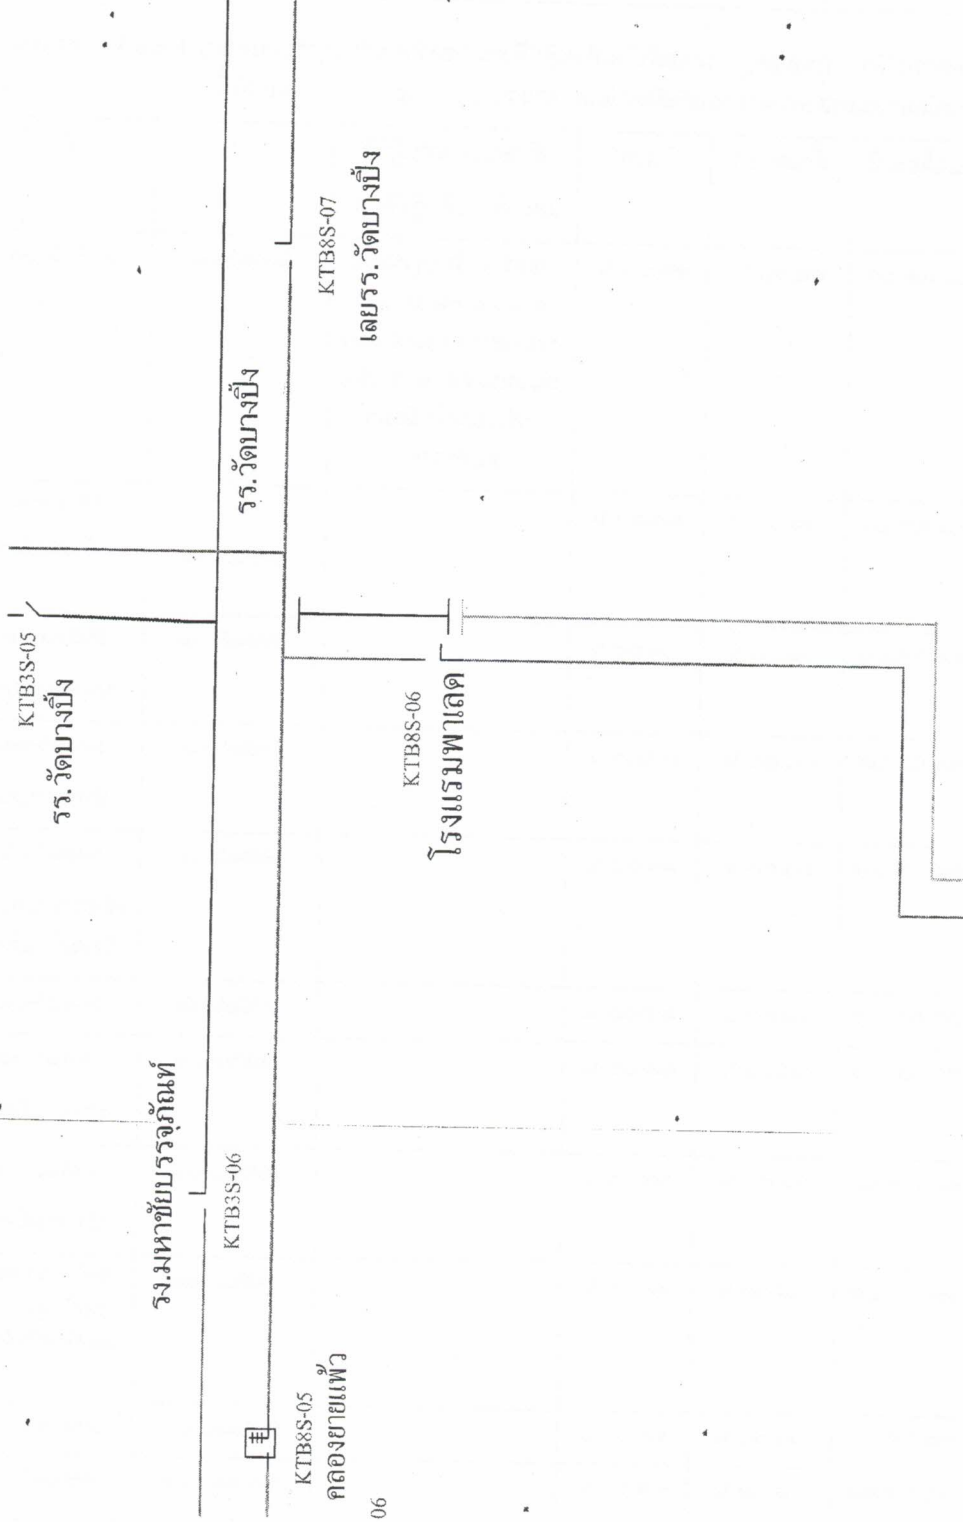

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

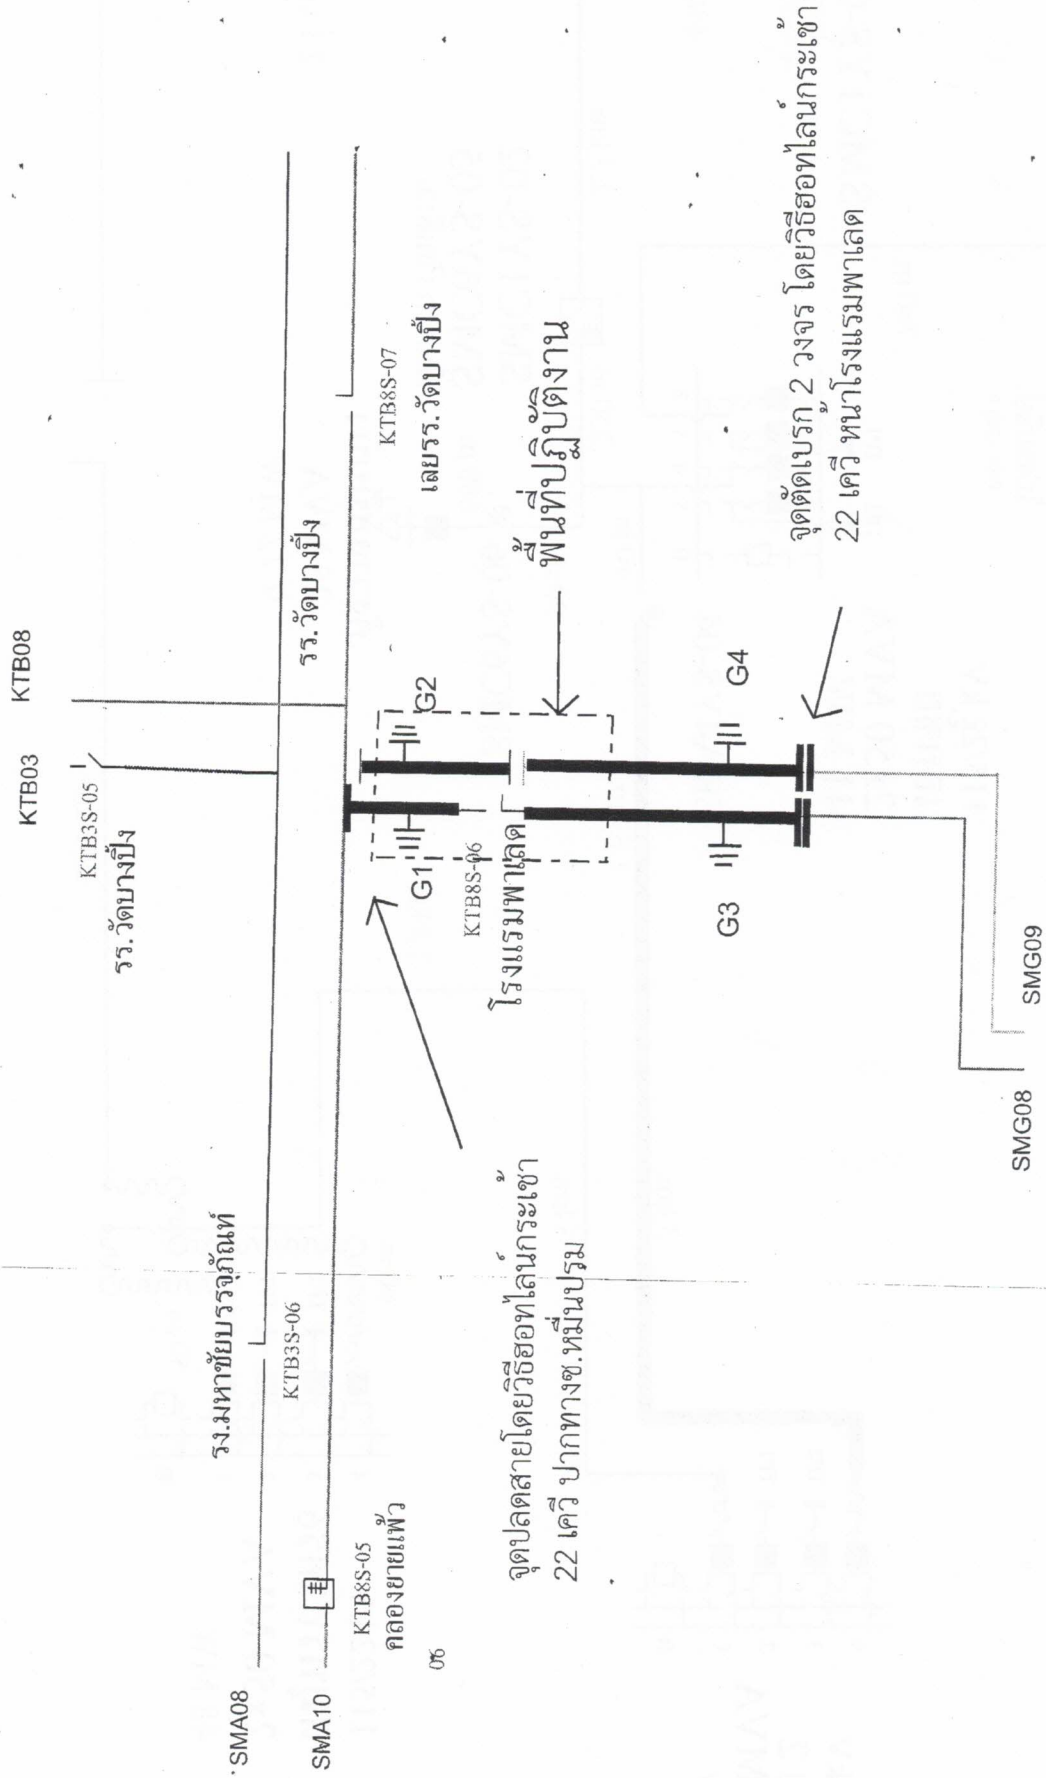

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

