



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline
วันที่ 17 ส.ค.65

เลขที่ ก.ท.สค.(ปน) ๔๒๘๘ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รรจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ.สค.ชั้น๑ จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๓	๒๑ ส.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ เครวี บริเวณ ตั้งแต่ปาก ซ. คลอง ชลประทาน ถึง หน้านิคมฯ อยู่เจริญ	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า	SMB๑๓S-๐๔ ปากซ.คลอง ชลประทาน	นายไชยรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร.๐๙๐-๙๑๗๗๑๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่ปากช.คลองชลประทาน ถึง หน้านิคมอยู่เจริญ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง หล.ปน. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๑

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 47813 จาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ - SMB 138-04
ในวันที่ 21-08-65 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 127465
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุ ประสานงานการขอดับไฟกับ ม.อ.ท. หน.๖๖
13 ส.ค. 65

สมพร วัฒนศิริ
(206.7 หน.๖๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๓๓


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 3 แผ่น

ผจฟ. (.....) (.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ปากซอยคลองชลประทาน -หน้านิคมอยู่เจริญ						
กำหนดวันที่ทำงาน	21/08/2565	เวลา	08.00 น.	ถึง	21/08/2565	เวลา	17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟภ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SMB12		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1274/2565
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	14 สิงหาคม 2565	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 สิงหาคม 2565	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 สิงหาคม 2565	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง ,นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายธนิศ ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMB								
1	ย้ายโหลด SMB13 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB08							
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ			
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ			
4	SMB08B-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
5	SMB13VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
6	SMB08S-14	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สค.		SF6 เลย์นิคมอยู่เจริญ	
7	SMB13S-04	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยคลองชลประทาน	
8	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ			
9	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ			
10	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดสายในไลน์ SMB13 ช่วงลิตซ์เข้า SMB13S-04 (SF6ปากซอยคลองชลประทาน) โดยวิธีฮอทไลน์ (ตามผังแนบ)							
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดสายในไลน์ SMB13 ช่วงดิ่งข้ามถนนโดยวิธีฮอทไลน์ (ตามผังแนบ)							
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					สค.		
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					สค.		
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการลงข้อมูลการ Test ไฟ และ Short Ground ลงใน "WE SAFE"							
16	SMB08B-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
17	SMB13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ								
18	SMB08B-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
19	SMB13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					สค.		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					สค.		
22	แจ้งช่างควบคุมงานตรวจสอบสายในไลน์ SMB13 ช่วงดิ่งข้ามถนน ปลดออก และจัมกับวงจรใหม่วงจรล่าง SMB13 (ตามผังแนบ)							
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัมปใหม่วงจรบนเข้ากับ SMB08 และไลน์ใหม่วงจรล่างเข้ากับ SMB13 (ตามผังแนบ)							
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการเช็คเฟส ที่ SMB13S-04 (SF6ปากซอยคลองชลประทาน)							
25	ย้ายโหลด SMB13 บางส่วนคืนจาก SMB08							
26	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ			
27	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ			
28	SMB13S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สค.		SF6 ปากซอยคลองชลประทาน	
29	SMB08S-14	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 เลย์นิคมอยู่เจริญ	
30	SMB08B-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
31	SMB13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ			
32	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ			
33	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ			


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching							

ศึกษาระบบสายไฟก่อนปฏิบัติงาน

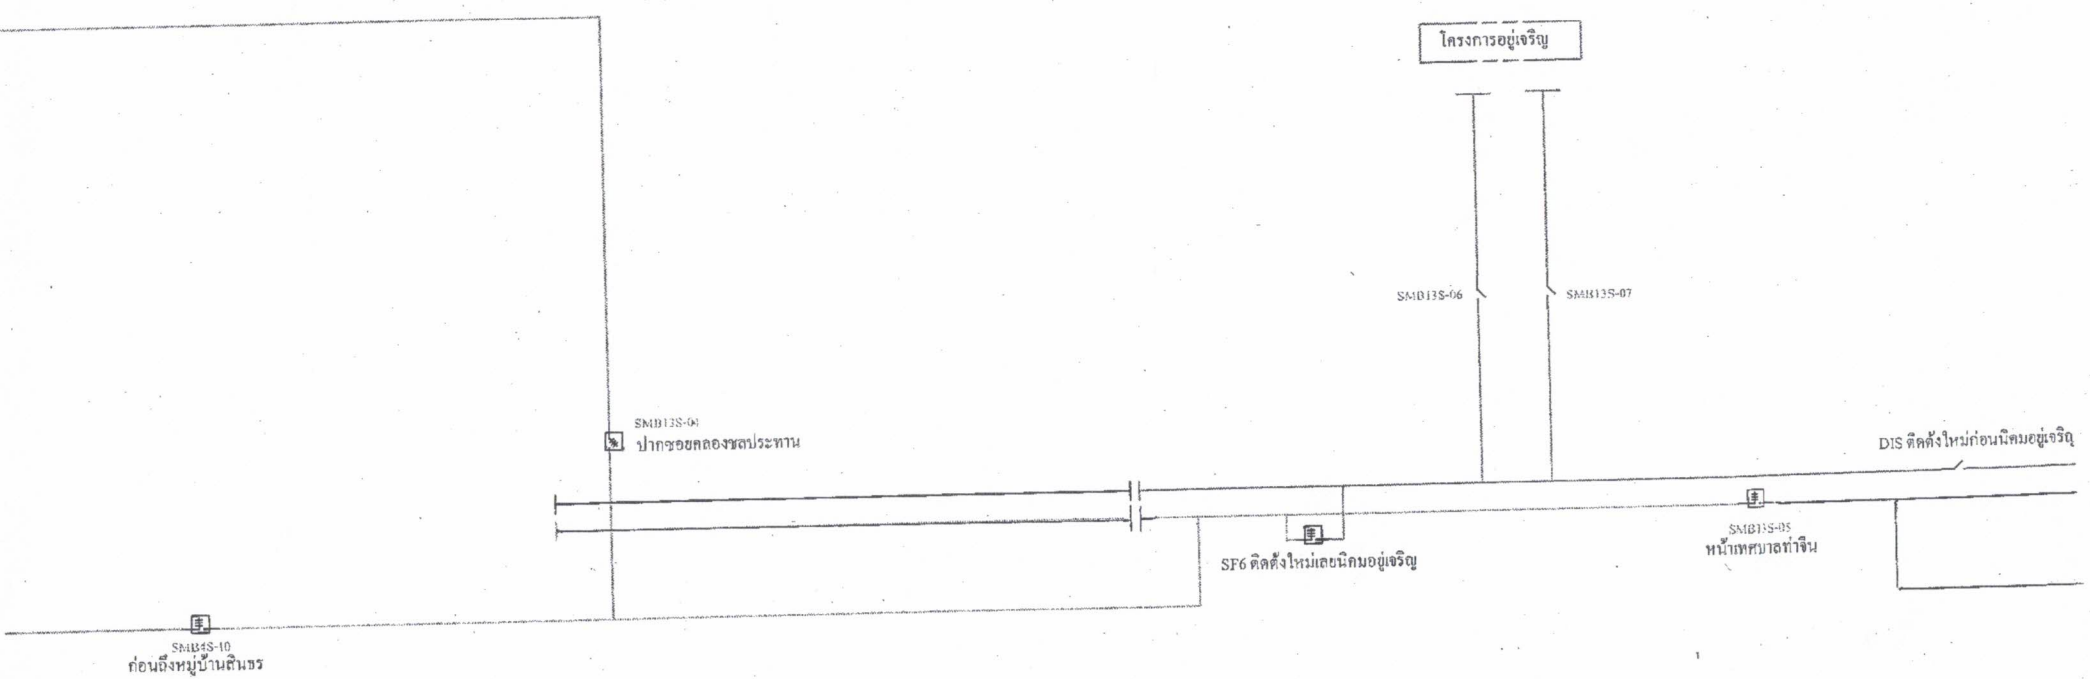


SMW29-15
ข้างหมู่บ้านสินธร

ศึกษาวงจรจ่ายไฟสถานีวิทยุ

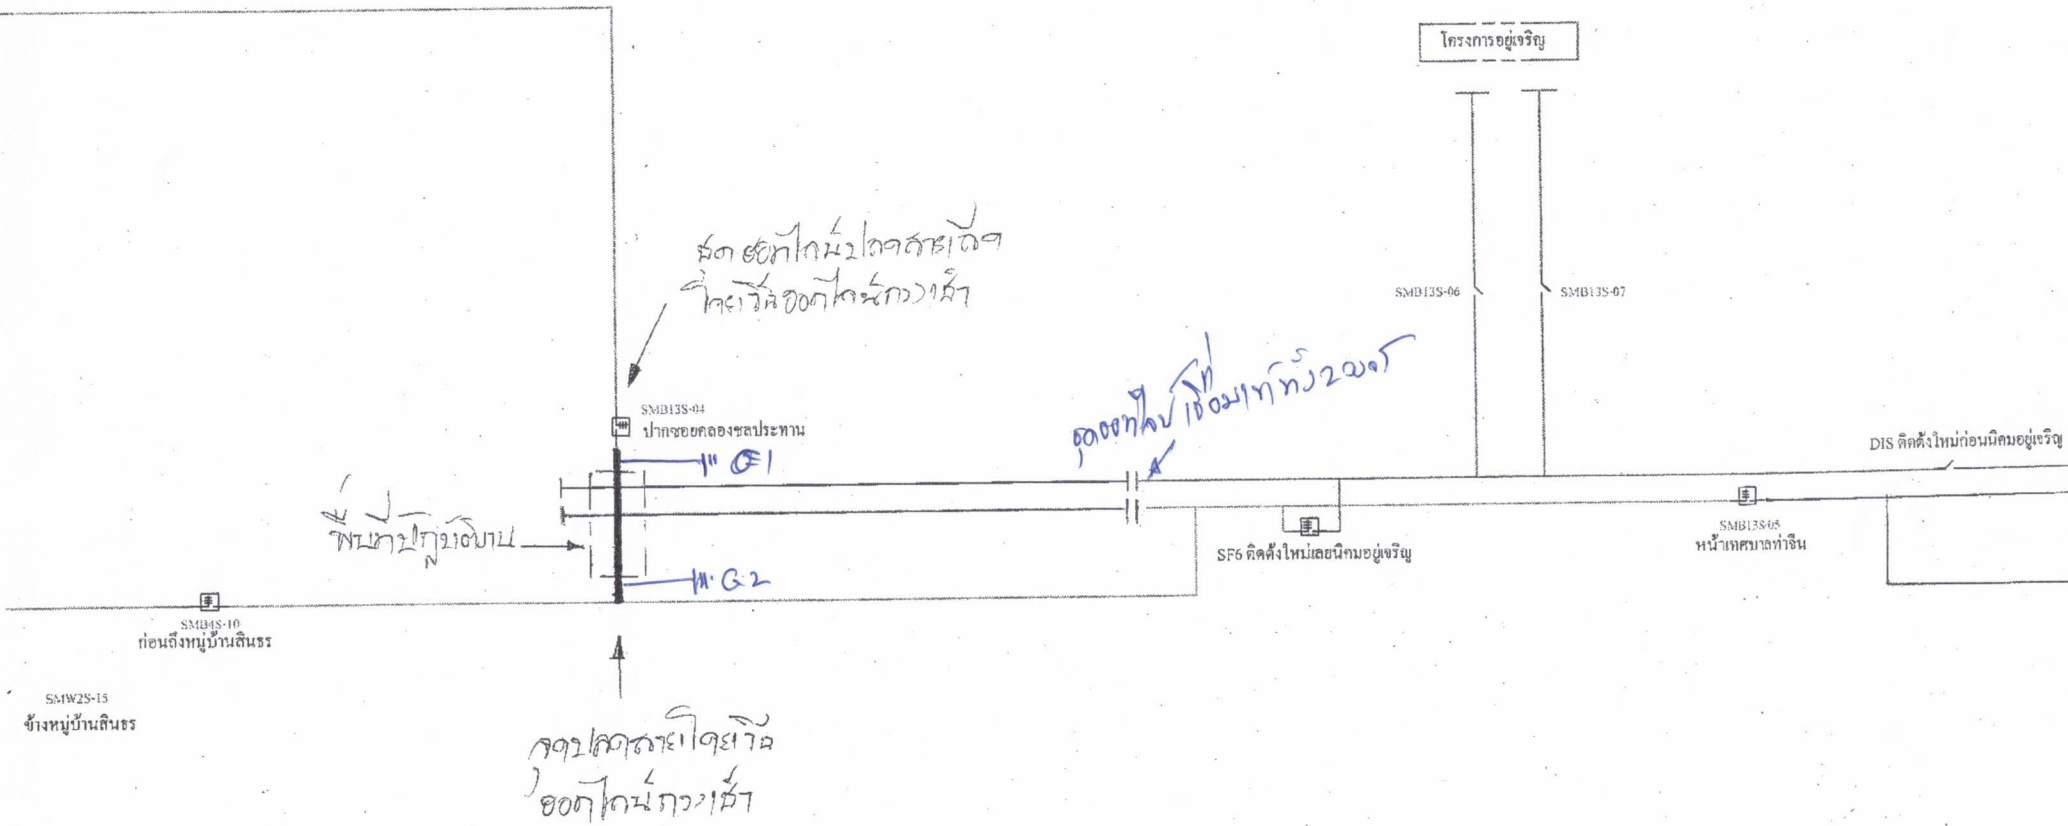

ศึกษาระบบการไฟฟ้าตึก 21 มิถุนายน 74

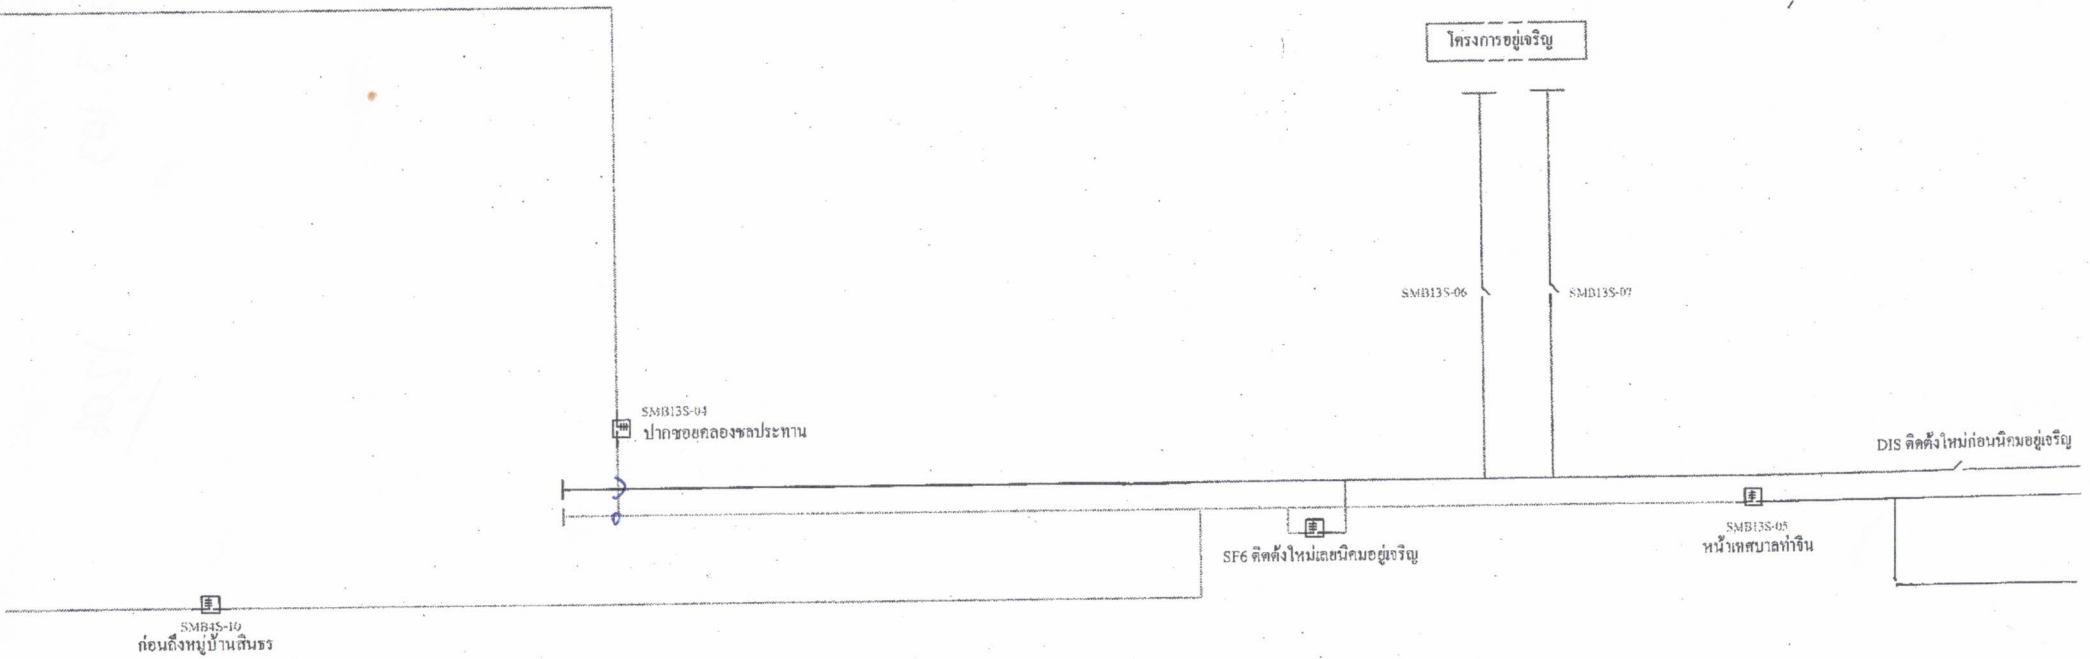

SMW2N-15
ข้างหมู่บ้านสินธร
