



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๑ท.(ปบ) 3548/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ 2 กันยายน 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บริเวณบ้านเขาخانหมาก (ลูกเงิน) ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG04	9 ก.ย. 2567	08.30	16.30	ติดตั้ง Recloser บริเวณ บ้านเขา خانหมาก (ลูกเงิน)	Dis ชั่วคราวบ้าน เขาخانหมาก พิกัด 14.293268 ,99.854976	สุดไล่นบ้านวัง พอง พิกัด 14.318734 ,99.814693	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พชง.6 ผบ.กฟอ.อุทอง โทร.098-5068090

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..๓.จรเข้ หมู่ 1 .หมู่ 2 .หมู่ 11 .หมู่ 13.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พชง.6 ผบ.กฟอ.อุทอง โทร 098-5068090

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat 14.293268 Long 99.854976
3.2 สิ้นสุด Lat 14.318734 Long 99.814693

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG4 จาก Dis ต.บ้านทรายพอง ถึง ปากซึ้ง
ในวันที่ 9 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1278/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ อัครวิโรจน์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

3 ก.ย. 67

(นายอารุณ จรดล)
ผจก.กฟอ.อุทอง

นายอารุณ จรดล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๐๗๐.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1แผ่น

แผนผังแนบ..... 2แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

Page 1 of 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านเขาخانหมาก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1278/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	3 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	DIS ชค. UTG04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ชค.บ้านเขาخانหมาก
5	แจ้งชุดงานปลด HOT LINE CLAMP ไลน์แยกเข้าบ้านเขาخانหมาก						
6	เมื่อชุดงานปลด HOT LINE CLAMP ไลน์แยกเข้าบ้านเขาخانหมาก แล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
8	แจ้งหน้างานเตสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
9	แจ้งหน้างานเตสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
10	แจ้งไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
14	ตรวจสอบชุดงานดำเนินการรีร้อย DIS ชค.บ้านเขาخانหมาก ออกเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง Recloser บ้านเขาخانหมาก						
15	ตรวจสอบสถานะ Recloser บ้านเขาخانหมาก และ Sw.source+load+bypass อยู่สถานะ OPEN						
16	แจ้งหน้าปลด ข้อตกลงจุด จุด G1						
17	แจ้งหน้าปลด ข้อตกลงจุด จุด G2						
18	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งชุดงานเชื่อม HOT LINE CLAMP ไลน์แยกเข้าบ้านเขาخانหมาก						
21	เมื่อชุดงานเชื่อม HOT LINE CLAMP ไลน์แยกเข้าบ้านเขาخانหมาก แล้วเสร็จ						
22	Sw.bypass Recloser	ปลด	สับ		อทง.		DIS Bypass Recloser บ้านเขาخانหมาก
23	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ เขาชานหมาก (จุดเงิน) ก่อนดับไฟ

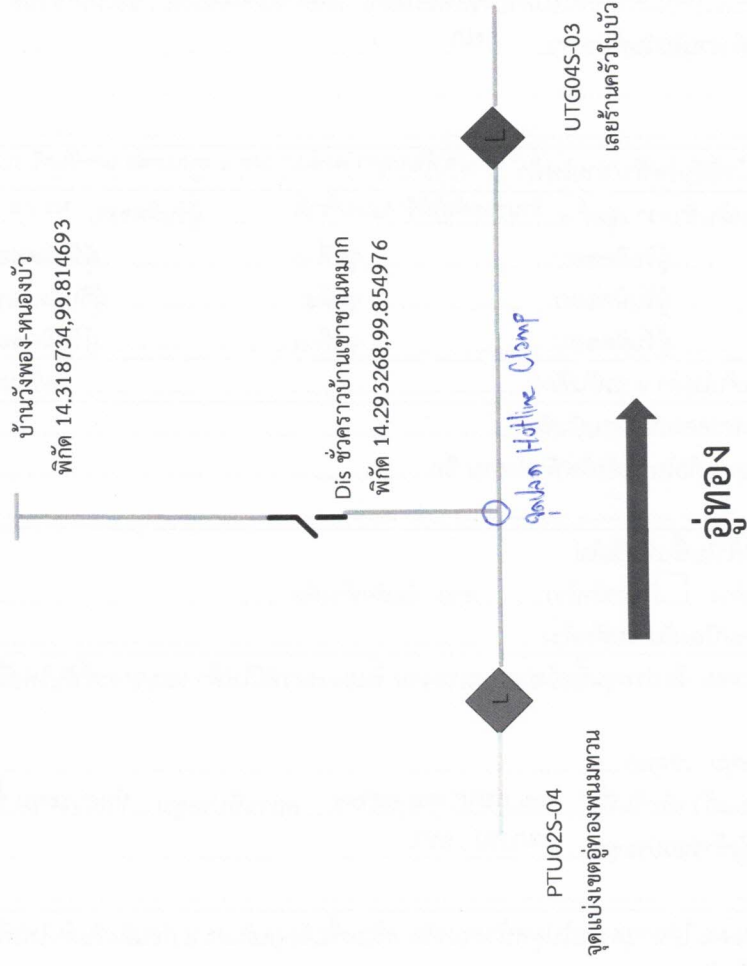


(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผบ.กฟอ.อุทธรณ์

แผนผังงานดับไฟ งานติดตั้ง Recloser บริเวณ เขาชานหมาก (จุดเงิน) หลังดับไฟ

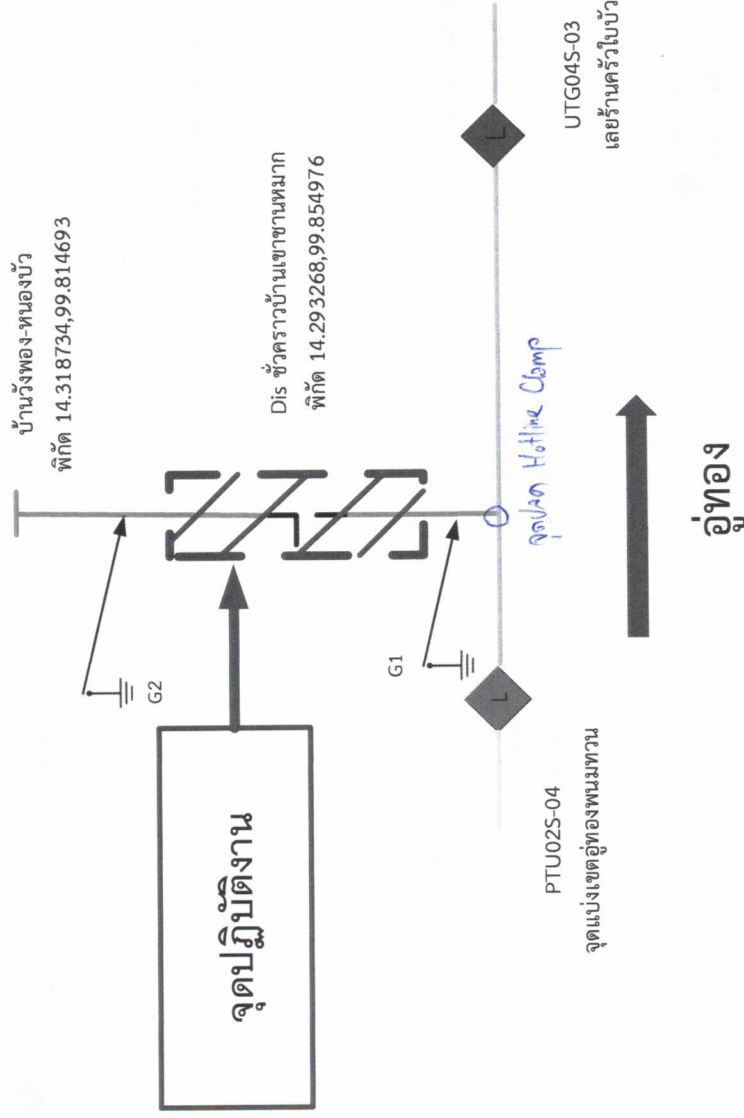

(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผ.บ.กฟอ.อุทอง
