



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

18/09/67

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๑๘๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผ.บ.กฟส.กทบ. ย้ายแนวระบบไฟฟ้าริมคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม) เพื่อให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานก่อสร้างเสาเข็มคั่นกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย สถานีไฟฟ้า กระทุ้มแบบ ๔ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD ๐๗	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผ.บ.กฟส.กทบ. ย้ายแนวระบบไฟฟ้าริมคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)	อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗ (คอสะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.๒๕๕๓)	ปลายสาย	นายนพพร ชาวไชยศรี ท.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD๐๗S - ๐๗ (คอสะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.๒๕๕๓) จนถึง ปลายสาย มีจำนวนผู้ใช้ได้รับผลกระทบ คือ ๘๑ ราย  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๙๓๕๐๑, ๑๐๐.๒๘๓๘๖๓  
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๙๒๙๗๘, ๑๐๐.๒๘๔๐๙๙

(นายมานิช วาสุกี)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟส.กทบ.  
๕ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ KTD๐๗ จาก DDE. กอ.สมท.๓๐๖๖๖๖๖๖ ถึง KTD๐๗S-07  
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1304/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เกือบมณี ประสานงานการดับไฟกับ นาย นพพร ชาวไชยศรี

(นายอภิสิทธิ์ เกือบมณี)  
๖๗ก. 5 กกน. นพ.อน.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.(คฟ)  
เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผ.จ.ก. กฟส.กทบ., กฟส.อสม.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจ. (สถานี -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ท.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณริมคลองอ้อมน้อย (KTD07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1304/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	13 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนิช 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
3	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
4	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
5	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
6	ย้ายโหลด KTD07 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC07						
7	ONC07S-11	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ช่าง บ.โอโนโน
8	KTD07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสะพานวัดสิรินทร
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	SAA01F-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		D/F โหลดแยกวัดสิรินทร(คลองแค)
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลด วงจร KTD07 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออก						
12	หลังจากทำการปลดโหลด วงจร KTD07 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTD07 บริเวณก่อนสะพานข้ามคลองอ้อมน้อย (ตามแผนผัง) ออก						
14	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTD07 บริเวณก่อนสะพานข้ามคลองอ้อมน้อย ออก เรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
19	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
21	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
22	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
23	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
29	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
30	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
31	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
32	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
33	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อมสาย วงจร KTD07 บริเวณก่อนสะพานข้ามคลองอ้อมน้อย (ตามแผนผัง) เข้า						
36	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อมสาย วงจร KTD07 บริเวณก่อนสะพานข้ามคลองอ้อมน้อย (ตามแผนผัง) เข้า เรียบร้อย						
37	SAA01F-03	ปลด	สับ		กทบ.		D/F ไลน์แยกวัดสิรินทร(คลองแค)
38	ย้ายโหลด KTD07 บางส่วนกลับจาก ONC07						
39	KTD07S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสะพานวัดสิรินทร
40	ONC07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ข้าง บ.โอโนโน
41	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
42	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
43	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
44	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ ถนนเลียบบคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม) ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07 (คอสสะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.2553) จนถึง ปลายสาย เพื่อให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.บ.กพ. ย้ายแนวระบบไฟฟ้าริมคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม) เพื่อให้สำนักโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานก่อสร้างเสาเข็มคั่นกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

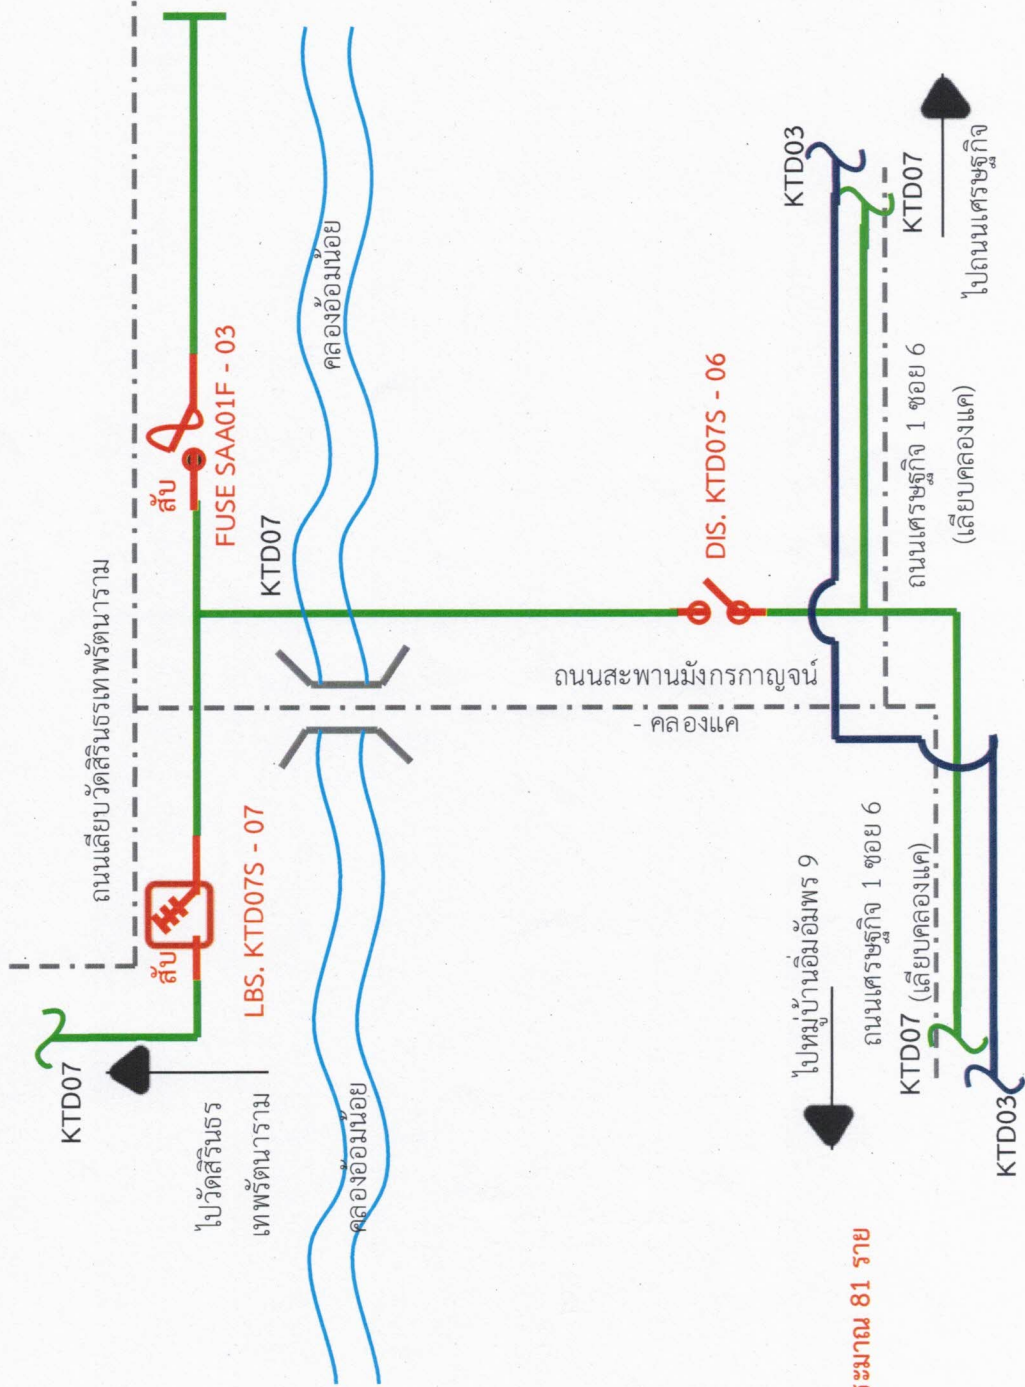

หมายเหตุ  
มีผู้ได้รับผลกระทบ **ประมาณ 81 ราย**


แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังตัดไฟ** บริเวณ ถนนเลียบรินทรพรัตน์วราม (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)

ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTD07S - 07 (คอสะพานมังกรกาญจน์ พ.ศ.2553) จนถึง ปลายสาย

เพื่อให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.บ.กฟส.กทบ. ย้ายแนวระบบไฟฟ้าริมคลองอ้อมน้อย (ฝั่งติดกับวัดสิรินธรเทพรัตนาราม)

เพื่อให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานก่อสร้างเสาเข็มค้ำกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

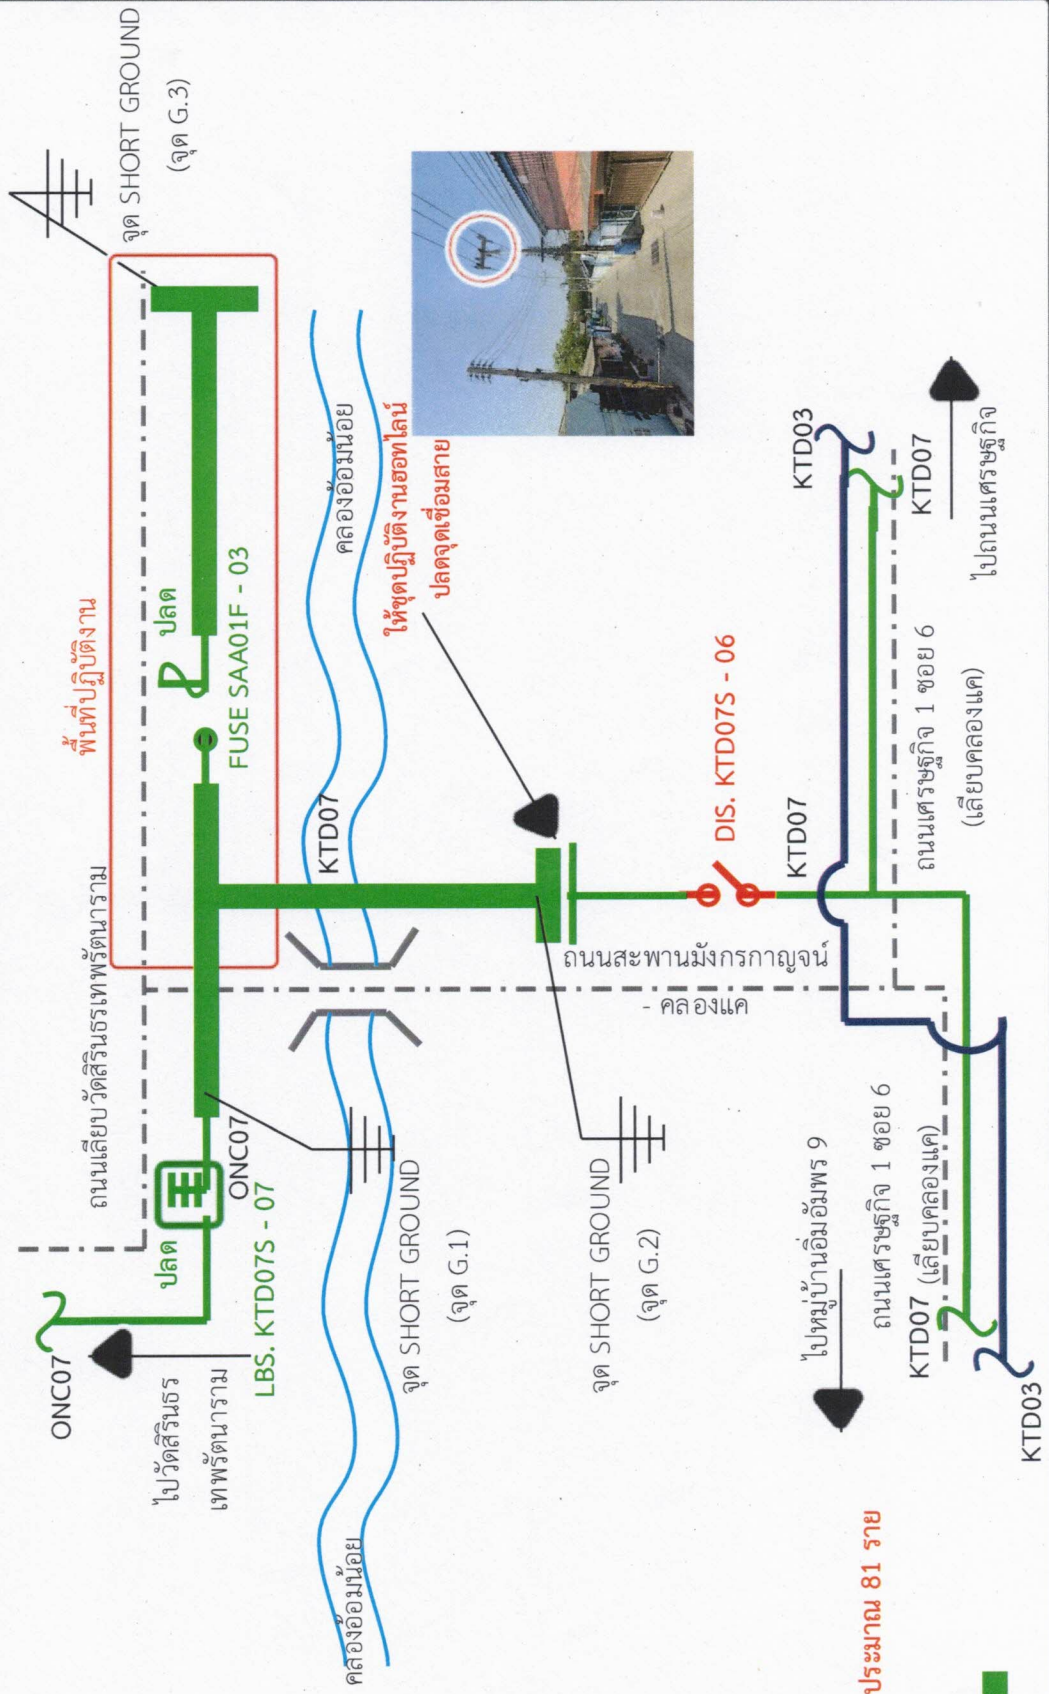

หมายเหตุ

มีผู้ได้รับผลกระทบ **ประมาณ 81 ราย**

พื้นที่ตัดไฟ
