



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ส ๕๕๘ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์

Switching Deadline

23 ก.ย. 66

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟฉ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฉ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV07	24 กันยายน 2566	8.30 น.	17.00 น.	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรง สูง บริเวณหลัง RE บางแฉม	BPA9R-02 บางแฉม	DIS ชด. วง เวียนบับเบิ้ลบี	นายพรมแดน สุทธิงาม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...หลัง RE บางแฉม - วงเวียนบับเบิ้ลบี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ.กฟฉ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟฉ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPV07 จาก BPA09R-02 ถึง DIS ชด. วงเวียนบับเบิ้ลบี
ในวันที่ ๒4 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1415/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวุฒิ แก้วอมมี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พรมแดน สุทธิงาม
19 ก.ย. 66

(นาย จิรวุฒิ แก้วอมมี)


๐๙๙.5 บ.ช. ๒๕-๓๙.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟฉ. นฐ.
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หลัง Recloser บางแฉม ถึง วงเวียนบับเบิ้ลบี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1415/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	19 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุธี, นางสาวพิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- Load = 16.5 MW
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- Load = 11.7 MW
4	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- Load = 6.8 MW
5	BPA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.		R
6	ย้ายโหลด NPV07 (ผ่านไลน์ BPA09) บางส่วนไปจ่ายจาก NPV02						
7	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
8	BPA09S-11	ปลด	สับ		นธ.		DIS อบต.บางแฉมเก่า
9	DIS ชค. BPA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS วงเวียนบับเบิ้ลบี
10	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
12	BPA09R-02	สับ	ปลด		นธ.		R บางแฉม
13	ปลดใบมีดด้าน Load BPA09R-02						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
19	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
20	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
21	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
23	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
24	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
25	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	สับไบมิตด้าน Load BPA09R-02						
29	BPA09R-02	ปลด	สับ		นฐ.		R บางแฉม
30	ย้ายโหลด NPV07 (ผ่านไลน์ BPA09) กลับจาก NPV02						
31	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
32	DIS ชด. BPA09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS วงเวียนบับเบิ้ลบี
33	BPA09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS อบต.บางแฉมเก่า
34	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส
35	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
36	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
37	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
38	BPA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

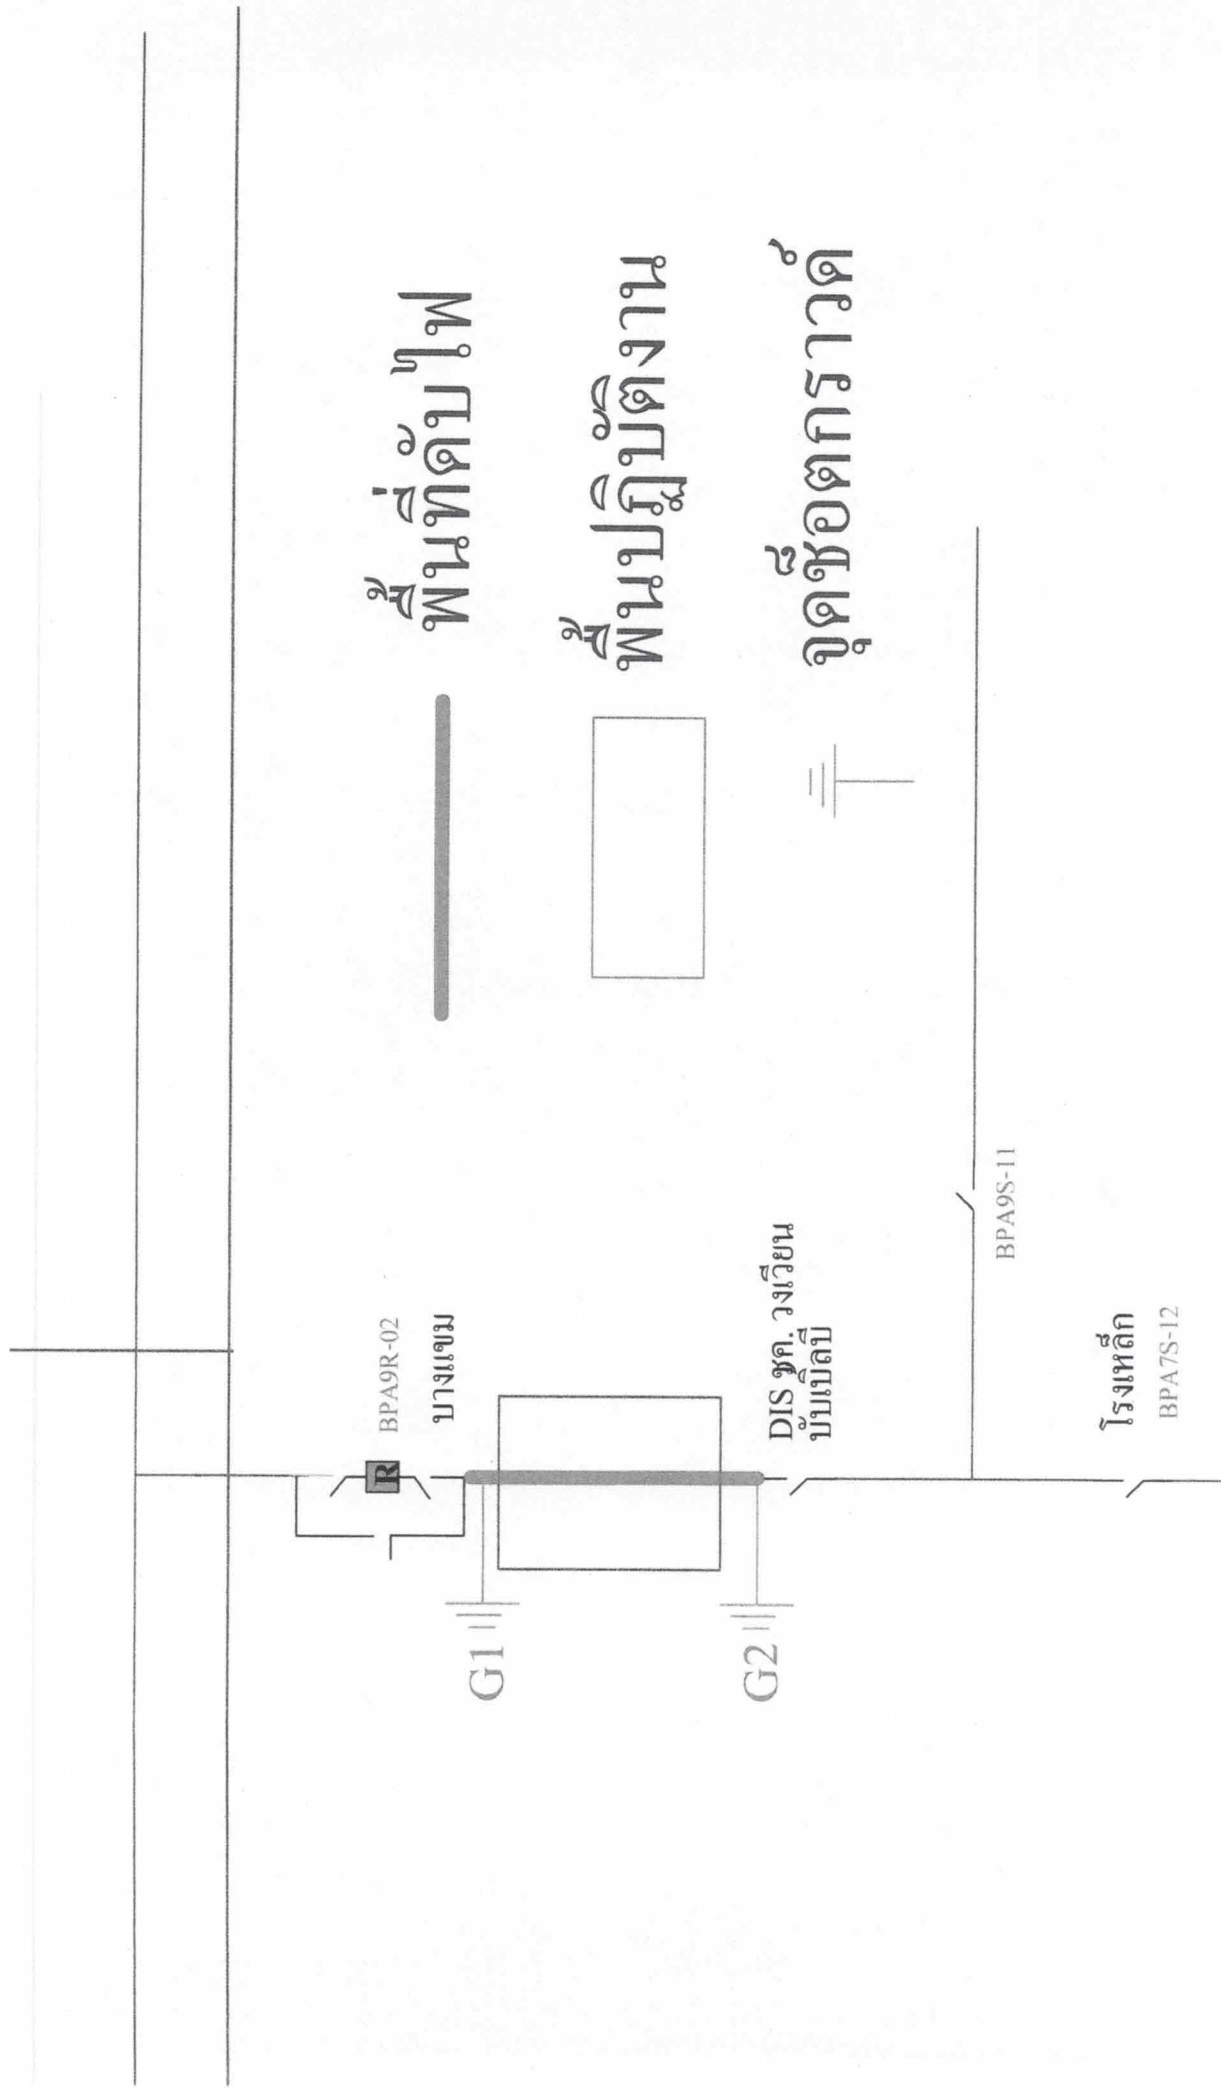

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

BPA9R-02

บางแฉม

G1

G2

DIS ชุด วงเวียน
บับเบิ้ลบี

BPA9S-11

โรงเหล็ก

BPA7S-12
