



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๑๙๙๗ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟพ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ภายในชอยกระทุ่มล้ม ๙ (ชอยโพลีกลาส) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
	PMB07	๑๘ - ๒๑ พ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงภายในชอยกระทุ่มล้ม ๙ (ชอยโพลีกลาส)	HL ตัดDDE ในช.โพลีกลาส (วงจรถ่วง) น.ก. ตรีชัย	SLY07S-06	นายวรพจน์ แก่นสอาด ๐๙๔-๔๓๔-๒๒๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาววิภา รมโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วศก.๕.ผน.....โทร.๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

\*งานปิดแล้ว ๑๙/๑๑

(นายอดิสร..แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟพ.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ PM๒7 จาก DDE บจ.ศรีนครินทร์ ถึง SLY7S-06  
ในวันที่ 18-21 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1493/2564
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส โภทพันธ์ 8 พ.ย. 64 ประสานงานการขอดับไฟกับ 4-5. ธิดา สัมโพธิ์ทอง

ลงนาม ตันติโกศล ( ๑๕ก.7 แทน นพ.อน )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓ ม.ค.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น  
ผจก. - (สถานีฯ..... -.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... -..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณภายในซอยกระทู้ล้ม 5 (ซอยโพลีกลาส)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-21 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1493/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ : ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงในซอยโพลีกลาส ตั้งแต่วันที่ 18-21 พ.ย. 64 (ดับไฟเวลา 3 วัน)						
3	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- L = 7.01 MW
4	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- L = 3.87 MW
5	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
6	ตรวจสอบ SLY07S-08 (SF6.ปากซอยโพลีกลาส สาย 4) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล๊อคคาน						
7	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE บริเวณ บ.จ.เจริญปรีณ ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟในระบบ)						
8	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
12	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
13	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน (วันที่ 21 พ.ย. 64)						
15	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
16	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
19	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
20	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณ บ.จ.เจริญปรีณ เข้าทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟในระบบ)						
21	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
22	ตรวจสอบ SLY07S-08 (SF6.ปากซอยโพลีกลาส สาย 4) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" ให้ทำการปลดล๊อคคาน						
23	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
24	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
สิ้นสุด Switching							

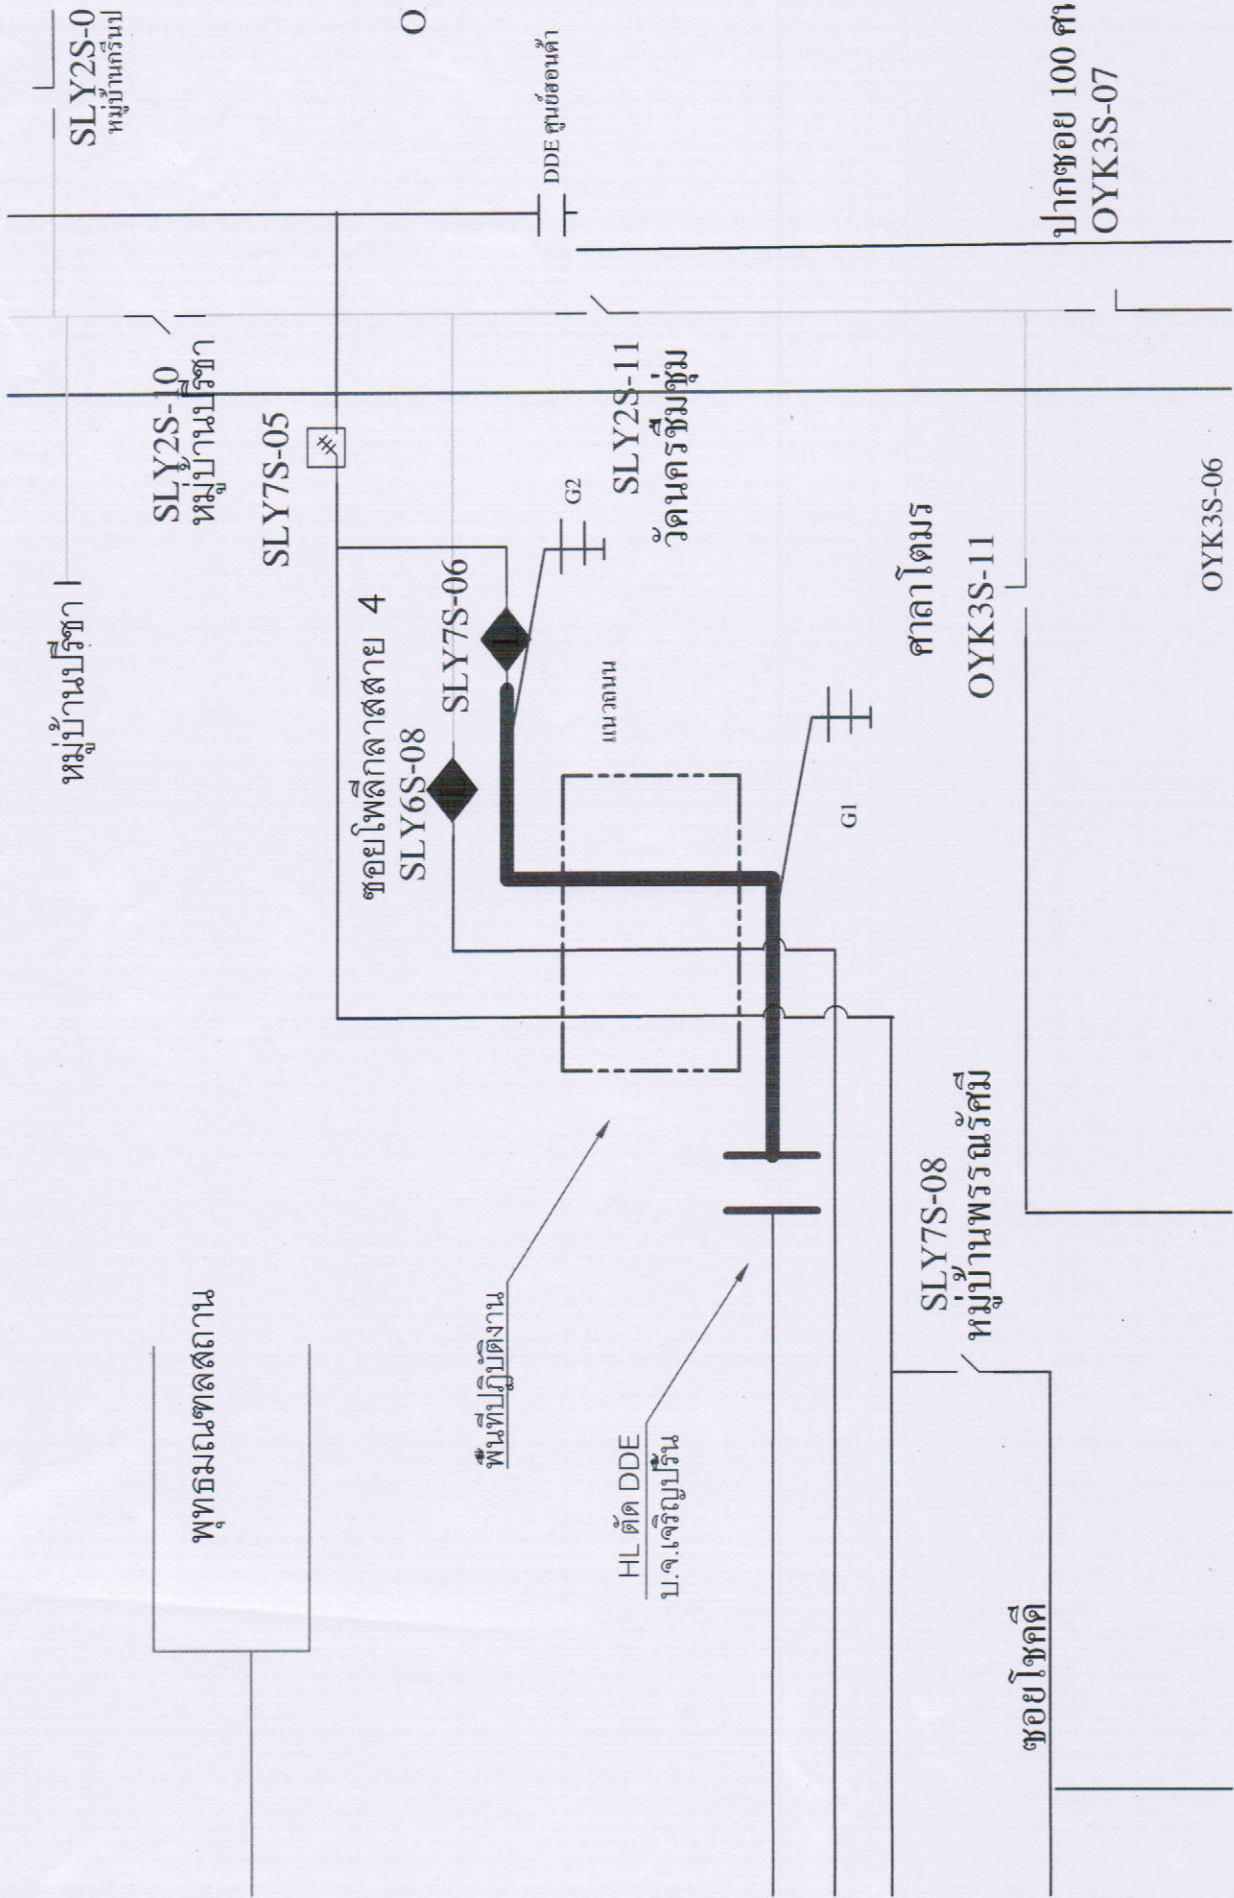

พุ่มถนนศาลสถาน

พื้นที่ปฏิบัติงาน  
HL ตัด DDE  
บ.จ.เจริญปรีน

ซอยโชคดี

OYK3S-06

หม้อต้ม 100 ลิตร  
OYK3S-07

หมู่บ้านปริษา I

SLY2S-0  
หมู่บ้านกรีนเป

SLY2S-10  
หมู่บ้านปริษา

SLY7S-05

ชุดย่อยไฟเสถียร 4  
SLY6S-08

SLY7S-06

แผงถนน

SLY2S-11  
วัฒนธรรมชุม

ศาลาโถมร  
OYK3S-11

SLY7S-08  
หมู่บ้านพรรณรศมี

DDE ศูนย์ลดค่า

O
