



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

25 ต.ค. 66

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๕๐๖๒ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๘	๒๙ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาย ส่ง ๑๑๕ KV และระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ขอบวัดบางสีคต	DIS ติดตั้งชั่วคราว ก่อนข้ามสะพาน วัดบางสีคต	DIS ติดตั้งชั่วคราว หน้าวัดบางสีคต	นายสุนทร มากคล้าย โทร.๐๘๗-๓๖๓๓๒๗๙
๒	SMB๑๓	๒๙ ต.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้งชั่วคราว ก่อนข้ามสะพาน วัดบางสีคต	DIS ติดตั้งชั่วคราว หน้าวัดบางสีคต	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ วัดบางสีคต.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.ปน. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Dis ช่วงกลางวัน

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMB02 จาก สภพท.รัตนวงสิตต ถึง Dis รัตนวงสิตต  
ในวันที่ 29 ต.ค.๕๕ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1540/2566


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMB13 จาก สภพท.รัตนวงสิตต ถึง Dis ช่วงกลางวัน  
ในวันที่ 29 ต.ค.๕๕ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1540/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ ~~๒๒๒~~ <sup>นางสาว</sup> สักโซา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอดับไฟกับ นางอำนาจ เก่งทอง

  
(นางสาว สักโซา วงศ์บุญมาก)  
วต.ก.4 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.จต.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยวัดบางสีดต SMB08, SMB13				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ 115, 22 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1540/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัญชา วงศ์บุญมาก			วันที่	17 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ, วรรณพงษ์ 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L = 8.6 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L = 18.5 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L = 18.8 MW
5	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		L = 1.8 MW
6	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		L = 4.7 MW
7	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		L = 7 MW
8	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		
9	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		L = 4.7 MW
10	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		L = 5.4 MW
11	ย้ายโหลดวงจร SMB04 กลับจาก SMW03						
12	ตรวจสอบ SMB04S-01 อยู่สถานะ "สับ", SMB04VB-01 อยู่สถานะ "OPEN + TRUCK In Service"						
13	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SMB		CB
14	SMB04S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บั้ม PT ปากทางท่าฉลอม
15	ย้ายโหลดวงจร SMB08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMB04						
16	SMB08VB-01	ปลด	สับ		SMB		CB ขนานบัส
17	SMB08S-11	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากขอยกระช้ำขาว
18	SMB08S-10	สับ	ปลด		สค.		SF6 อยู่ซ่อมรถตาย
19	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB ขนานบัส
20	ย้ายโหลดวงจร SMW02 ไปจ่ายไฟจาก SMB09						
21	ตรวจสอบ SMB09S-01 อยู่สถานะ "สับ", SMB09VB-01 อยู่สถานะ "OPEN + TRUCK In Service"						
22	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SMB		CB
23	SMW02VB-01	สับ	ปลด		SMW		CB
24	ย้ายโหลดวงจร SMB08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMB09						
25	SMB08S-09	ปลด	สับ		สค.		SF6 ทำขอยซีผ้าขาว
26	DIS ชั่วคราว SMB08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดบางสีดต
27	ย้ายโหลดวงจร SMW02 กลับจาก SMB09						
28	SMW02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SMW		CB
29	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลดวงจร SMB13 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMB03						
31	ตรวจสอบ SMB14S-01 อยู่สถานะ "สับ", SMB14VB-01 อยู่สถานะ "OPEN + TRUCK In Service"						
32	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		CB
33	SMB03S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สก.		SF6 ก่อนสถานีรถไฟบางสีคต
34	DIS ชั่วคราว SMB13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สก.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดบางสีคต
35	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB
36	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
37	DIS ชั่วคราว SMB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สก.		DIS ชั่วคราวก่อนข้ามสะพานวัดบางสีคต
38	DIS ชั่วคราว SMB13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สก.		DIS ชั่วคราวก่อนข้ามสะพานวัดบางสีคต
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศ. รับทราบ						
40	แจ้ง กฟส.ศ. Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
41	แจ้ง กฟส.ศ. ทำการช้อตกราวด์จุด G1						
42	แจ้ง กฟส.ศ. ทำการช้อตกราวด์จุด G2						
43	แจ้ง กฟส.ศ. ทำการช้อตกราวด์จุด G3						
44	แจ้ง กฟส.ศ. ทำการช้อตกราวด์จุด G4						
45	แจ้ง กฟส.ศ. ลงข้อมูล Wesafe แล้วปฏิบัติงานได้						
46	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
47	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
48	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
49	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
50	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
51	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
52	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
53	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		
54	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		
55	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
47	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
48	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
49	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
50	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
51	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
52	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
53	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
54	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
55	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		
56	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		
57	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	แจ้ง กฟส.สค. ทำการปลดซื้อตกราวด์จุด G1						
59	แจ้ง กฟส.สค. ทำการปลดซื้อตกราวด์จุด G2						
60	แจ้ง กฟส.สค. ทำการปลดซื้อตกราวด์จุด G3						
61	แจ้ง กฟส.สค. ทำการปลดซื้อตกราวด์จุด G4						
62	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
63	DIS ชั่วคราว SMB08	ปลด	สับ		สค.		DIS ชั่วคราวก่อนข้ามสะพานวัดบางสีด
64	DIS ชั่วคราว SMB13	ปลด	สับ		สค.		DIS ชั่วคราวก่อนข้ามสะพานวัดบางสีด
65	ย้ายโหนดวงจร SMB13 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMB03						
66	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		CB
67	DIS ชั่วคราว SMB13	ปลด	สับ		สค.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดบางสีด
68	SMB03S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ก่อนสถานีรถไฟบางสีด
69	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB
70	ย้ายโหนดวงจร SMW02 ไปจ่ายไฟจาก SMB09						
71	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		CB
72	SMW02VB-01	สับ	ปลด		SMW		CB
73	ย้ายโหนดวงจร SMB08 บางส่วนกลับจาก SMB09						
74	DIS ชั่วคราว SMB08	ปลด	สับ		สค.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดบางสีด
75	SMB08S-09	สับ	ปลด		สค.		SF6 ท้ายซอยซีผ้าขาว
76	ย้ายโหนดวงจร SMW02 กลับจาก SMB09						
77	SMW02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMW		CB
78	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB
79	ย้ายโหนดวงจร SMB08 บางส่วนกลับจาก SMB04						
80	SMB08VB-01	ปลด	สับ		SMB		CB ขนานบัส
81	SMB08S-10	ปลด	สับ		สค.		SF6 อยู่ซ่อมรถตายหาย
82	SMB08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากซอยกระเช้าขาว
83	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB ขนานบัส
84	ย้ายโหนดวงจร SMB04 ไปจ่ายไฟจาก SMW03						
85	SMB04S-16	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 บั้ม PT ปากทางท่าฉลอม
86	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB
87	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
88	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
89	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
90	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
91	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
92	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
93	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		
94	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		
95	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

SMB35-09  
บันทึกระเบิด

SMB88-07

ปากทางวัดบางสีคต

คณะกรรมการไฟฟ้าก่อนปฏิวัติ

อน

DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน  
ข้ามสะพานวัดบางสีคต

คลองสุนัขหอน

DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน  
ข้ามสะพานวัดบางสีคต

คลองสุนัขหอน

DIS ติดตั้งชั่วคราว  
หน้าวัดบางสีคต

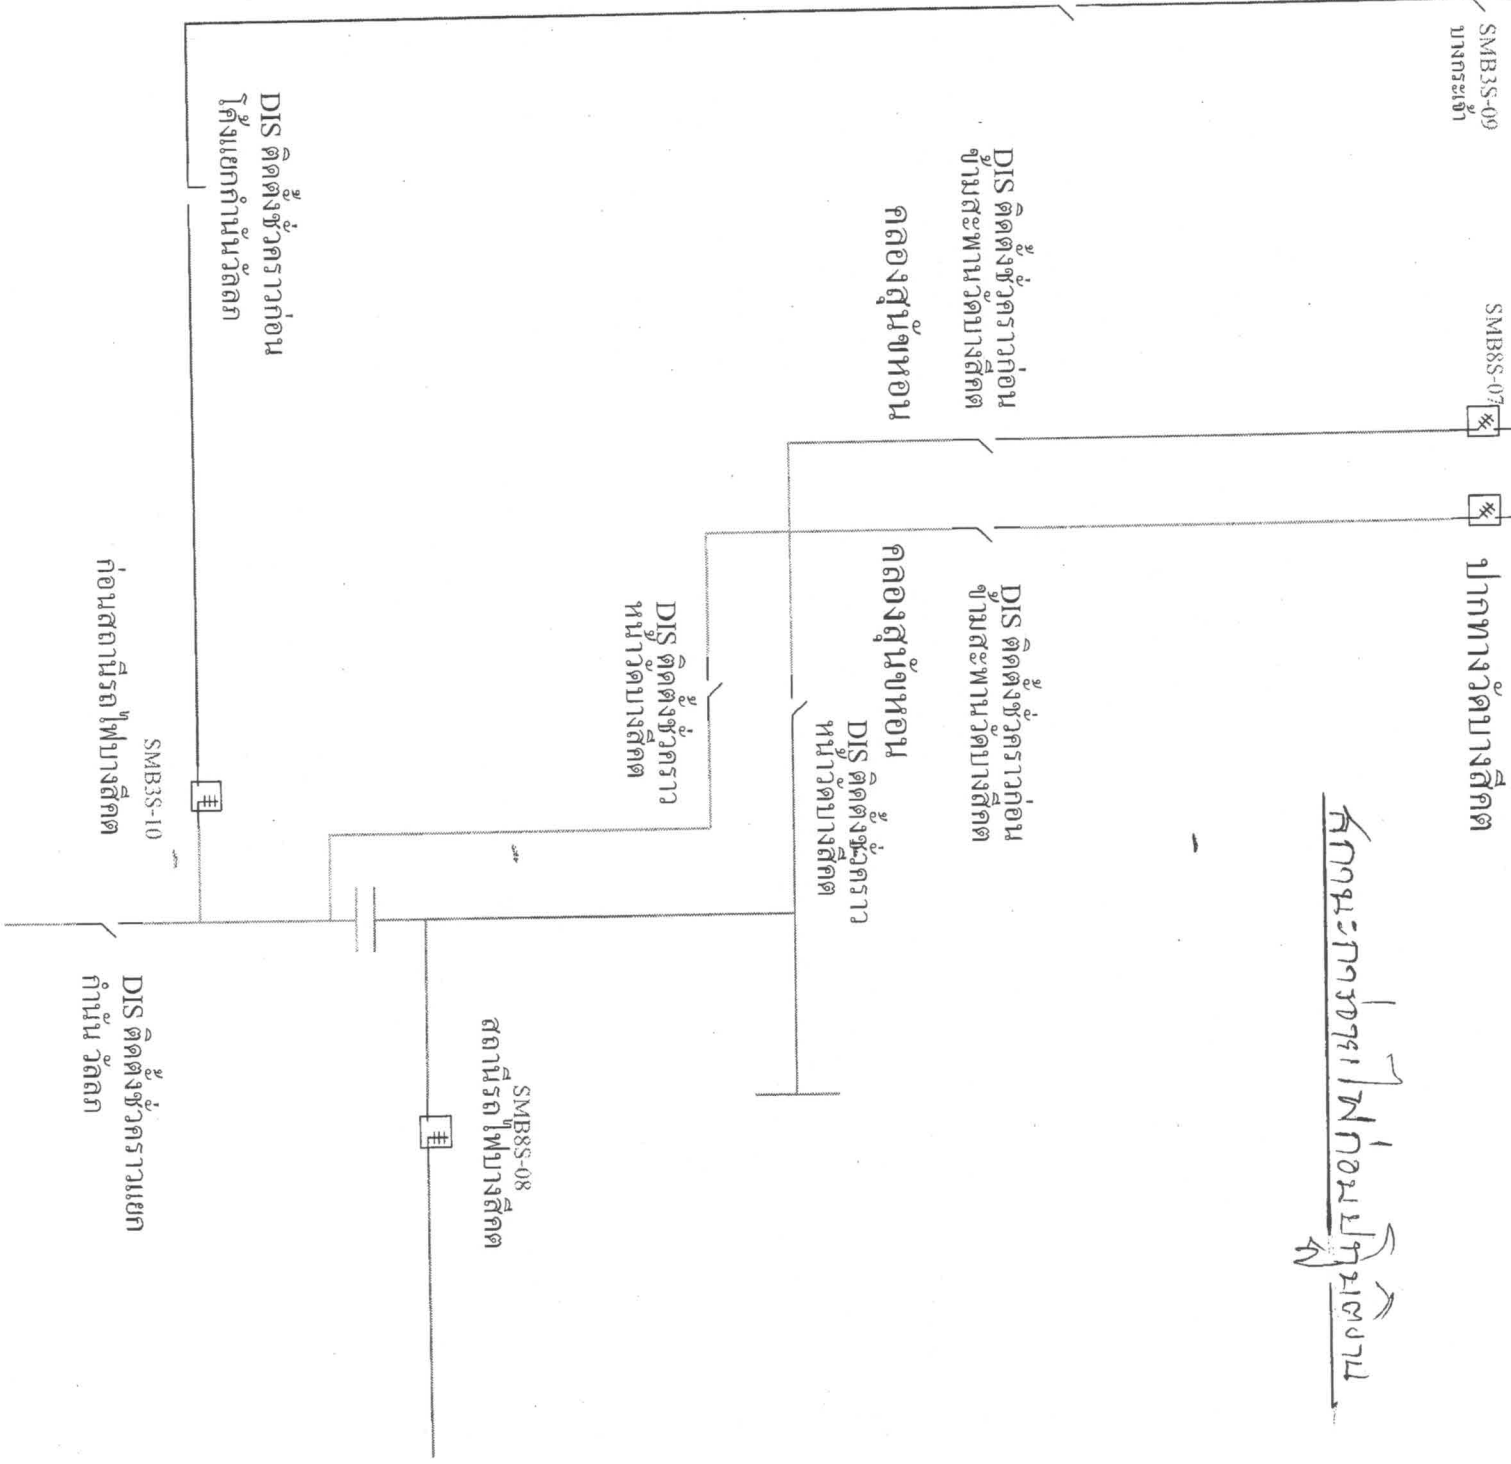
DIS ติดตั้งชั่วคราว  
หน้าวัดบางสีคต

SMB88-08  
สถานีรถไฟบางสีคต

DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน  
โค้งแยกก้านน้ำลลภ

SMB35-10  
ก่อนสถานีรถไฟบางสีคต

DIS ติดตั้งชั่วคราวแยก  
ก้านน้ำ ลลภ



SMB3S-09  
บางกระเจ้า

SMB8S-07

ปากทางวัดบางเสียด

การปะการังไฟส่องสว่าง

ก่อน

DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน  
ข้ามสะพานวัดบางเสียด

กล่องสัญญาณ

DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน  
ข้ามสะพานวัดบางเสียด

กล่องสัญญาณ

หน้าวัดบางเสียด

DIS ติดตั้งชั่วคราว  
หน้าวัดบางเสียด

G4

ไฟส่องสว่าง

DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน  
โค้งแยกกำแพงวัด

SMB3S-10  
ก่อนสถานีรถไฟบางเสียด

DIS ติดตั้งชั่วคราวแยก  
กำแพงวัด

SMB8S-08  
สถานีรถไฟบางเสียด

