



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
2 ก.พ. 67

เลขที่ ก.3.ตน.(ปบ) 113 /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 25 ม.ค. 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เคมิมานางนวมขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย (ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง)ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DAA 05	3 ก.พ. 67	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายเสาแรงสูง	DAA5R-01 หนองหิน	ดิสชั่วคราววัดหนองหิน	นาย ศันรินทร์ แก้วปานกัน 080- 9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเดอร์ DAA5 จาก DAA5R-01 ถึง ดิสชั่วคราววัดหนองหิน
ในวันที่ 3 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 156/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ รก.ทอ๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

(นายศันรินทร์ แก้วปานกัน)

ร.จก.5 แทน ผจก.กฟอ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. - ดบ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DAA05R-01 ถึง DIS ชั่วคราวหนองหิน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ย้ายเสาแรงสูง 22 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 156/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 27 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, สุกข์ชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร, วัฒนา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA05R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.		
3	HKA07R-104	Normal	Nonreclosing		กฟน.3		
4	**ดับไฟย้ายโหนด เวลา 08.30 น.**						
5	- ย้ายโหนด DAA05 บางส่วนไปจ่ายจาก HKA07						
6	DISชด.DAA05	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS วัตหนองหิน
7	DAA05S-07	ปลด	สับ		ดบ.		DIS หนองหิน - เนินขาม
8	- ดับไฟทำงาน						
9	DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.		R หนองกระทุ่ม
10	SW.LOAD	สับ	ปลด		ดบ.		R หนองกระทุ่ม
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.ดบ.รับทราบ						
12	แจ้งชุดทำงานเทสไฟดับให้เรียบร้อยก่อนทำการ Short Ground						
13	แจ้งชุดทำงาน Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงาน Short ground จุด G2						
15	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการลง WE SAFE ให้รับทราบ						
16	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
17	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
18	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA	กฟน.3	
19	HKA07R-104	Nonreclosing	Normal		กฟน.3		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
20	หลังจาก กฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	แจ้งชุดทำงานปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานปลด Short ground จุด G2						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	DAA05R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.			
25	HKA07R-104	Normal	Nonreclosing		กพน.3			
26	- จ่ายไฟ							
27	SW.LOAD	ปลด	สับ		ดบ.		R	หนองกระทุ่ม
28	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R	หนองกระทุ่ม
29	**ดับไฟย้ายโหลด**							
30	- ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนกลับจาก HKA07							
31	DAA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	หนองหิน - เนินขาม
32	DISชค.DAA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	วัดหนองหิน
33	DAA05R-01	Nonreclosing	Normal		ดบ.			
34	HKA07R-104	Nonreclosing	Normal		กพน.3			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
วงจร DAA 05 บริเวณ DAA5R-01 ท้องถิ่น ถึง คิวชั่วคราววัดท่อนอนถิ่น
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

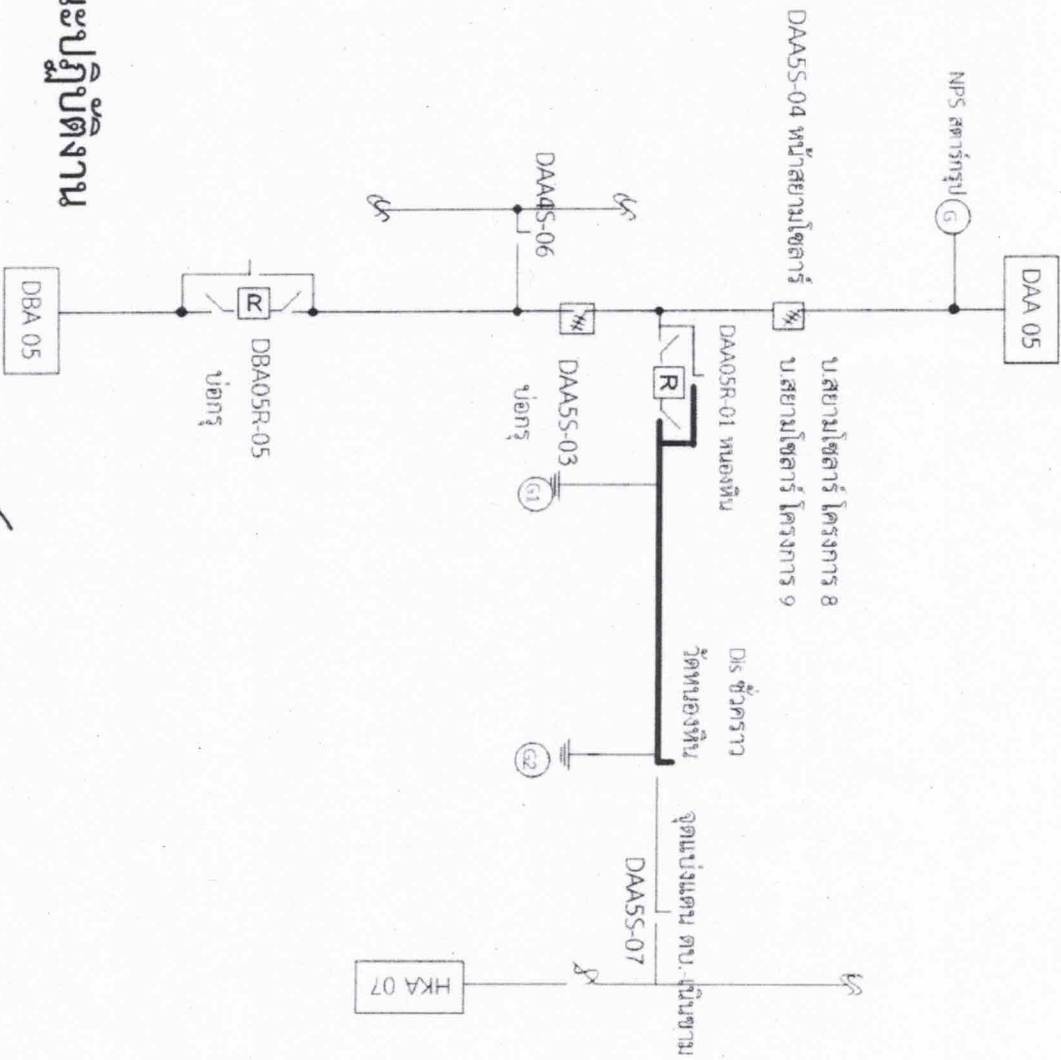

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดับไฟ บริเวณที่ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

(Handwritten signature)
2567

