



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 1054/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

04/11/67

วันที่ 28 ต.ค. 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางมาช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษแอนโซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	7 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม.	ดิสชั่วคราว	ดิสชั่วคราว	นายอำนาจ
2	DBA 06	7 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ผังตรงข้าม รพ.เดิมบางนางบวช	ตรงข้ามเขาชะโอย DBA 6S-02 โรงกลึงนางบวช	ก่อนอำเภอเดิมบางฯ DBA 6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบางนางบวช	กิตติโพธิ์นันท์ ว.ก.9 กรย. (ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.852258... Long: ...100.097905.....
3.2 สิ้นสุด Lat ... 14.836259... Long: ... 100.11079.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก Dis ๕๖ ทรงข้ามเขาชะโอยถึง Dis ๕๖ ก่อนอำเภอเดิมบางฯ
ในวันที่ 7 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1621/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA06 จาก DBA06S-02 ถึง DBA06S-03
ในวันที่ 7 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1621/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัชชา วงศ์บุญภาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางวาทิณี ศรีศักดิ์

นางสาว

สุภัชชา

(นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญภาค)

วศก. 5 โทร. ๓๖๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้าม รพ.เดิมบางนางบวช		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง 22 เมตร ตามใบขอปฏิบัติงาน 1621/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 29 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 2.92 MW
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 5.33 MW
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 3.52 MW
7	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA01						
8	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
9	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
10	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
11	DBA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
12	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
13	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05						
14	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ช่างขนส่ง
15	Dis ชด.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชด. ก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
17	Dis ชด.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชด. ตรงข้ามเขาชะไวย
18	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดบ. รับทราบ						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
24	เมื่อ กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
25	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
27	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
28	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
29	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อ กฟส.ดบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
31	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
32	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
33	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G3						
34	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G4						
35	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซ์						
36	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
37	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
38	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
39	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
40	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	ชค. ตรงข้ามเขาชะไอย
43	DBA06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SCADA SF6	โรงกลึงนางบวช
44	ย้ายโหลด DBA05 กลับสภาพปกติ						
45	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	ชค. ก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช
46	DBA05S-04				ดบ.	SCADA SF6	ข้างขนส่ง
47	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05						
48	DBA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
49	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
50	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
51	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
52	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
53	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
54	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
55	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
56	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
57	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขุดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DBA05บริเวณ Dis ชั่วคราวตรงข้ามเขาชะโอบย ถึง Dis ชั่วคราวก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช

วงจร DBA06บริเวณ DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช ถึงDBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบางนางบวช

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

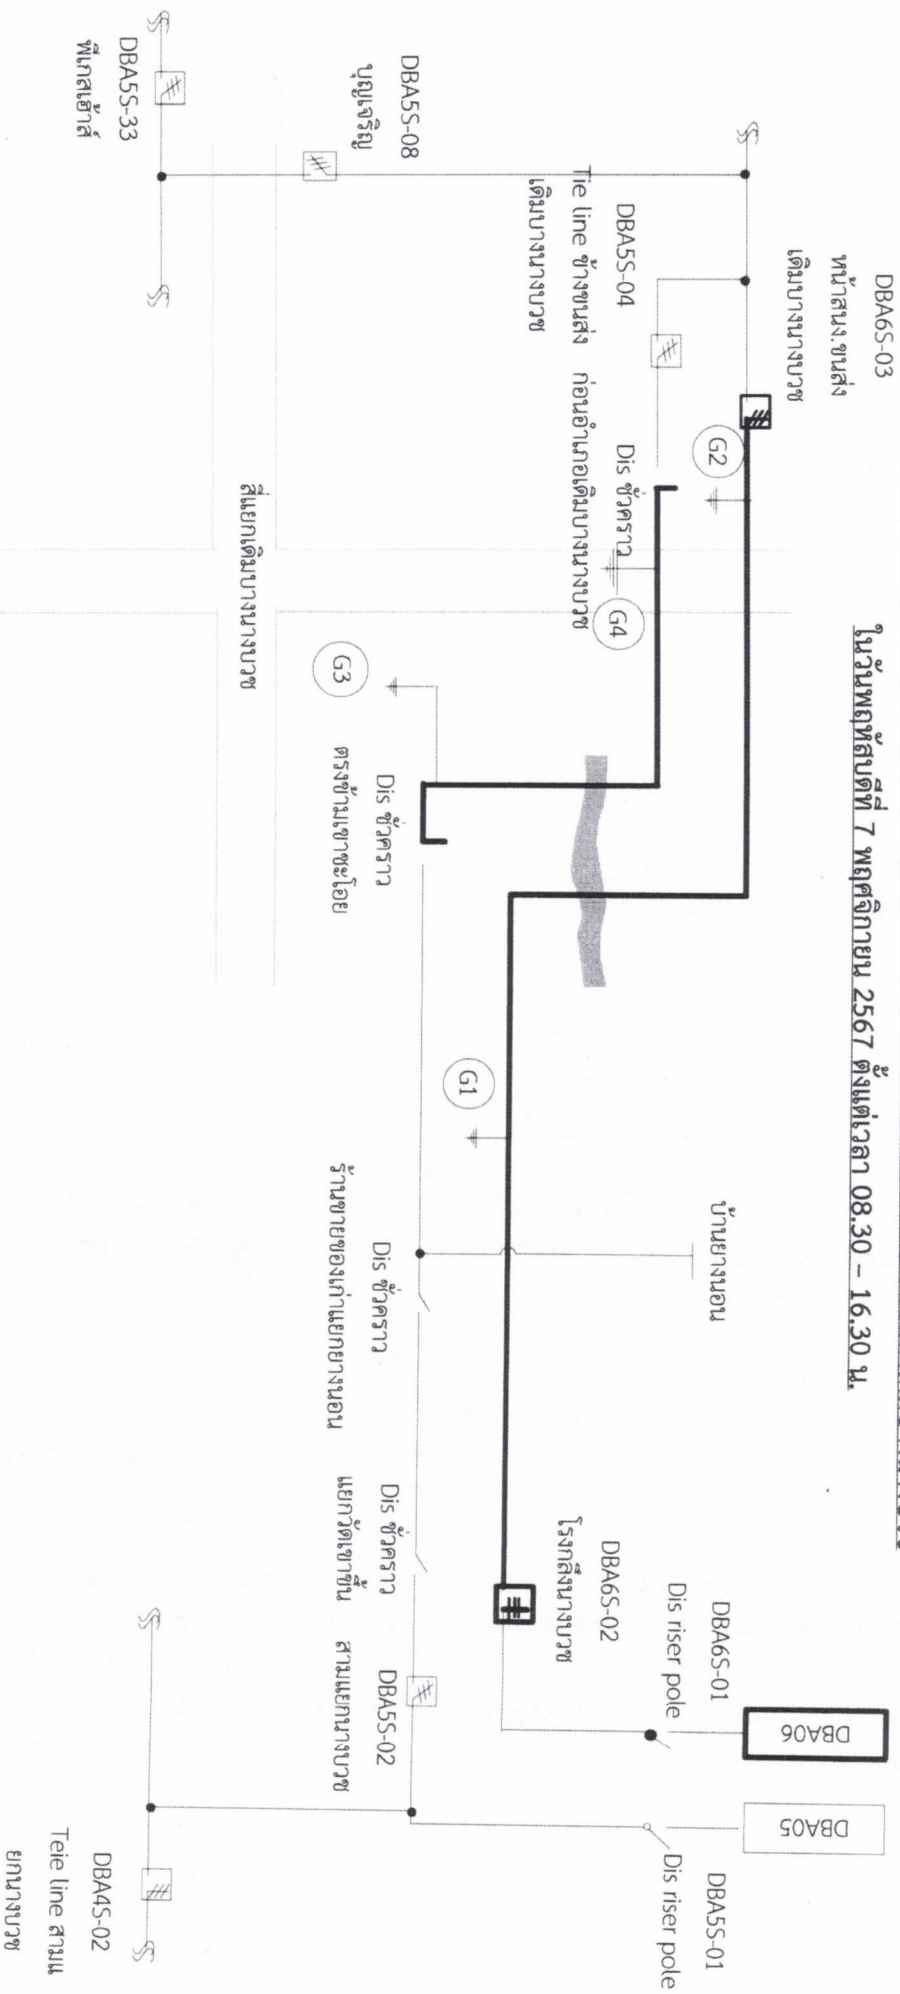

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. คัดไปเพื่อให้ บ.ศิริชลธร จำกัด ปักเสาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

หมายเหตุ — บริเวณที่ขุดไฟปฏิบัติงาน

Signature

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

SCT-CM-24-1086

วันที่ 25 ตุลาคม 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริชแอนด์ไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB)

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อทำการปักเสา 22 เมตร

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล)

สำเนาเรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย.(ก.3))

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานขอดับไฟเพื่อปักเสา 22 เมตร จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริชแอนด์ไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB) นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี เพื่อปักเสา 22 เมตร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 67 และ วันที่ 10 พฤศจิกายน 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. บริเวณถนนคลองเรียบชลประทาน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้
ต่อไป



(นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์)
วศก.๙ กรย.(ก๓) ผู้ควบคุมงาน

ขอแสดงความนับถือ



นายพรภัทร ลือขจร
ผู้จัดการโครงการ

