



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY ADMINISTRATION

Switching Deadline

วันที่ 2 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)- ๒๓๑๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพัตตะณะ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมวงจรใหม่ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTE ๑๐	๓ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดก่อสร้าง กฟอ.กทบ. พาดสาย เคเบิลแรงสูงวงจรใหม่เพิ่มเติม	จุด DDE หน้าหลัง Dis KTE ๑๐S-๐๖ ปากทางเทศบาล ตำบลคอนไถ่	DIS KTE ๑๐S-๐๖ ปากทางเทศบาล ตำบลคอนไถ่	นายวิชา แก้วสีม่วง ท.กทบ. โทร.๐๘๓-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ท.ป.บ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๙๓...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพัตตะณะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ KTE10 จาก DDE หน้า KTE10S-06 ถึง DDE หน้า KTE10S-06
ในวันที่ 03-11-64 ตั้งแต่เวลา ๐800 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1642/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ป.บ.กทบ. มาบัณฑิตย์
30 พ.ย. 64

(สมพร ตันฉัตรทอง)
๐๘๓. 7 แทน ท.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน
กำหนดวันที่ทำงาน
ผู้ขอทำงาน
เตรียมการสวิตชิงโดย
ตรวจสอบสวิตชิงโดย
อนุมัติสวิตชิงโดย
สั่งทำสวิตชิงโดย

สามแยกเทศบาลดอนโก่


03/11/2564	เวลา 08.30 น.	ถึง	03/11/2564	เวลา 17.00 น.
กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	พาดสายเคเบิลแรงสูงวงจใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1642/2564
	นายมงคล ทรัพย์สุข		วันที่	30 พฤศจิกายน 2564
			วันที่	30 พฤศจิกายน 2564
			วันที่	30 พฤศจิกายน 2564
	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTE							
1	ย้ายโหลด KTE10 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE04						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	KTE04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	KTE10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	KTE04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 รั้นขายไข่
7	KTEBVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
8	KTE04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เทศบาลดอนโก่
9	KTEBVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
10	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
11	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ KTE10 บริเวณ จุดที่ 1 ไม่มีโหลด (โดยวิธีชอทไลน์)						
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ KTE10 บริเวณ จุดที่ 2 ไม่มีโหลด (โดยวิธีชอทไลน์)						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					กทบ.	
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					กทบ.	
17	KTE04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
18	KTE10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
19	KTE04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	KTE10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					กทบ.	
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					กทบ.	
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ KTE10 บริเวณ จุดที่ 1 (โดยวิธีชอทไลน์)						
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ KTE10 บริเวณ จุดที่ 2 (โดยวิธีชอทไลน์)						
25	ย้ายโหลด KTE10 บางส่วนคืนจาก KTE04						
26	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
27	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
28	KTEBVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
29	KTE04S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เทศบาลดอนโก่
30	KTEBVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	KTE04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ		SF6 รั่วหายไข
32	KTE04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
33	KTE10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
34	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
35	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟฟ้า บริเวณสถานแยกปาทางเทศบาลตำบลอนันต์
 เพื่อให้ ศกต.กทบ. ปฏิบัติงานทดสอบสายเคเบิลแรงสูงระบบ 22 เควี เพิ่มเติม
 ในวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(กศ.)-070 ลว. 11 มี.ค. 2564) WBS:P-TDD02.3-I-KYNNA.0003

หมายเหตุ ให้นำผู้เข้ามารับสถานะ

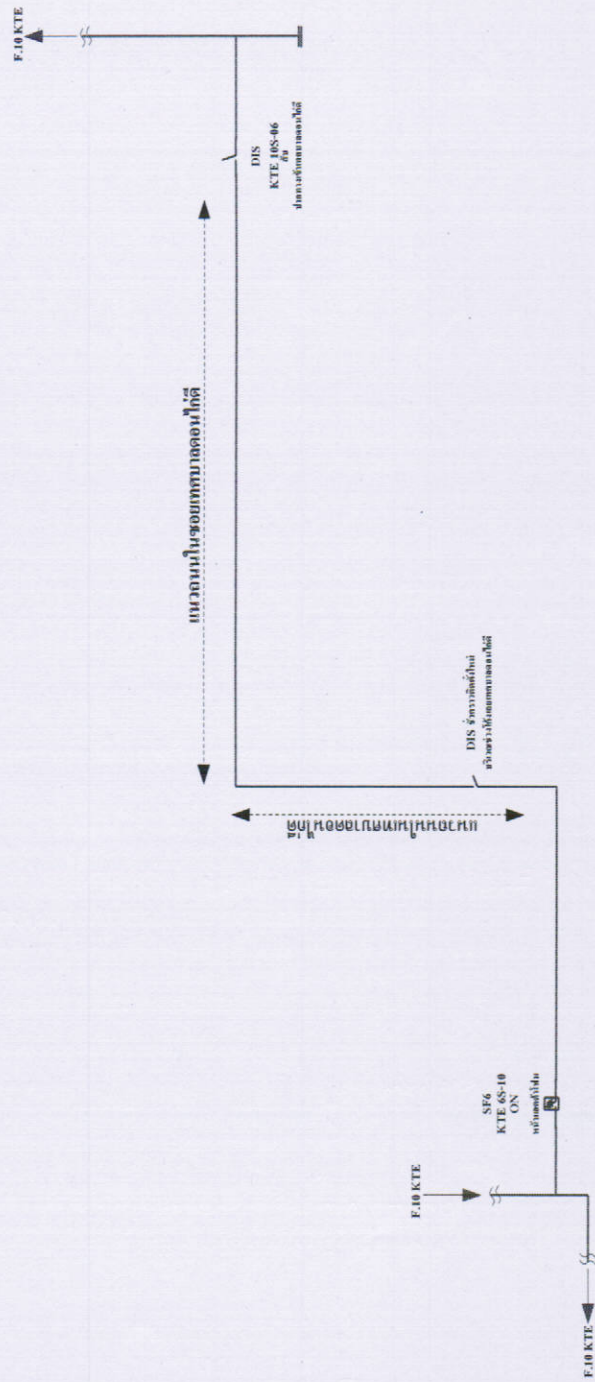

แผนผังสถานะปัจจุบัน ทังต์ับไฟฟ้า บริเวณสามแยกปากทางเทศบาลตำบลอนันต์
 เพื่อให้ ผศ.ศ.กทบ. ปฏิบัติงานทดสอบสายเคเบิลแรงสูงรองรับแรงระบบ 22 คิว เพิ่มเติม
 ในวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(กส.)-070 ลว. 11 ม.ค. 2564) WBS:P-TDD02.3-I-KYNNA.0003

หมายเหตุ

ในนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ

เส้นทึบสีม่วงได้วงจรฟีดเตอร์ 10 กทบ. ส่วนไฟปฏิบัติงาน

**** หน่วยงานที่ไม่มีจุดซ็อกคาร์วักให้สอก็ได้ปฏิบัติงาน ****

