



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

17 พ.ย. 66

เลขที่ ก.3.คณ.(ปบ) 1091 /2566  
ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พนิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 9 พ.ย. 2566  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานเปลี่ยนทดแทนฯ I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๖, I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๗ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01	22 พ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสา/รีดถอนสายแรงสูงฟีดเดอร์ 1 /	ดิสชั่วคราวหน้าสาธารณสุขก่ามะเขียร	สุดไลน์ ข่างรี โคลสเซอร์เขาศรี	นาย ศักนรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693
2.	DBA 05	22 พ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูงฟีดเดอร์ 5 บริเวณบ้านก่ามะเขียร-บ้านเขาศรี	ดิสชั่วคราวหน้าบุญกาญจน์คอนกรีต	DBA 5R-03 เขาศรี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.พ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA1 จาก Dis. บริเวณบ้านก่ามะเขียร ถึง สุดไลน์  
ในวันที่ 22 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1662/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA5 จาก Dis. บุญกาญจน์คอนกรีต ถึง DBA 5R-03  
ในวันที่ 22 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1662/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิทักษ์พงษ์ ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ค.ว.ร.อ.ท. อ.วิ.ศ.ก.๓

(นางสาวฉัตร พงษ์ศิริ  
อ.ท. 5 แทนน.พ. ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. พร.อบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน      บริเวณบ้านก้ามะเขียร - บ้านเขาศรี (DBA01,05)
2. กำหนดวันที่ทำงาน      22 พ.ย. 66      ระหว่าง      08.00 น.      ถึง      17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน      กพอ.ดบ.      งานที่ทำ      ปรับปรุงระบบจำหน่าย      ตามใบขอปฏิบัติงาน      1662/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง      วันที่      11 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย            วันที่      11 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย            วันที่      11 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นางสาวพชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวุฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
7	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R เขาศรี
8	ย้ายโหลด DBA05 (บางส่วน) ไปจ่ายไฟจาก DAA05						
9	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 บ.ห้วยนา
10	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.		R เขาศรี
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ DBA05R-03 R.เขาศรี ออกทั้ง 3 เฟส						
12	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
13	DIS ชต.ไลน์ DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS หน้าบุญกาญจน์คอนกรีต
14	DIS ชต.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS หน้าสาธารสุขก้ามะเขียร
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4 และส่ง Wesafe ให้เรียบริบาย						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงานแล้วให้ชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
20	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
21	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
23	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
24	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
25	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
26	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
27	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
29	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G4						
35	DIS ชค.ไลน์ DBA01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS หน้าบุญกาญจน์คอนกรีต
36	DIS ชค.ไลน์ DBA05	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS หน้าสาธารสุขกัมมะเข็ญ
37	ย้ายโหลด DBA05 (บางส่วน) กลับจาก DAA05						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการสับไบมีดด้านออกไลน์ของ DBA05R-03 R.เขาศิริ เข้าทั้ง 3 เฟส						
39	DBA05R-03	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		ดบ.		R เขาศิริ
40	DBA05S-14	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 บ.ห้วยนา
41	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
42	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
43	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
44	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
45	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
46	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R เขาศิริ
	สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด						




แผนผัง Single-line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า

DBA 01 DIS ชั่วคราวหน้าสถานีสารณสุขกำแพงเพชร ถึงสถานีข้างสถานีคลองข่อยราชบุรี

DBA 05 DIS ชั่วคราวหน้าบุญกาญจน์คอนกรีต ถึงสถานีคลองข่อยราชบุรี DBA5R-03

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

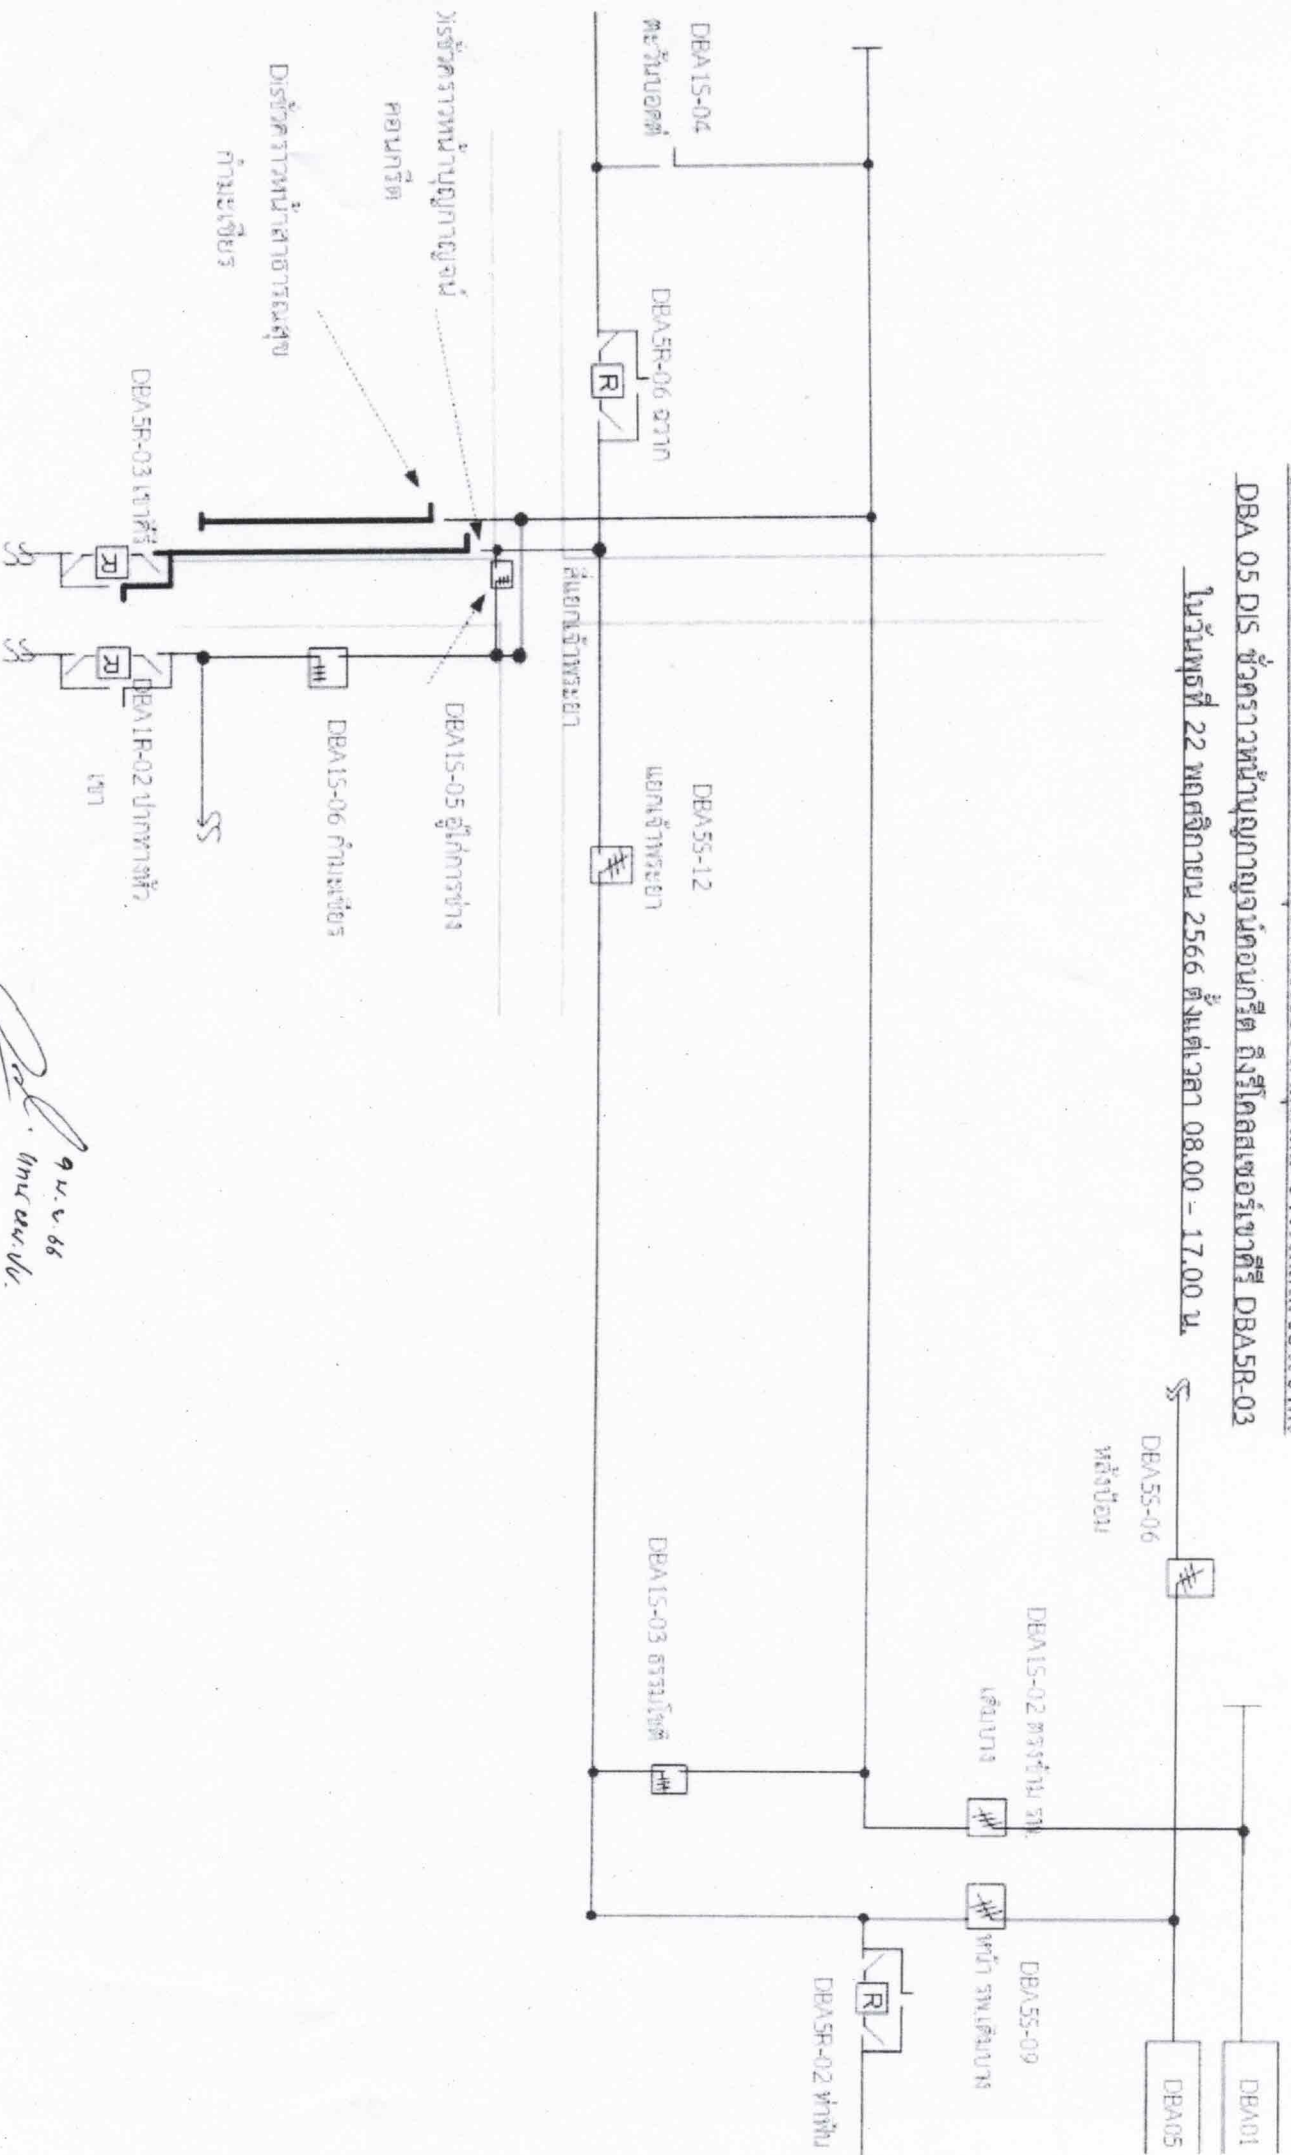

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ปรับปรุงเพื่อทำงานปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า

หน้างาน 100 - บริเวณที่ขุดสายไฟปฏิบัติงาน

94.66  
P. Anuwit

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน
