



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๓๐๓๗ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรตล

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา-พาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมวงจรใหม่ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน ๒แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTE ๐๘	๑๔ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	จุดก่อสร้าง กฟอ.กทบ. ปักเสาพาดสายเคเบิลแรงสูงเชื่อมโยง โลนวังจร F.๘ กับ F.๙ กทบ.๕ บริเวณท้ายซอยที่ตื้นรุ่งนทรีพท์	จุดเชื่อมสายไลน์ F.๘ กทบ.๕ ช่วงปากซอยตรง ข้ามศาลเจ้าตึก	DIS KTE ๐๘S-๐๔ ท้ายซอยที่ตื้นรุ่ง นทรีพท์ ตรงข้าม ศาลเจ้าตึก	นายเดมศักดิ์ วิเชียรสวัสดิ์ ทช.๗ ผจก.กทบ. โทร.๐๘๖-๓๕๓๖๑๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน ๒ รายจากการตัดไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทส.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๔๔๔๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรตล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิกัดเคอร์ KTE 08 จาก DDE 00A ถึง KTE 8S-04
ในวันที่ 19-12-64 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1679/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิกัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล น้อยกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์
16 ธ.ค. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

(นายสมชาย มาบัณฑิตย์)
อก. ๙ ทพ. นว. ๐๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1แผ่น
แผนผังแนบ 3แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ท้ายซอยที่ดินรุ่งธนทรัพย์						
กำหนดวันที่ทำงาน	19/12/2564	เวลา	08.30 น.	ถึง	19/12/2564	เวลา	17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	พาดสายเคเบิลแรงสูงวงจรใหม่			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1679/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	16 ธันวาคม 2564	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 ธันวาคม 2564	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 ธันวาคม 2564	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี KTE							
1	ย้ายโหลด KTE08 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE09						
2	KTE08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	KTE09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	KTE09S-08	ปลด	สับ		กทบ.		DIS รุ่งธนทรัพย์
5	KTE08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามศาลเจ้าตึก
6	KTE09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ KTE08 ตั้งแต่ บริเวณจุด A - KTE08S-04 (DIS.ตรงข้ามศาลเจ้าตึก) ออก (ตามผังแนบ)						
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ KTE08 บริเวณจุด A (โดยวิธีชอทไลน์)						
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					กทบ.	
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					กทบ.	
12	KTE08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
13	KTE08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
14	ตรวจสอบสายแรงสูงในไลน์ KTE08 บริเวณจุด B ทำการตัดเป็น DDE ตามผังแนบ แล้ว						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					กทบ.	
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					กทบ.	
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ KTE08 บริเวณจุด A (โดยวิธีชอทไลน์)						
18	ย้ายโหลด KTE08 บางส่วนคืนจาก KTE09						
19	KTE09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
20	KTE08S-04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามศาลเจ้าตึก
21	KTE09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS รุ่งธนทรัพย์
22	KTE08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
23	KTE09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟฟ้า บริเวณปากซอยตรงข้ามศาลเจ้าติ๊ก-ท้ายซอยที่ดินจัดสรรรุ่งนรินทร์
 เพื่อให้ ผศ.ศ.ภท. ปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงและพาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมอีก 1 วงจรเชื่อมโยงและลดโหลดโลน่วงจรฟีดเตอร์ 9 กทบ.5 กับฟีดเตอร์ 8 กทบ.5


ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.

(ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(ปบ.)-167 ลว. 5 ต.ค. 2564) WBS:P-TDD02.3-I-KNNA.0007

หมายเหตุ

มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจำนวน 2 ราย


๑ จุด A ถึง จุด B เป็นสายเคเบิล (SAC) ขนาด 50 ค.มม.

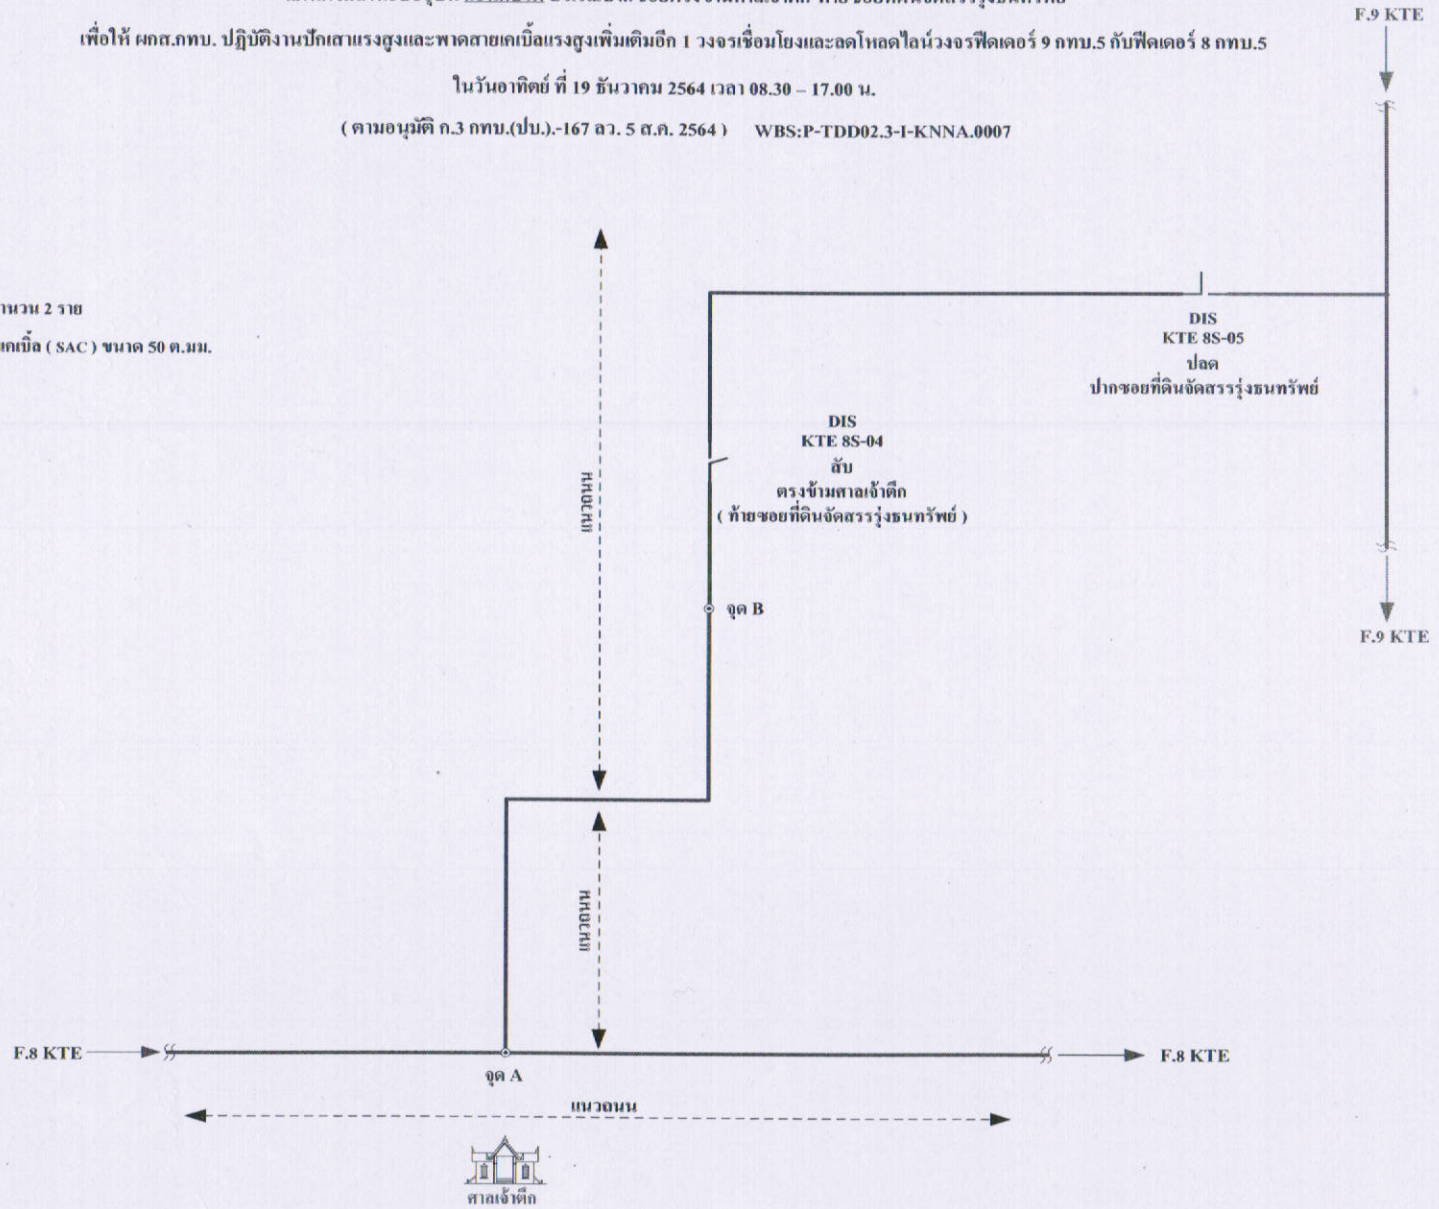

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณปากซอยตรงข้ามศาลเจ้าศึก-ท้ายซอยที่ดินจัดสรรรุ่งชนทรัพย์
 เพื่อให้ ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงและพาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมอีก 1 วงจรเชื่อมโยงและลดโหลดโลนัวงจรเฟดเดอร์ 9 กทบ.5 กับเฟดเดอร์ 8 กทบ.5

ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.

(ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(ปบ.)-167 ลว. 5 ต.ค. 2564) WBS:P-TDD02.3-I-KNNA.0007

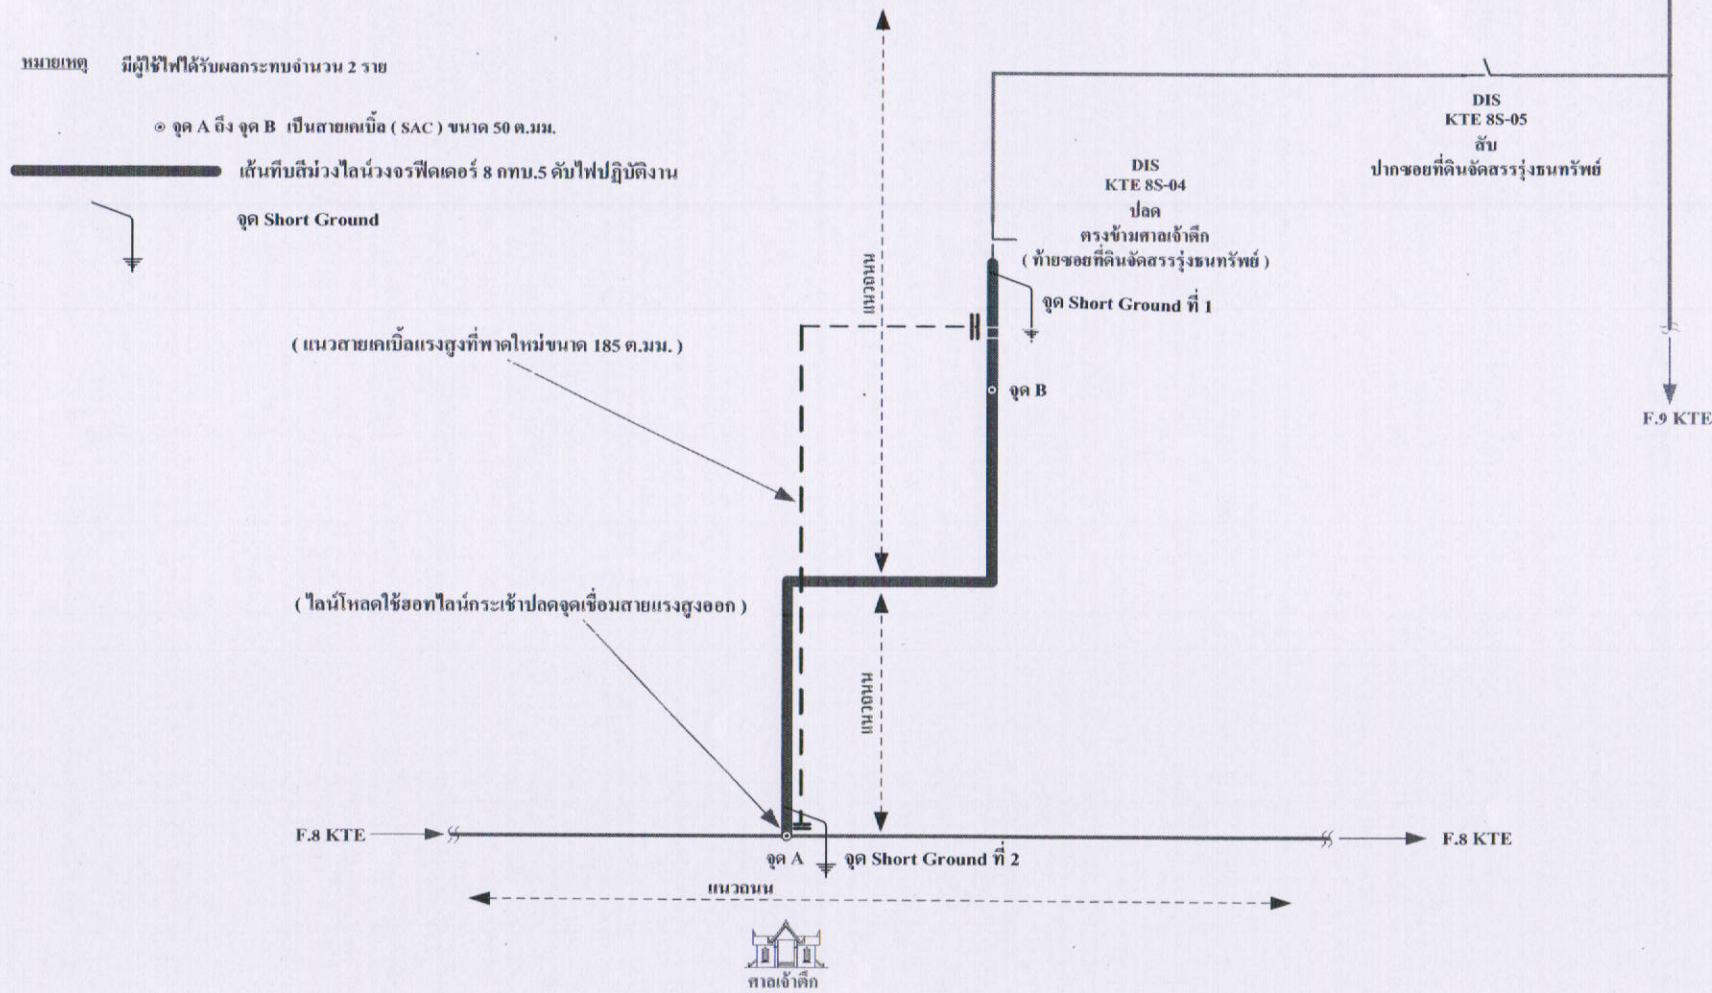

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังจ่ายไฟคืนระบบตามสภาพปกติ บริเวณปากซอยตรงข้ามศาลเจ้าตึก-ท้ายซอยที่ดินจัดสรรรุ่งนทรัพย์
 เพื่อให้ ผศส.กทบ. ปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงและพาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมอีก 1 วงจรเชื่อมโยงและลดโหลดได้นั่งวงจรฟีดเคอร์ 9 กทบ.5 กับฟีดเคอร์ 8 กทบ.5
 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(ปบ.)-167 ลว. 5 ส.ส. 2564) WBS:P-TDD02.3-I-KNNA.0007

