



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ)..1118./2567

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พชิวาสวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 11 พ.ย. 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟผ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัท แอนไฮด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	21 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาแรงสูง 22 ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ผังตรง	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะโอย DBA 6S-02	จุดตัดเดสบริเวณหน้า หมู่บ้านทองวิลล่า DBA 6S-03	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วิศวกร กบ.ล. (ก3) 086-2691259
	DBA 06	21 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	ข้าม ร.พ.เดิมบางนางบวช	โรงกลึงนางบวช	หน้า สนง.ขนส่งเดิมบางนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ป.น โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.852258... Long: ...100.097905.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.848171 Long: ... 100.100597.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA05 จาก DBA02 ไปจนถึง จุดตัด DDE บริเวณหน้า หมู่บ้านทองวิลล่า

ในวันที่ 21 พ.ย 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1701/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA06 จาก DBA6S-02 ถึง DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่ง


ในวันที่ 21 พ.ย 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1701/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย สามารถ จิตรมาตย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ควบคุมงาน วิศวกร กบ.ล.

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

๑๑๓.๗ กทพ พ.ด.พ.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมนางนางบวช		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1701/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนิช 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
2	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA06						
4	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ข้างขนส่ง
5	DIS ชด.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ตรงข้ามเขาชะโอบ
6	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05						
7	DBA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
8	DBA06S-03	สับ	ปลด+ ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
10	DBA06S-02	สับ	ปลด+ ล็อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
11	แจ้ง กฟส.ดบ.ทำการไลน์โหลดบริเวณพื้นที่ทำงานออกได้						
12	เมื่อ กฟส.ดบ.ทำการไลน์โหลดบริเวณพื้นที่ทำงานออกแล้วเสร็จ						
13	แจ้ง H/L ทำการตัด DDE หน้าหมู่บ้านทองวิลล่าออกทั้ง 3 เฟสได้						
14	เมื่อ H/L ทำการตัด DDE หน้าหมู่บ้านทองวิลล่าออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
15	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
17	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
18	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
20	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
21	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
22	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อ กฟส.ดบ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
25	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
26	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G3							
29	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G4							
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
31	แจ้ง H/L ทำการเชื่อม DDE หน้าหมู่บ้านทองวิลล่าเข้าทั้ง 3 เฟสได้							
32	เมื่อ H/L ทำการเชื่อม DDE หน้าหมู่บ้านทองวิลล่าเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
33	DBA06S-02	ปลด + ล็อคคาน	ล๊اب		ดบ.	SCADA	SF6	โรงกลึงนางบวช
34	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
35	DBA06S-03	ปลด + ล็อคคาน	ล๊اب		ดบ.	SCADA	SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
36	DBA05S-08	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
37	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06							
38	DIS ชด.ไลน์ DBA05	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	ตรงข้ามเขาชะโอย
39	DBA05S-04	ล๊اب	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ข้างขนส่ง
40	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
41	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								


แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DBA05 บริเวณ Dis ชั่วคราวตรงข้ามเขาชะโอย ถึงจุดตัดเตล หน้าหมู่บ้านทองวิลล่า

วงจร DBA06 บริเวณ DBA6S-02 โรงกลึงบางบวช ถึง DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบางบวช

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

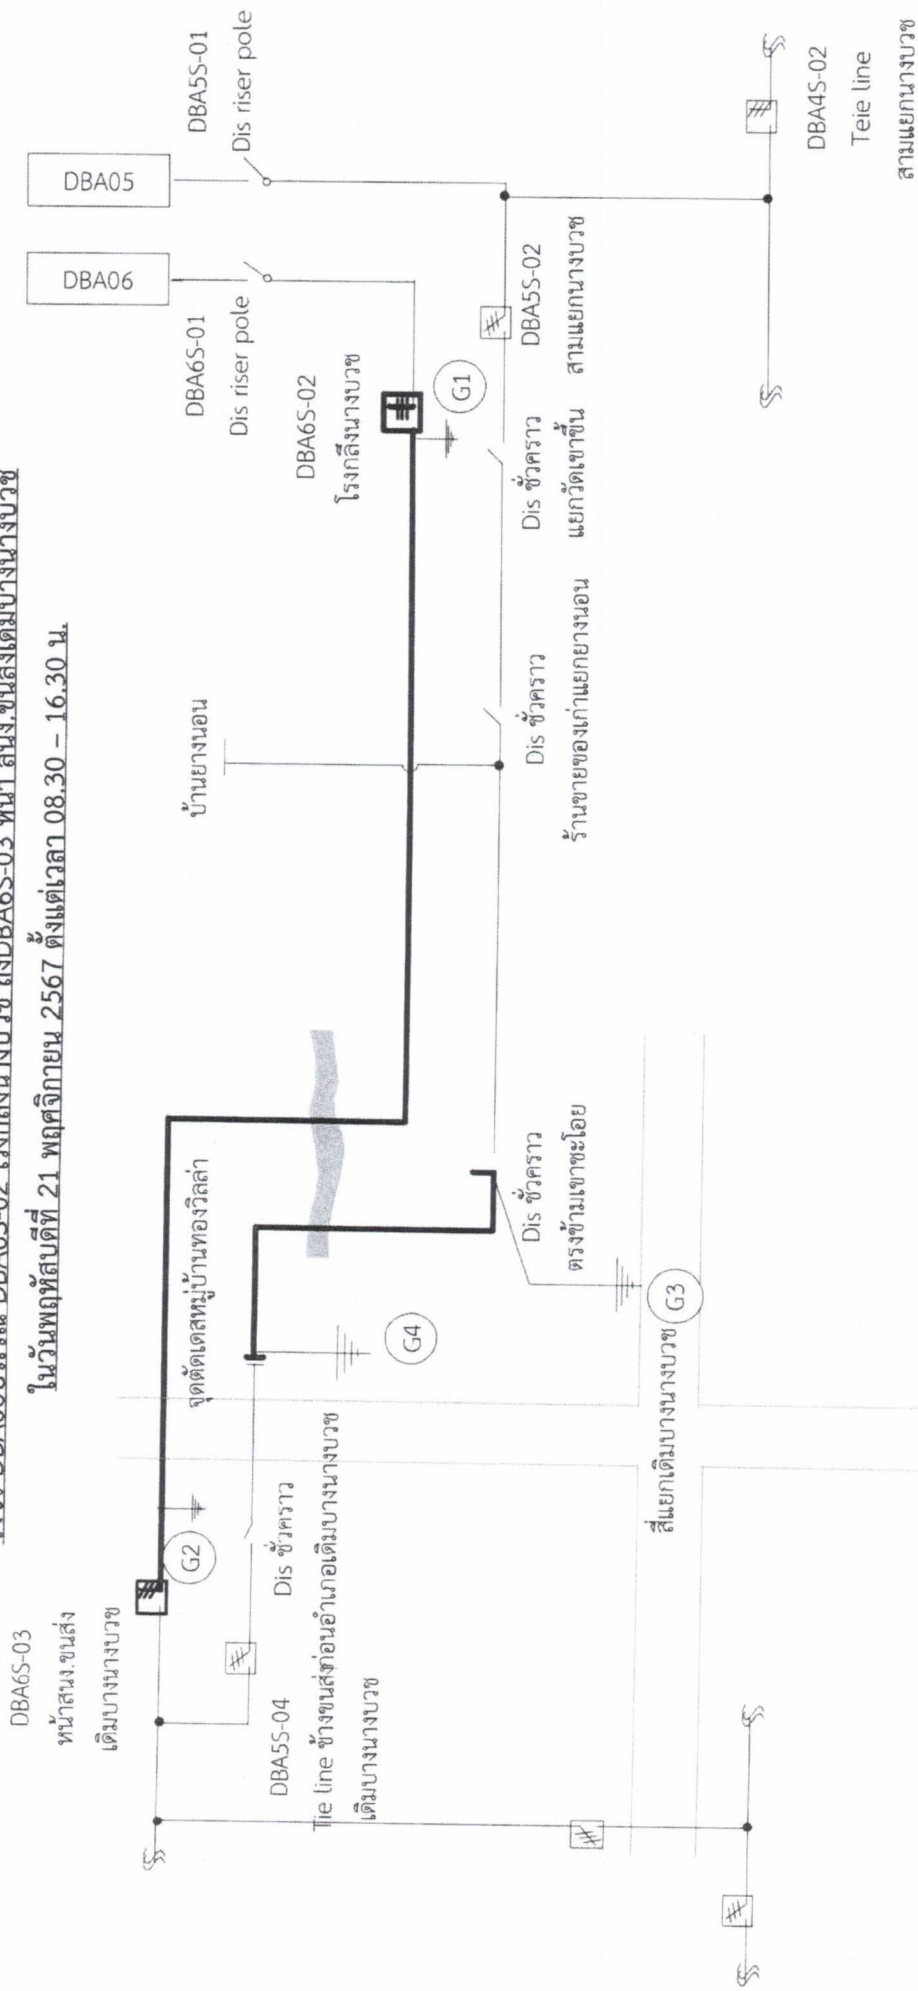

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดับไฟเพื่อให้ บ.ศรีชลธ จำกัด ปักเสาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน
 จุดตัดเตล หน้าหมู่บ้านทองวิลล่าใช้ชุดขอโทษันกระแสเข้าสู่พรธมบุรีดำเนินการ

(Signature)
 Ap. wee lot
