



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

18 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.สค.(ปณ) ๒๒๓๒ / ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พิชิตสุวรรณชัย  
 ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อก.ปณ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV บริเวณทางรถไฟบางกะเจ้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๓	๒๐ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV บริเวณทางรถไฟบางกะเจ้า	จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เครื่อก่อนทางรถไฟบางกะเจ้า	SMB๑๓S-๕๑ ก่อนโค้งก้านันวัลลภ	นายศรชัย แสงสนธิ์ โทร. ๐๘๓๑๕๕๖๒๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..บริเวณ ทางรถไฟบางกะเจ้า (หม้อแปลงเฉพาะไลน์ ๒ เครื่อง)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๑ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นาย วิโรจน์ เอกอ่ำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMB3 จาก DDE ชั้นคันทันพรทิไปเขตที่ ถึง SMB135-51  
ในวันที่ 10 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1714/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ งามรุ่งโรจน์ ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย กิรวัฒน์ บุญพร้อม .....

.....  
(นางสาวรุจิรา วงศ์บุญจก.)  
ตท. 5 แทน นพ.ต.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ค.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี .....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

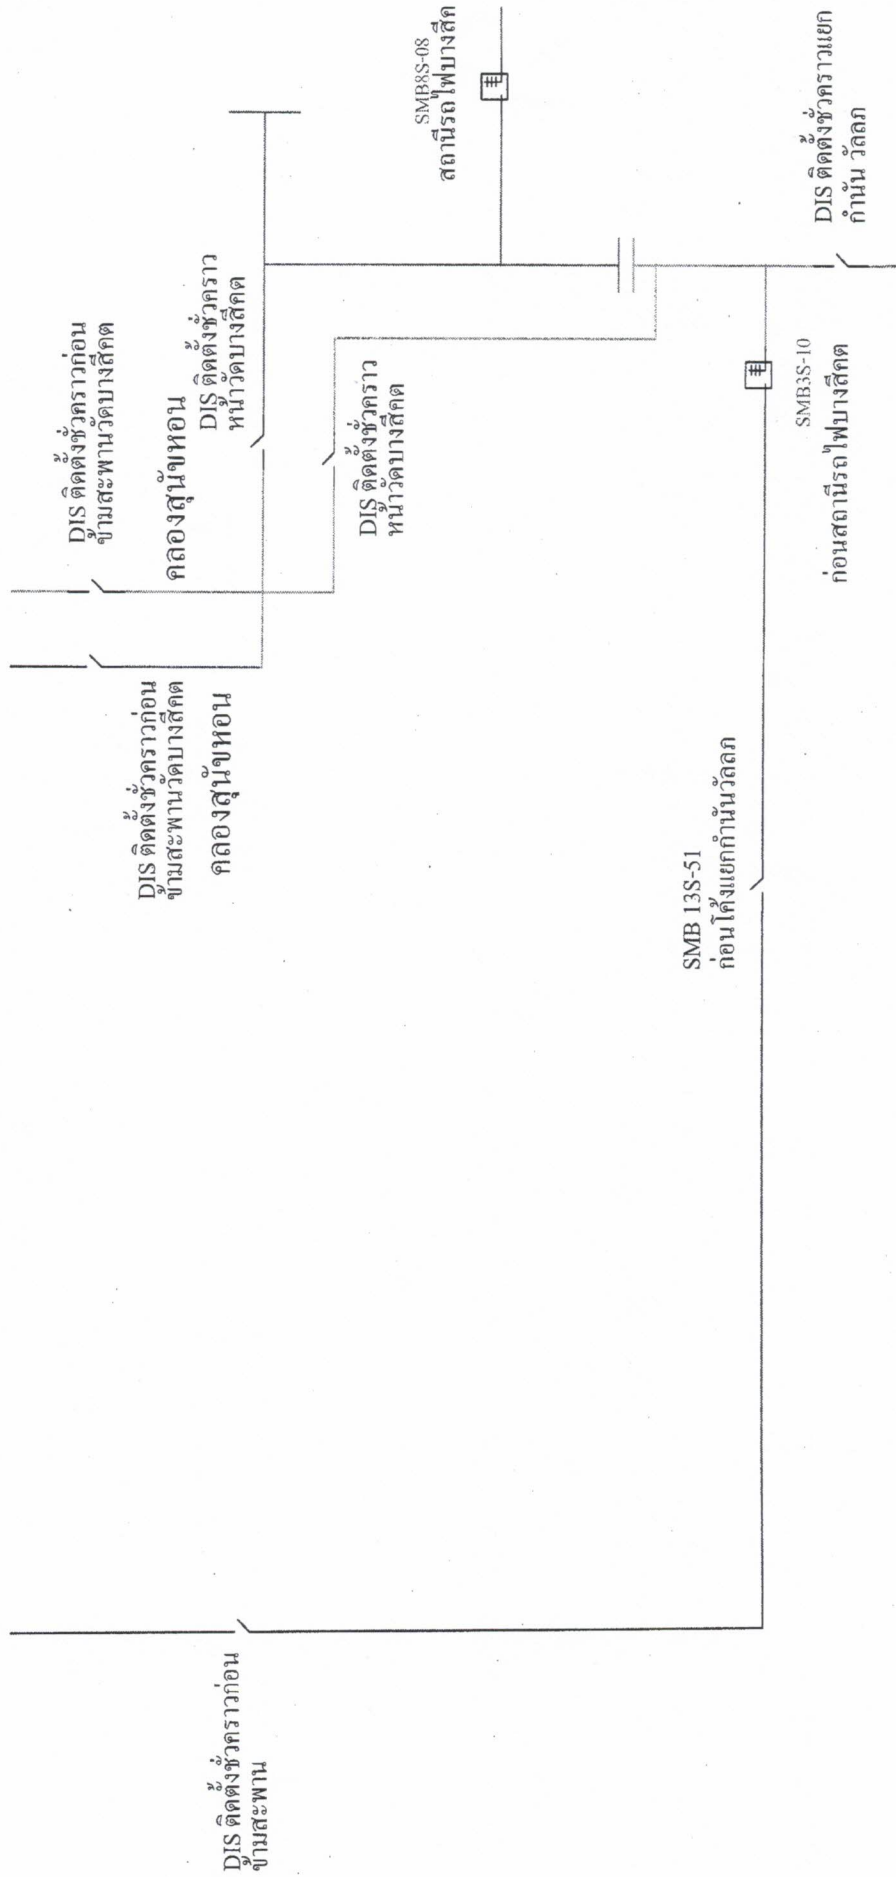
# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ทางรถไฟบางกระเจ้า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	20 พ.ย. 67	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1714/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม				วันที่	15 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	15 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	15 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
5	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
6	ย้ายโหลด SMB03 บางส่วนไปจ่ายจาก SMB13						
7	SMB03S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ท้ายขอยบางกระเจ้า
8	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
9	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
10	SMB13S-51	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ก่อนโค้งก้านวัลลภ
11	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
12	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	แจ้ง กฟผ.สค. ทำการไลน์โหลด บริเวณก่อนสะพานทางรถไฟบางกระเจ้า						
15	เมื่อ กฟผ.สค. ทำการไลน์โหลด บริเวณก่อนสะพานทางรถไฟบางกระเจ้า แล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณก่อนสะพานทางรถไฟบางกระเจ้า						
17	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณก่อนสะพานทางรถไฟบางกระเจ้า แล้วเสร็จ						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
22	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
25	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
27	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
29	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
30	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-



# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



# สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

