



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline
22 พ.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๖๗๕๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณท้ายซอย ๑๕ นิคม
สมุทรสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THU๐๔	๒๔ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ ท้ายซอย ๑๕ นิคม สมุทรสาคร	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบริษัท สยามโปร	THU๐๔S-๐๕ ท้ายซอย ๑๕	นายสุรพันธ์ คำ อุดม โทร. ๐๘๗๔๐๖๑๐๑
๒	THU๐๔	๒๔ พ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๕ ท้ายซอย ๑๕	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี เชิงสะพานชุมชน นิคม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ท้ายซอย ๑๕ นิคมสมุทรสาคร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดณ์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ขง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๕๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสรูด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THU4 จาก DDE ทัน. ขง. น. ป. ถึง THU4S-05, โรงสูบน้ำดิบ
ในวันที่ 24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1754/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ จาก THU4S-05 ถึง DDE โรงสูบน้ำดิบ
ในวันที่ 24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1754/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1754/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชบุรีนิม ประธานงานการขอดับไฟกับ นายจิรวัฒน์ นุญพันธ์

อนุสรณ์
(นายอนุสรณ์ เก่งมณี)
20 ก.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท้ายซอย 15 นิคมสมุทรสาคร					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	24 พ.ย. 67	17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สค.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1754/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	22 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMZ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		- -
3	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R -
4	แจ้ง กฟ.สค. ทำการไลน์โหลด บริเวณท้ายซอย 15 นิคมสมุทรสาคร						
5	เมื่อ กฟ.สค. ทำการไลน์โหลด บริเวณท้ายซอย 15 นิคมสมุทรสาคร แล้วเสร็จ						
6	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุดที่ 1 บริเวณหน้า บ.สยามโปร (ตามผังแนบ)						
7	เมื่อชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุดที่ 1 บริเวณหน้า บ.สยามโปร (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
8	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุดที่ 2 บริเวณเชิงสะพานชุมชนนิคมฯ (ตามผังแนบ)						
9	เมื่อชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุดที่ 2 บริเวณเชิงสะพานชุมชนนิคมฯ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
16	SMZ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		- -
17	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		R -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	SMZ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		- -
20	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R -
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
24	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุดที่ 2 บริเวณเชิงสะพานชุมชนนิคมฯ (ตามผังแนบ)						
26	เมื่อชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุดที่ 2 บริเวณเชิงสะพานชุมชนนิคมฯ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
27	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุดที่ 1 บริเวณหน้า บ.สยามโปร (ตามผังแนบ)						
28	เมื่อชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุดที่ 1 บริเวณหน้า บ.สยามโปร (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
29	แจ้ง กฟ.สค. นำโหลด บริเวณท้ายซอย 15 นิคมสมุทรสาคร กลับ						
30	เมื่อ กฟ.สค. นำโหลด บริเวณท้ายซอย 15 นิคมสมุทรสาคร กลับแล้วเสร็จ						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน




สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า
22 เควี เซิงสะพานชุมชนนิคม
ไม่มีโหลดน้ำดื่ม จุดที่ 2.

ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
THU4S-05

โรงสูบน้ำนิคมฯ

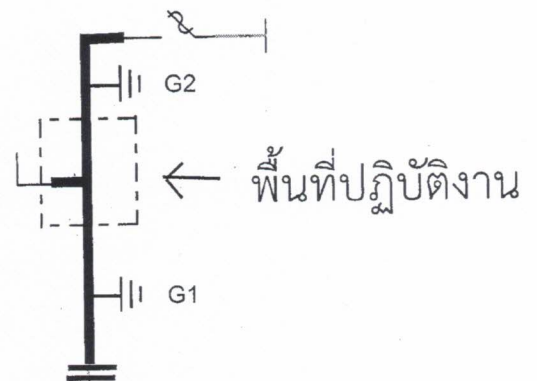

จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์
กระเช้า 22 เควี หน้า บ.สยามโปร

หน่วยซ่อมทำย. 15

บ.ไทยยินจง

THS6S-05

THU4S-04

