



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

27 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๒๔๕/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิธาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสุกรี

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบ
จำหน่าย ๒๒ เควี. ตั้งแต่ หน้าที่พื้นที่ก่อสร้าง สฟพ.กระท่อมแบน ๖ จนถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชวิทยาการ สถานีไฟฟ้า
กระท่อมแบน ๖ (ชั่วคราว) ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTU ๐๓ KTU ๐๕	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. ตั้งแต่ หน้าที่พื้นที่ก่อสร้าง สฟพ.กระท่อมแบน ๖ จนถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตร พันธุ์วิทยาการ	สี่แยกโรงเรียน บ้านแคราย เกษตรพันธุ์ พืชวิทยาการ	หน้า บริษัท เซียะ จ้อ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด	นายปรีชา แก้วสีม่วง ผ.ก.ส. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๑ - ๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชวิทยาการ จนถึง หน้า บริษัท เซียะ จ้อ เอ็น
เตอร์ไพรส์ จำกัด มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หล.ปบ. กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๔๖๔๘๘๗, ๑๐๐.๓๒๔๘๘๘๘
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๓๖๑๑๑๙, ๑๐๐.๓๒๓๗๔๘๘

(นายมาโนช วาสุกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเดอร์ KTU03 จาก DIS ๖๓-๑๖๖๖๖๖๖ ถึง KTAS5-12, DDE ไร่เฒ่า ๖๖๖๖๖๖๖
ในวันที่ 1 ธ ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1770/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สันทร จิตธรรมศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพพร ชาวไชยศรี
26 พ.ย. 67

(นายมาโนช วาสุกรี)
ร.จก.๓ แทน ผ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)
เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก. กฟส. กทบ.



ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผน
แผนผังแนบ 2 แผน

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

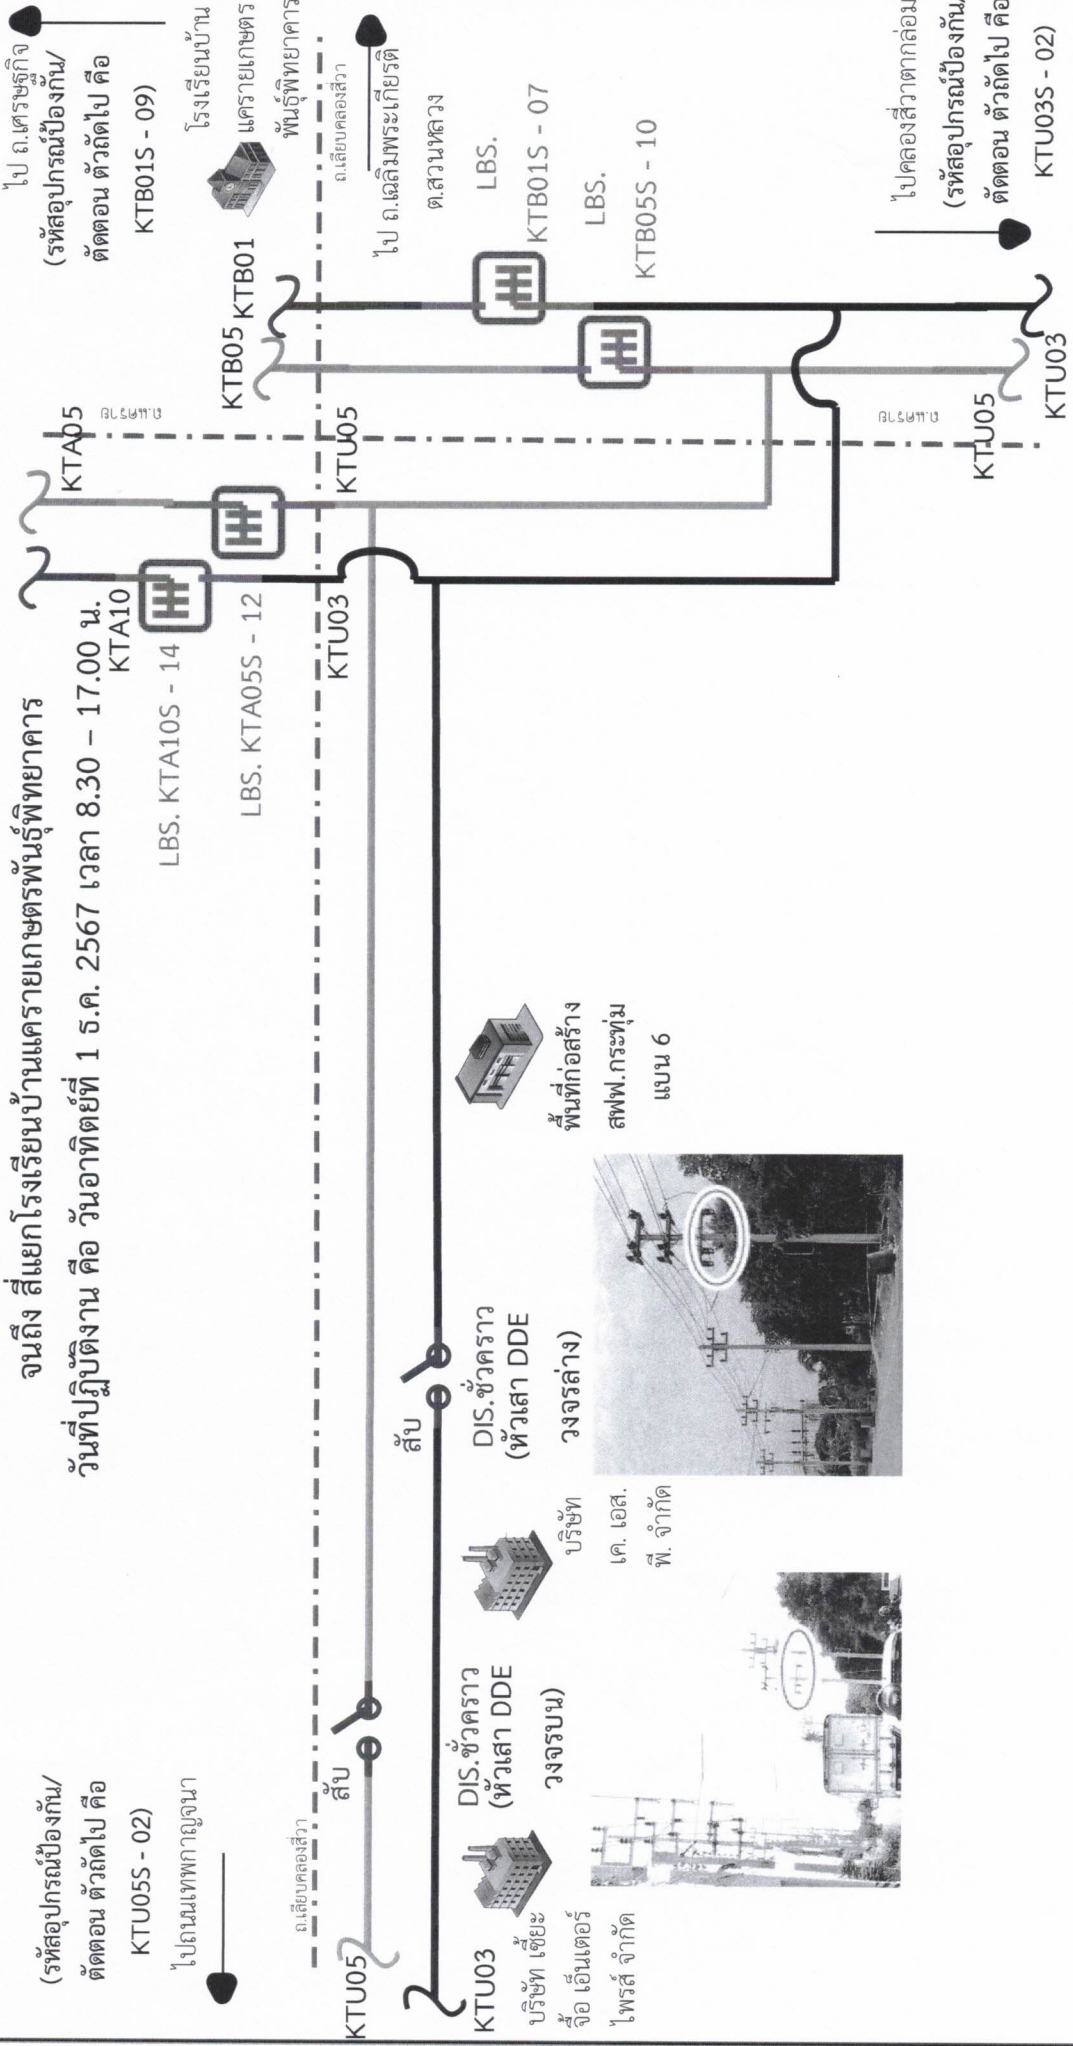
1. สถานที่ทำงาน	สพฟ.กทบ6 - สี่แยก รร.บ้านแครายเกษตรพันธ์พิทยาคม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1770/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชนิด, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU	-	-
2	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU	-	LOAD 2.51 MW
3	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU	-	LOAD 2.77 MW
4	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
5	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	LOAD 3.01 MW
6	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	LOAD 2.33 MW
7	ตรวจสอบ POT HEAD KTU02S-01 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
8	ย้ายโหลด KTU03 บางส่วนไปรับไฟจาก KTB01 และ KTU05 บางส่วนไปรับไฟจาก KTB05						
9	KTU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTU	-	-
10	KTB01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	ร้านเจ็ดตุ๊ก
11	KTB05S-10	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA SF6	ร้านทีวีสตูดิโอสร้าง
12	DIS ชด.ไลน์KTU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	หม้อแปลงไฟทาง อบต.แคราย
13	DIS ชด.ไลน์KTU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	เขี้ยวจ้อ เอนเตอร์ไพรส์
14	KTU02VB-01	สับ	ปลด		KTU	-	-
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
16	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการไลนโหลดในพื้นที่ดับไฟออกได้						
17	เมื่อ กฟส.กทบ.ทำการไลนโหลดในพื้นที่ดับไฟออกแล้วเสร็จ						
18	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการตรวจสอบ SF6 KTA05S-12 ,SF6 KTA10S-14 (ตรงข้าม รร.บ้านแคราย) อยู่ตำแหน่ง OPEN "พร้อม ล็อคคาน"						
19	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ไลน์ KTU03 และ KTU05 ออกทั้ง 3 เฟสได้						
20	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ไลน์ KTU03 และ KTU05 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
21	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
23	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.กทบ.ทราบ						
25	แจ้งให้ กฟส.กทบ.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
26	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU	-	-
27	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
28	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
29	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
30	KTB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
31	KTB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของ							
33	เมื่อ กฟส.กทบ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU	-	-
35	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU	-	-
36	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU	-	-
37	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
38	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
39	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
40	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground จุด G1						
41	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground จุด G2						
42	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการปลด Short Ground จุด G3						
43	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE โล้น KTU03 และ KTU05 เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
44	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE โล้น KTU03 และ KTU05 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
45	แจ้ง กฟส.กทบ.ทำการนำโหนดในพื้นที่ทำงานเข้าได้						
46	ย้ายโหนด KTU03 บางส่วนกลับจาก KTB01 และ KTU05 บางส่วนกลับจาก KTB05						
47	KTU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTU	-	-
48	DIS ชค.โล้นKTU03	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	หม้อแปลงไฟทาง อบต.แคทราย
49	DIS ชค.โล้นKTU05	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	เขี้ยว เอ็นเตอร์ไพรส์
50	KTB05S-10	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	ร้านทีวีสตูดิโอสร้าง
51	KTB01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SF6	ร้านเจ็ดตุ๊ก
52	KTU02VB-01	สับ	ปลด		KTU	-	-
53	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU	-	-
54	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
55	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU	-	-
56	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
57	KTB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
58	KTB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของ							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนการตัดไฟ บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชอาคาร จนถึง หน้า บริษัท เซียะ จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กทบ. ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. ตั้งแต่ หน้าที่พื้นที่ก่อสร้าง สฟพ. กระทุ่มแบน 6



หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 1 ราย

