



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

05 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๒๗๓๙ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หังสุวรรณ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูง บริเวณ ก่อสร้าง ปุ่ม ปตท.คลองท่าสาร ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DTM10	8 ธ.ค.66	09.00 น.	16.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง 22 เกรีย	DTM10S-05	BEA7S-12 จุดฮอทไลน์ตัด สาย	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พงช.6 ผกส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ริมคลองท่าสารฝั่งตะวันออก

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DTM10 จาก DTM10S-05 ถึง DDE, DTM7S-12
ในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1774/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บ.ล. กฟภ.๓๗.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2แผ่น

แผนผังแนบ 1แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ) -

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณริมคลองท่าสารฝั่งตะวันออก (DTM10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1774/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	30 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	30 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	30 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
3	DTM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	
4	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
5	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	CB	
6	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	อุกษมการไฟฟ้า
7	ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA06						
8	BEA07S-14	ปลด	สับ		บล.	SF6	บีมกิมม้อ
9	BEA06S-08	ปลด	สับ		บล.	SF6	ตรงข้าม รร.บางเลน
10	DTM10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	ครัวริมคลอง
11	BEA07S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	บีมกิมม้อ
12	ตรวจสอบ SF6 BEA07S-12 (บ้านหนองแพบ) อยู่สถานะ OPEN พร้อมให้ ล็อคคาน						
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลดโหลดไลน์วงจร DTM10 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก						
15	หลังจากทำการปลดโหลดไลน์วงจร DTM10 บริเวณพื้นที่ดับไฟ ออก เรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE ไลน์วงจร DTM10 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออกทั้ง 3 เฟส						
17	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE ไลน์วงจร DTM10 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
22	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	
23	DTM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
24	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	-	
25	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	CB	
26	BEA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	R	อุกษมการไฟฟ้า
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
28	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
31	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
33	DTM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
34	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-	
35	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		CB	
36	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	อยู่เขตการไฟฟ้า
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE โลว์วงจร DTM10 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) เข้าทั้ง 3 เฟส							
39	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE โลว์วงจร DTM10 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผัง) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
40	ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนกลับจาก BEA06							
41	BEA07S-14	ปลด	สับ		บล.		SF6	บีมกิมม้อ
42	DTM10S-05	ปลด	สับ		บล.		DIS	ครัวริมคลอง
43	BEA06S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	ตรงข้าม รร.บางเลน
44	BEA07S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	บีมกิมม้อ
45	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
46	DTM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
47	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
48	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		CB	
49	BEA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	อยู่เขตการไฟฟ้า
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

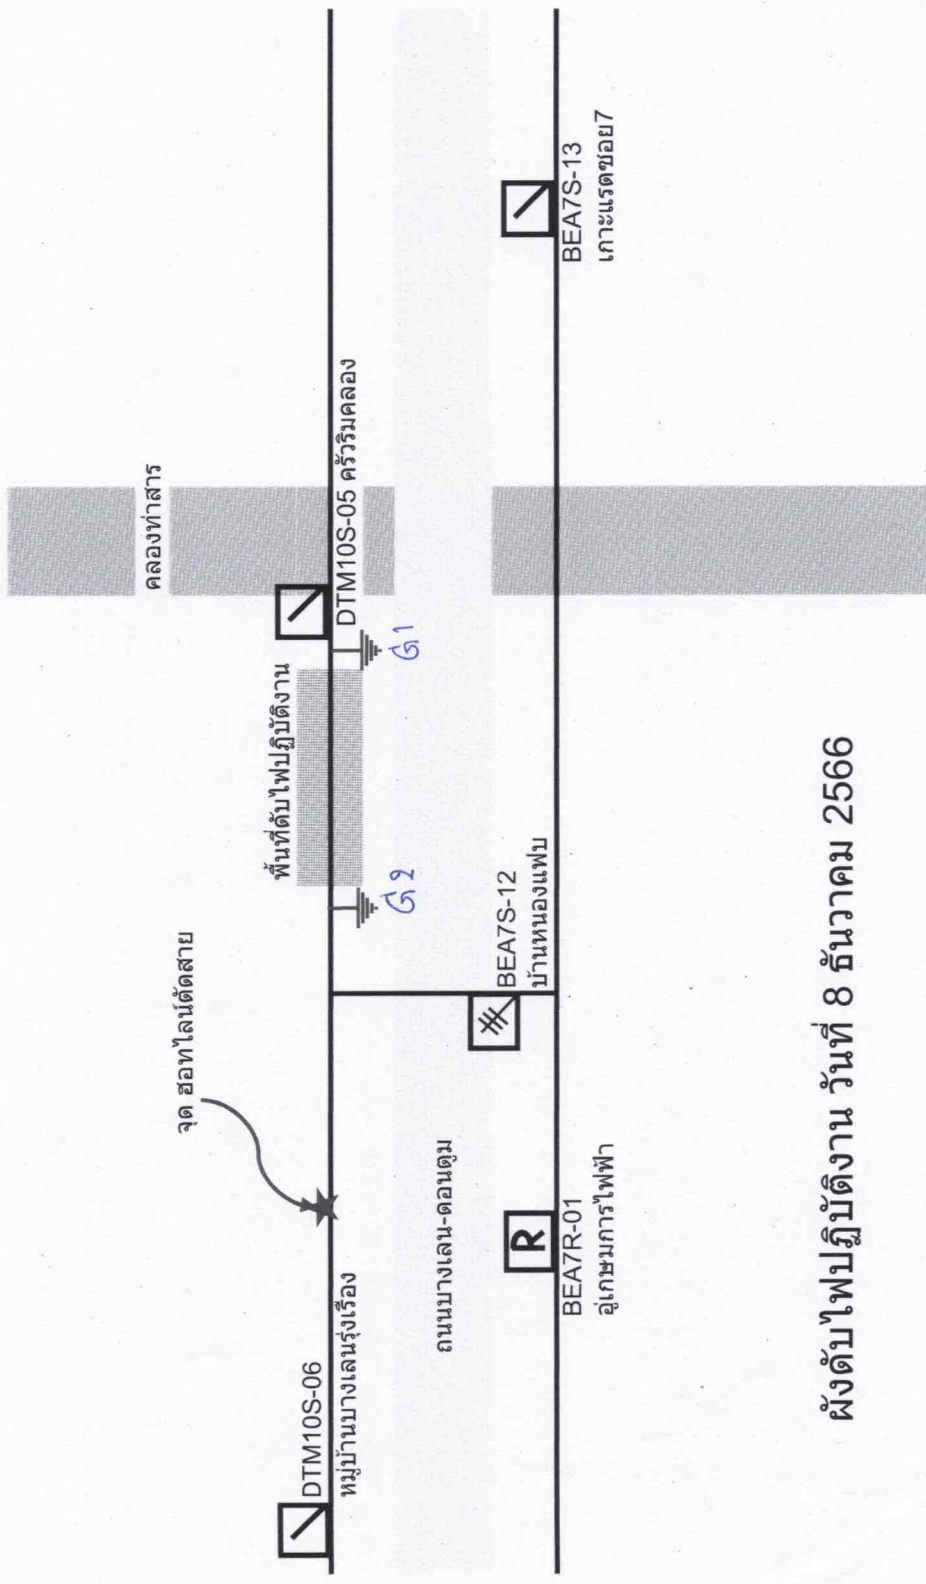

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2566
