

11 พ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อพง.(นท.) ๖๕๖๕ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า...อุทอง...ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน...๓...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTGob	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟ เพื่อดำเนินการ ย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณบ้านรางประทุน	SFB ชั่วคราว จุด A	DIS ชั่วคราว ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง ๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ...บ้านรางประทุน ม.๗ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTGob จาก SFB ชั่วคราว จุด A ถึง DIS ชั่วคราว ฝั่งตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์

ในวันที่ 12 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1792/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธนันท์ กว้างขวาง

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกมล โพธิกุล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. อทง., กฟส. ส.พ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

พัทธนันท์  
(นายพัทธนันท์ โพธิ์พันธ์)  
จุดก.4 แทน ชม.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านรางประทุน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1792/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
		1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
4	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R ตรงข้ามสนง.กฟอ.สองพี่น้อง
6	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO03						
7	SPO03S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
8	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 จุด A บ้านรางประทุน
9	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ผังตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	หลังจาก กฟอ.อทง. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
15	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
16	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
17	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
18	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R ตรงข้ามสนง.กฟอ.สองพี่น้อง
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
20	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
22	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
24	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
25	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
26	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
27	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R ตรงข้ามสนง.กพอ.สองพี่น้อง
28	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อทง.		DIS ผังตรงข้าม อบต.หัวโพธิ์
30	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO03						
31	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.	SF6	จุด A บ้านรางประทุน
32	SPO03S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
33	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
34	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
35	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
36	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R ตรงข้ามสนง.กพอ.สองพี่น้อง
37	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						



# สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

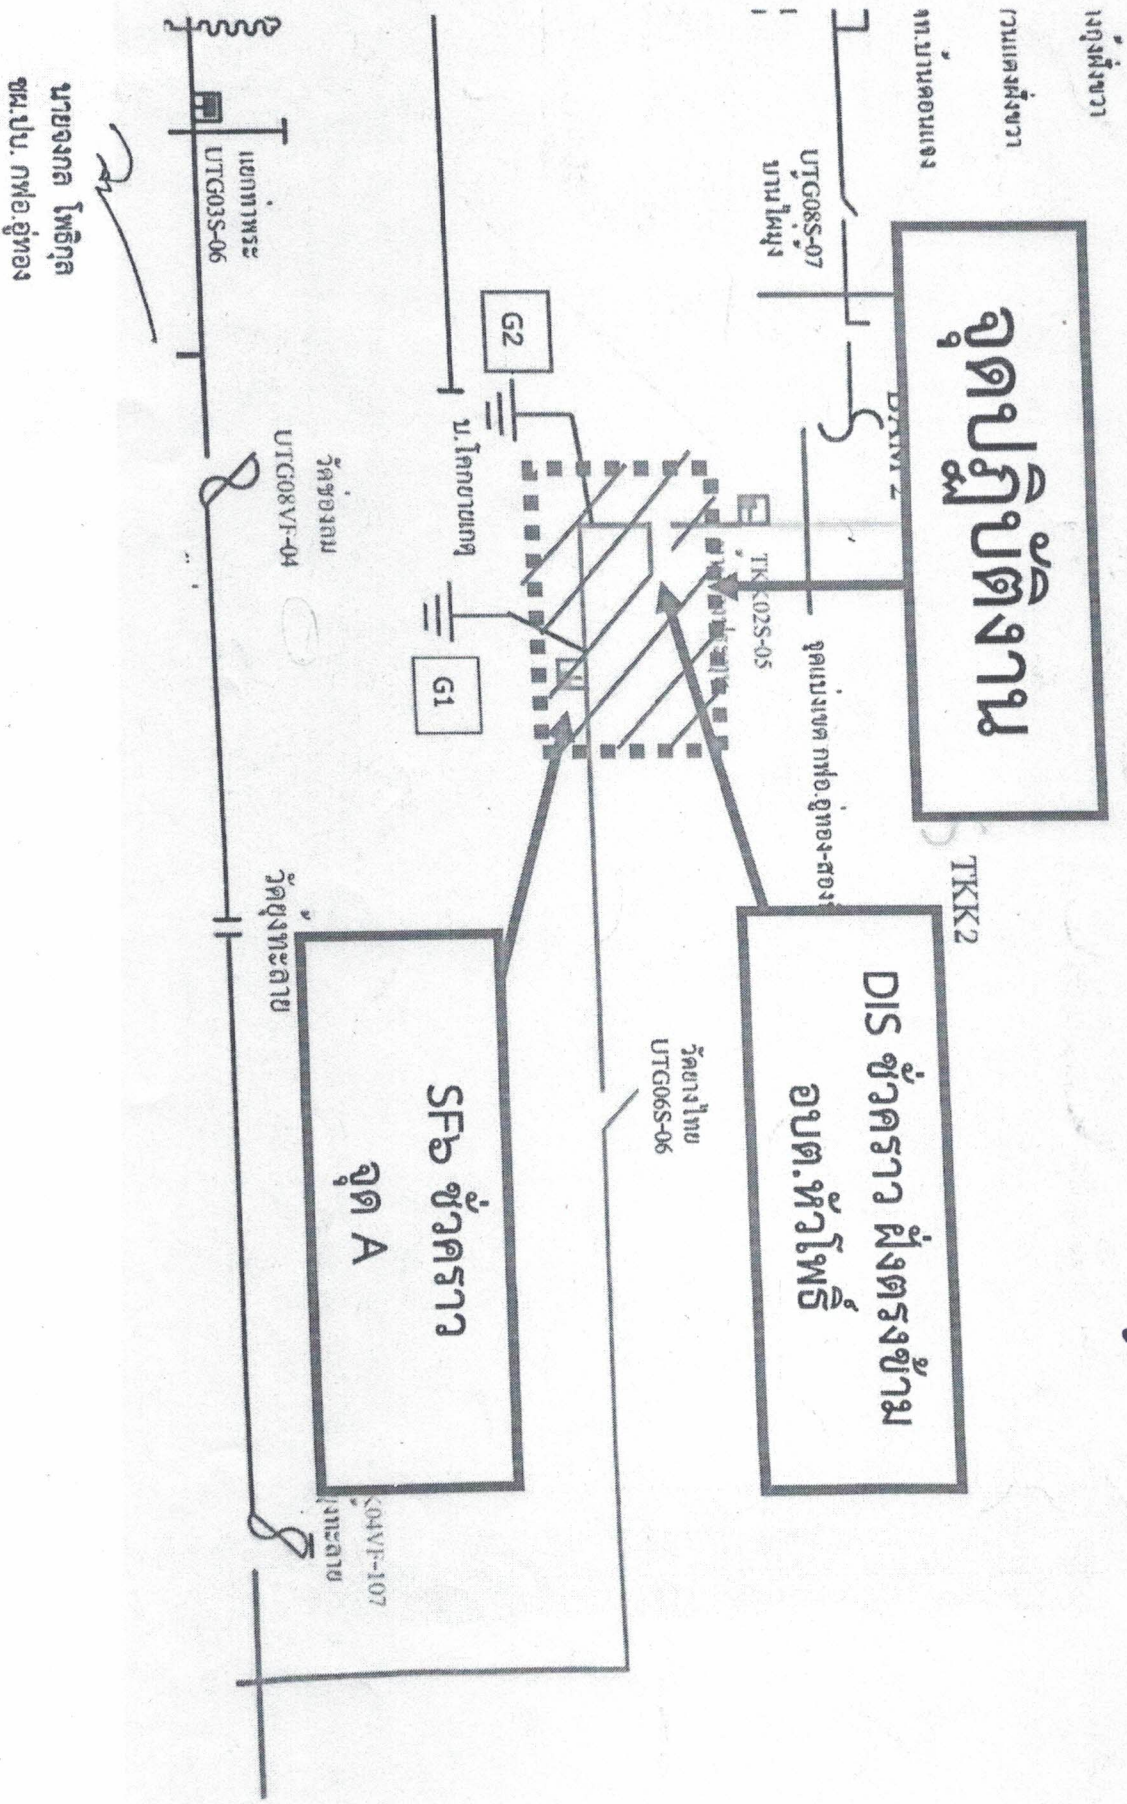



# สถานะจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

