



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ทมจ.(กป)- 1531 /2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายนิธิ พิชิตคุลย์

วันที่ 16 ธ.ค. 2567  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้า บ้านตลาดสำโรง จะดำเนินการ ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง ตามแผนผังแนบ  
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TMV02	20 ธ.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	Dis.ชั่วคราว โรงงานแต่งแร่	Dis.ชั่วคราว ก่อนถึง โรงเรียนห้วย ไร่	นายจิรวัดน์ พิภก่อน โทร 080- 6565375

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) Dis.ชั่วคราว โรงงานแต่งแร่ - Dis.ชั่วคราวก่อนถึง โรงเรียนห้วยไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกมลภพ ศิริ ตำแหน่ง พชง.4 โทร 062-5952264

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ..... Long:.....  
3.2 สิ้นสุด Lat : ..... Long:.....

ลงชื่อ

(นายนิธิ พิชิตคุลย์)  
ผจก.กฟส.ท่าม่วง  
16 ธ.ค. 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMV02 จาก Dis.ชั่วคราว โรงงานแต่งแร่ ถึง Dis.ชั่วคราวก่อนถึง 55.ห้วยไร่  
ในวันที่ 20 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1906/67  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อวค โขภักษ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผจก.กฟส.ท่าม่วง สร  
18 ธ.ค. 67

(นายจิรวัดน์ พิชิตคุลย์)  
อสค.5 โทร 221.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. กฟส. ทบง., กฟส. มสธ.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2 .....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS ชค.โรงงานแต่งแร่ - DIS ชค.ก่อนถึงโรงเรียนห้วยไร่				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมจ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1906/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	19 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวรรณ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	
3	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	
4	ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน ฝาก TMV01						
5	TMV01S-09	ปลด	สับ		สำรวจ		ดึงข้ามถนน ปากทาง บ.พลังเพิ่มพูน
6	DIS ชค. TMV02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สำรวจ		DIS ก่อนถึงโรงเรียนบ้านห้วยไร่
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	DIS ชค. TMV02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สำรวจ		DIS โรงงานแต่งแร่
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	
14	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	
21	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. TMV02	ปลด	สับ		สำรวจ		DIS โรงงานแต่งแร่
24	ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน กลับจาก TMV01						
25	DIS ชค. TMV02	ปลด	สับ		สำรวจ		DIS ก่อนถึงโรงเรียนบ้านห้วยไร่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	TMV01S-09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สำรอง		DIS	ดึงข้ามถนน ปากทาง บ.พลังเพิ่มพูน
27	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	
28	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-	
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>								

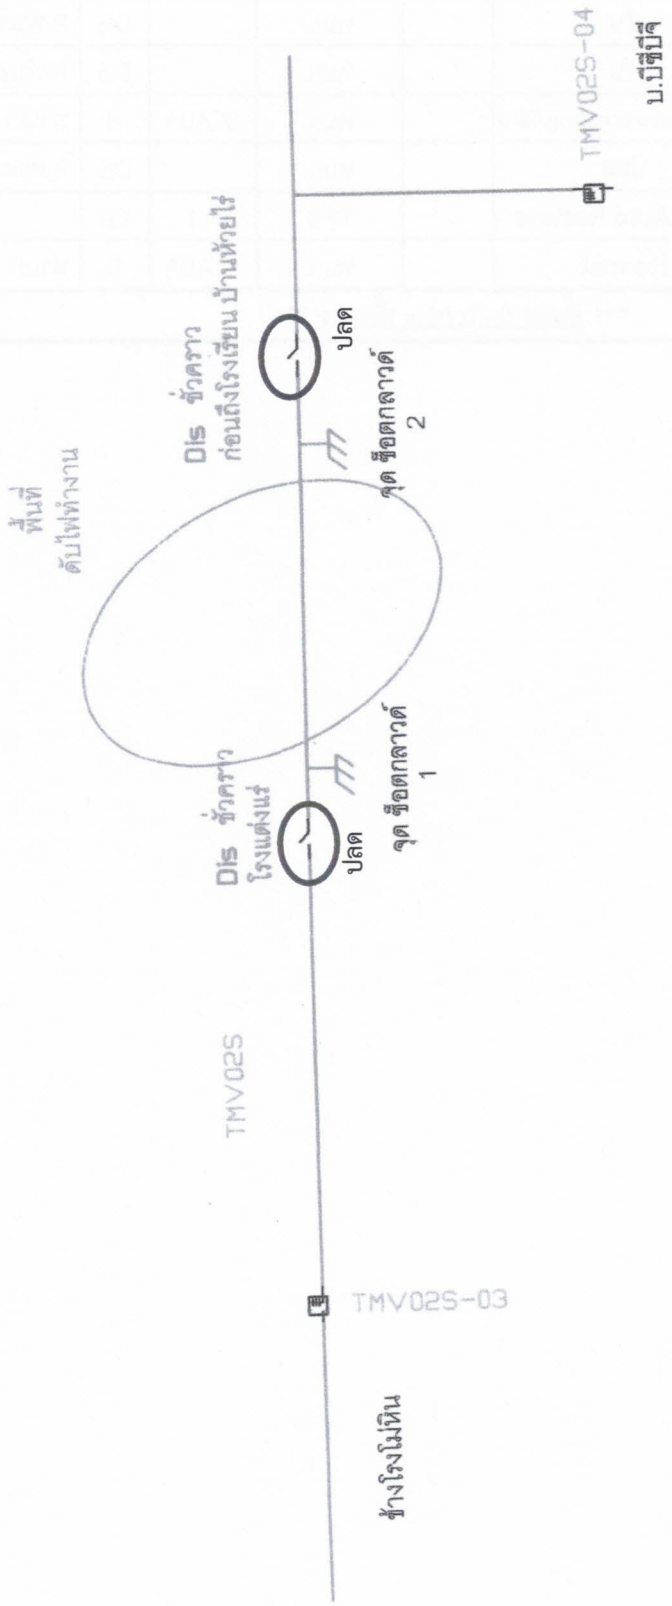

ก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส. ทบวง ผู้จัดทํา: นายบุญเลิศ ศรีธรรมรักษ์ วิศวกร: นายชัชวาลย์ ภัทรภักดิ์ วิศวกร: นายธีรภัทร ธีระภู่ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: นายสุวิทย์ ธีระภู่ ผู้ควบคุมการเดินสาย: นายสุวิทย์ ธีระภู่	<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b> ผู้ว่าการ: _____ ตำแหน่งแสดงตำแหน่งสวิตช์แรงสูง ในระบบสายส่ง 22 เค.วี. สถานีไฟฟ้าท่งวง 2 (ทด.) <b>HT SWITCHING DIAGRAM</b> <b>OF TRANSMISSION LINE 22 kV.</b> <b>THAMUANG 2 SUBSTATION</b>	ฟิล์มแบบ: _____ ชุดเลข: 100000 เซ็นเซอร์: 16.8.0.247 ฟิล์ม: ฟิล์มขาว ฟิล์ม: ฟิล์มขาว หมายเลข: _____ หมายเลข: 041-A4670001 หน้าที่: 1 ของจำนวน 1 แผ่น
---	---	---
