

# Switching Deadline

13 ธ.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
MEDICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สช.(กป.) ๒๒๐ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายพูนพงศ์ กวทอง

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา ๑๑๕ พิดเดอร์ ๒

สถานีไฟฟ้า เดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๒	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสา ๑๑๕ บริเวณ นางบวชถึงบางแอก	Dis มิเตอร์แบ่ง แดน DBA2S-03	Dis ช.ค. ตรง ข้ามวัดบาง แอก	นายวันชัย ทรัพย์มาก ๐๙๘-๑๔๖๔๕๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๖๐ เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทิ้ม ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พูนพงศ์

(นายพูนพงศ์ กวทอง...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DBA02 จาก Dis มิเตอร์แบ่งแดน DBA2S-03 ถึง Dis ช.ค. ตรงข้ามวัดบางแอก

ในวันที่ 16 ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1963/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พูนพงศ์ กวทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เทิ้ม  
9 ธ.ค. ๖๕

พูนพงศ์ กวทอง  
(นายพูนพงศ์ กวทอง...)  
๒๐ ธ.ค. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.สช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณนางบวช-บางแก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปักเสา 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1963/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	9 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- LOAD 3.1 MW.
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- LOAD 3.8 MW.
4	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้ามกฟส.สามชุก
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ตรงข้ามวัดบางแก
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	DBA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS มิเตอร์แบ่งแดน
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
11	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ผู้ควบคุมทราบ						
12	หลังจาก กฟส.สข. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว						
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
14	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
16	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
19	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
20	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
22	DBA02S-03	ปลด	สับ		สข.		DIS มิเตอร์แบ่งแดน
23	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก DBA03						
24	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สข.		DIS ตรงข้ามวัดบางแก
25	DBA02S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้ามกฟส.สามชุก
26	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
27	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ปฏิบัติงานปกติ 115 วันที่ 16 ธันวาคม 2565

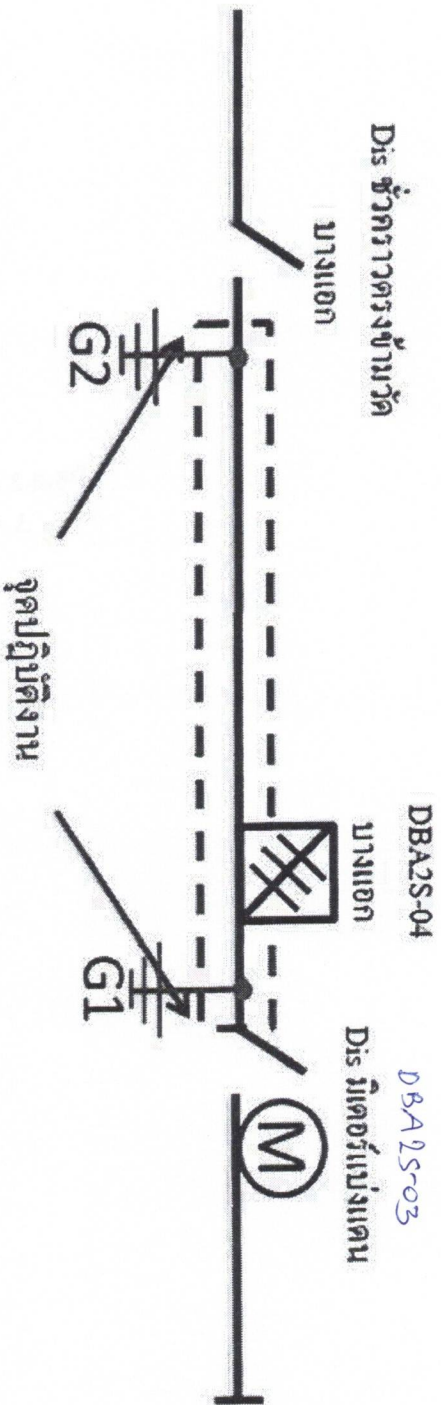

G1 ซ่อมคกราวต์ โดยชุดแก้ไขไฟ นาย ธีรพงษ์ เข็มเพชร ควบคุมงาน  
G2 ซ่อมคกราวต์ โดยชุดซ่อมย่อย นาย กุวานิช ทิมหอม ควบคุมงาน
