



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สท.(กป.) ๒๗/๒ ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นานทุณขงศ์ กวทอง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปีเสา ๑๑๕ พิดเคอร์ ๒

สถานีไฟฟ้า เดิมบวงา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. | DBA๐๒ | ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ดับไฟปีเสา ๑๑๕ บริเวณ วัดบางแอกถึงวัดบ้านทึง | Dis ช.ค. ตรงข้าม วัดบางแอก | Dis ช.ค. ตรง ข้ามวัดบ้านทึง | นายวันชัย ทรัพย์มาก ๐๙๘-๑๕๖-๔๕๕๖ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ เครื่อง ๑๑๑.๑ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๑๑.๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก.ป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นางทุณขงศ์

(นางทุณขงศ์ กวทอง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DBA02 จาก Dis ช.ค. ตรงข้ามวัดบางแอกถึง Dis ช.ค. ตรงข้ามวัดบ้านทึง

ในวันที่ 20 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1996/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวิทย์ ๒60 อธิษฐาน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เอกอติ ไทร จันทรเพ็ญ
13 ธ.ค. 65

(นาย จีรวิทย์ ๒60 อธิษฐาน)
อ.ค.๔ ปฏิบัติงานแทน ผค.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.สข.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบางแวก (DBA02) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 ธ.ค. 65 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สช. | งานที่ทำ | ดับไฟปักเสา 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1996/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | | วันที่ 13 ธันวาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 13 ธันวาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 13 ธันวาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | DBA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | - Load 2.4 MW |
| 3 | DBA03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | - Load 3.6 MW |
| 4 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับจาก DBA03 | | | | | | |
| 5 | DBA02S-06 | ปลด | สับ | | สช. | SCADA | SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก |
| 6 | DIS ชั่วคราว | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS ตรงข้ามวัดบ้านทึง |
| 7 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 8 | DIS ชั่วคราว | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS ตรงข้ามวัดบางแวก |
| 9 | DBA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | - - |
| 10 | DBA03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | - - |
| 11 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 12 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 13 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 14 | เมื่อ กฟส.สช. แจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมแจ้ง We Safe แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 15 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | | |
| 16 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ | | | | | | |
| 17 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 19 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 20 | DBA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | - - |
| 21 | DBA03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | - - |
| 22 | DIS ชั่วคราว | ปลด | สับ | | สช. | | DIS ตรงข้ามวัดบางแวก |
| 23 | ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปกลับจาก DBA03 | | | | | | |
| 24 | DIS ชั่วคราว | ปลด | สับ | | สช. | | DIS ตรงข้ามวัดบ้านทึง |
| 25 | DBA02S-06 | สับ | ปลด | | สช. | SCADA | SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก |
| 26 | DBA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | - - |
| 27 | DBA03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | - - |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |

ปฏิบัติงานปีกลา 115 วันที่ 20 ธันวาคม 2565

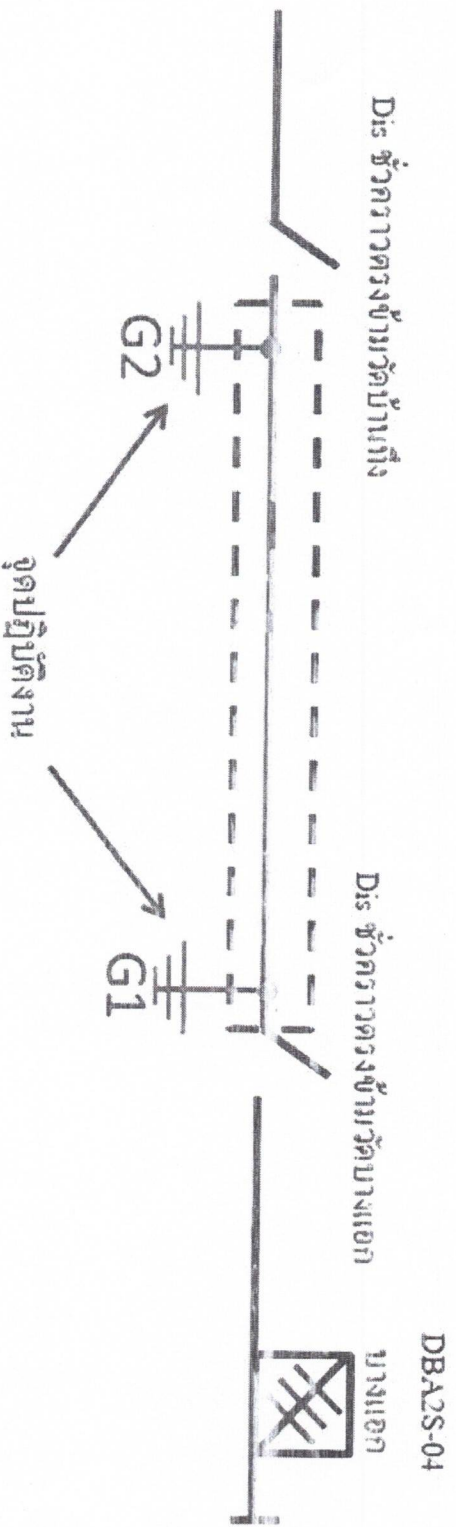

G1 ช้อคกราวด์ โดยชุดแม่ไก่ นาย ธิฐ์พงษ์ เข็มเพชร ควบคุมงาน
G2 ช้อคกราวด์ โดยชุดซ่อมย่อย นาย ภูวนัย ภิรมย์อม ควบคุมงาน
