



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๑.พทท.

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิลาศวรรณ์ชด

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตรี

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG๐๙	๑๑ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี) หน้าวัดสระลงเรือ - บ้านห้วย ลึก	ดิสชั่วคราว หน้าวัดสระลง เรือ	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๑๘๐ ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตรี)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

- ๖ ก.พ. ๒๕๖๗

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๕๗๙ จาก อร ๖๓๖-๖๖๑๖ ถึง อร ๖๓๖-๖๖๑๖
ในวันที่ 11 ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๕.๖๐ น. ถึง 16.๖๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 212/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟก.๓ จังหวัด.....

(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตรี)

๐๓๐.๖ ๖/๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กทบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.ว.(ก3) ผจก. กปร. นทบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

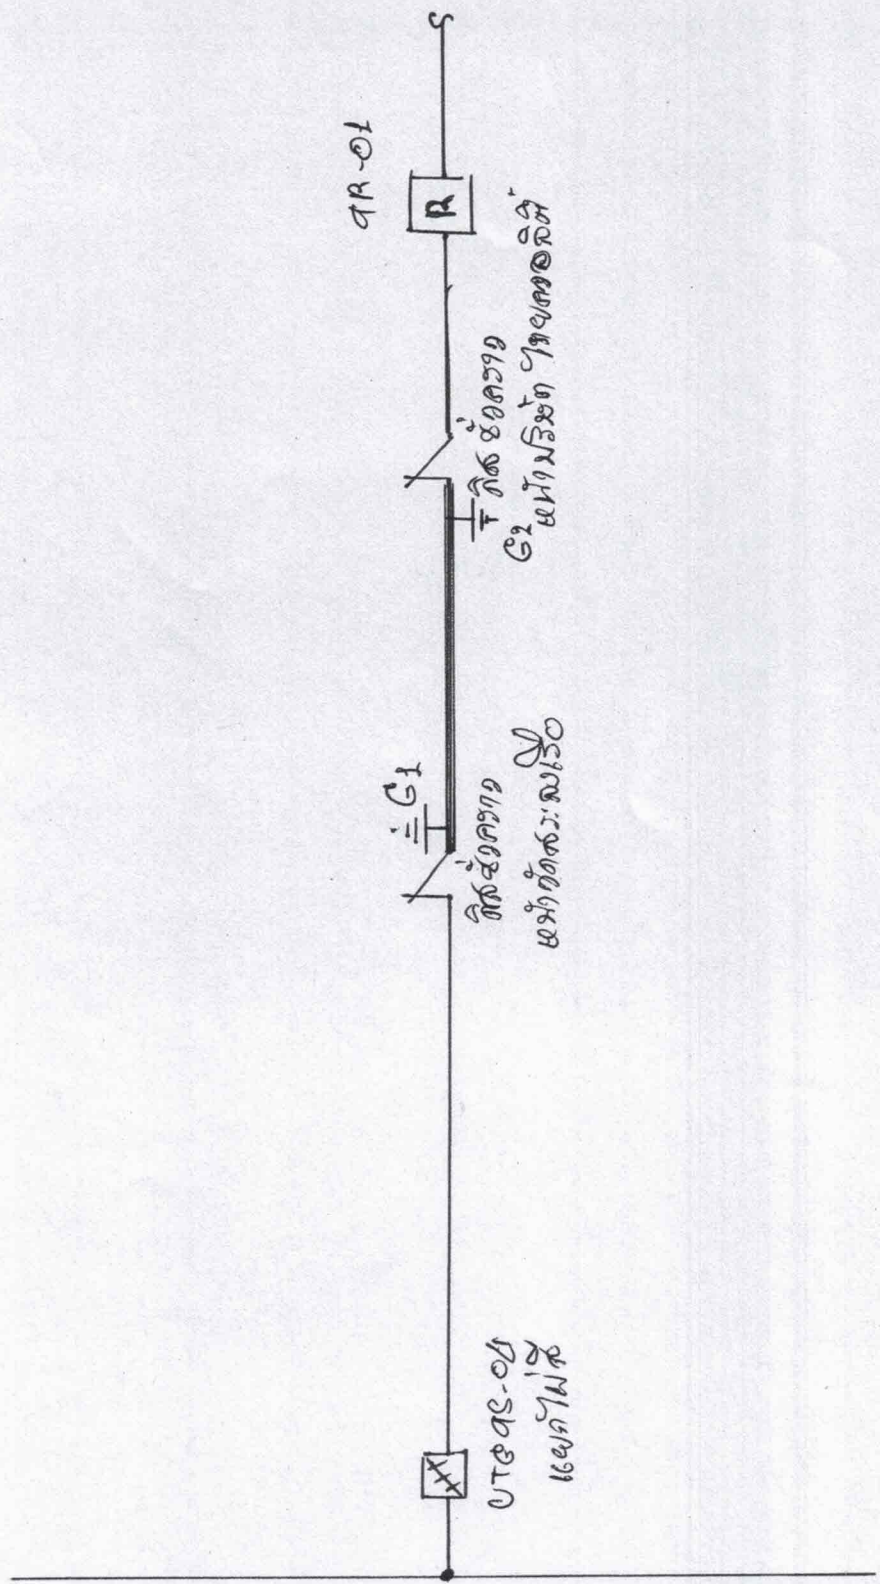
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าวัดสระลงเรือ - บ้านห้วยลึก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	212/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	9 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรววัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R สระลงเรือ
6	ทำการ Bypass Recloser UTG9R-01 บ้านตลุงเหนือ						
7	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ลข.		R บ้านตลุงเหนือ
8	DIS BYPASS UTG9R-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS BYPASS UTG9R-01
9	UTG09R-01	สับ	ปลด		ลข.		R บ้านตลุงเหนือ
10	ย้ายโหลด UTG 9 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG 5						
11	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
12	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS สีแยกบ้านตลุงเหนือ
13	DIS ชั่วคราวไลน์ UTG9	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ชั่วคราว บริษัทไทยควอลิตี้
14	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
16	DIS ชั่วคราวไลน์ UTG9	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ชั่วคราว หน้าวัดสระลงเรือ
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
20	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
22	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
23	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
24	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
25	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R สระลงเรือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนผังระบบ




(นายอนุชา ช่างบุญเรือง)
ช่างแปล. กฟ. ส. อ. พ. ท. น.



บริษัท ศรีชลธร จำกัด
 15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล

กฟส.พนมทวน
 เลขทะเบียนรับ 590/6^c
 วันที่ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๗

SCT-CM-24-132

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด
 และบริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี

เรื่อง แจ้งแผนขอตัดไฟ เพื่อทำการปักเสา

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพนมทวน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) SD&SP-SCT - 5/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนงานการขอตัดไฟ จำนวน 1 แผ่น
 2. แบบ Lay Out จุดปักเสา จำนวน 1 แผ่น

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด และบริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี นั้น

เนื่องจาก ตามแบบก่อสร้าง จะต้องตัดไฟเพื่อทำการปักเสา (ตามเอกสารแนบ) โดยทำการปักเสา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ทางการไฟฟ้า ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันตัดไฟ และสามารถเข้าดำเนินการปักเสา ได้ เพื่อให้งานก่อสร้าง ดำเนินการได้ต่อเนื่อง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ผบง. ผ.บค. ผ.กบ. กรรมการ
-
-
-
- รายงานผล.....

ขอแสดงความนับถือ

(คุณกุลเดชา อนุกุลภิรมย์)
 ผู้จัดการโครงการ

(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)
 ผจก.กฟส.อ.พนมทวน
 - ๖ ก.พ. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา
 ทนภาพิช์ แสงจันทร์
 084-329-6424

088-0231841 ๕.ก.พ.
