

Switching Deadline

07/01/68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.3.ดบ.(ปน) 1287./2567.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี.....

วันที่ ..27..ธ.ค..2567.....
ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก3).....
ตำแหน่ง ..รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.دن.....

ด้วย..กฟอ.เดิมนางนางนวล.ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอโซด เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	10 ม.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ต้น (SD-UG-3) หน้า สฟพ.กฟผ.	DBN 7062 หน้า สฟพ.กฟผ.	CSW 115 kv DBA1YB-02 และ DBA1YS-04	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วิศวกร.9 (ก3) 086-2691259

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..นายวริทธิ์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ขผ.ปน.....โทร..080-847-6904.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.804225... Long: ...100.124681.....

3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.804062... Long:... 100.124883.....

ลงชื่อ.....

(นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง.รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.دن.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115 kV จาก DBN 7062 ถึง DBA01YB-02 DBA01YS-04

ในวันที่ 10 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 23/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงษ์ ๗7 ศึกษ

.....
(นางสาวสุภัทษา งามบุญผล)

วสค. 5 11กน ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล.ส. ๓๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... D.กค.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... ๑๕:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง 22 ม.	ตามใบขอปฏิบัติงาน 23/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก			วันที่	30 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัสชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN 7062	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
3	1BSP0101YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BSP		บ.บรีสแอนดีไซน์พาวเวอร์ จก.
4	OFF ATS @ DAA						
5	ย้ายโหลด บริษัท บรีสแอนดีไซน์ พาวเวอร์ จำกัด ไปรับไปจากสถานีฯ อ่างทอง 2						
6	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA	CB	115 kV
7	1BSP0101YB-01	สับ	ปลด		BSP	CB	115 kV
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
9	แจ้ง กฟน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กฟน.3						
10	เมื่อ กฟน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กฟน.3 แล้วเสร็จ						
11	ตรวจสอบ CSW 115 เควี เดิมบางนางบวช รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
12	DBN 7062	สับ	ปลด		EGAT	CB	115 kV
13	DBN 7067	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 115 kV
14	DBA01YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		BNP	ABS	Bypass แยกเดิมบางนางบวช
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.เดิมบางนางบวช รับทราบ						
16	แจ้งให้ชุด กฟส.เดิมบางนางบวช ทำการ Test ไฟ และ Short Ground						
17	เมื่อชุด กฟส.เดิมบางนางบวช ทำการ Test ไฟ และ Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงาน						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
19	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
20	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	ปลด Short Ground แล้วเสร็จ						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
23	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	DBA01YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		BNP	ABS	Bypass แยกเดิมบางนางบวช
26	DBN 7067	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 115 kV
27	DBN 7062	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT	CB	115 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้ง กพน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กพน.3 กลับสภาพปกติ						
29	เมื่อ กพน.3 ดำเนินการย้ายโหลดในพื้นที่ กพน.3 กลับสภาพปกติ แล้วเสร็จ						
30	ย้ายโหลด บริษัท บริษแอนด์ไซน์ พาวเวอร์ จำกัด กลับจากสถานีฯ อ่างทอง 2						
31	1BSP0101YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BSP		CB 115 kV
32	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		CB 115 kV
33	ON ATS @ DAA						
34	DBN 7062	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
35	1BSP0101YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BSP		บ.บริษแอนด์ไซน์พาวเวอร์ จก.
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังที่ 1

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ ศรีสวัสดิ์ จำกัด บึงเสนา 22 เมตร 2 ต้น (SD-UG-3) หน้า สฟฟ.ตบ.(กฟผ.)
สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ DBN 7062 กฟผ.ตบ. ถึง DBA1YS-04 ถึง CSW 115KV รหัส DBA1YB-02

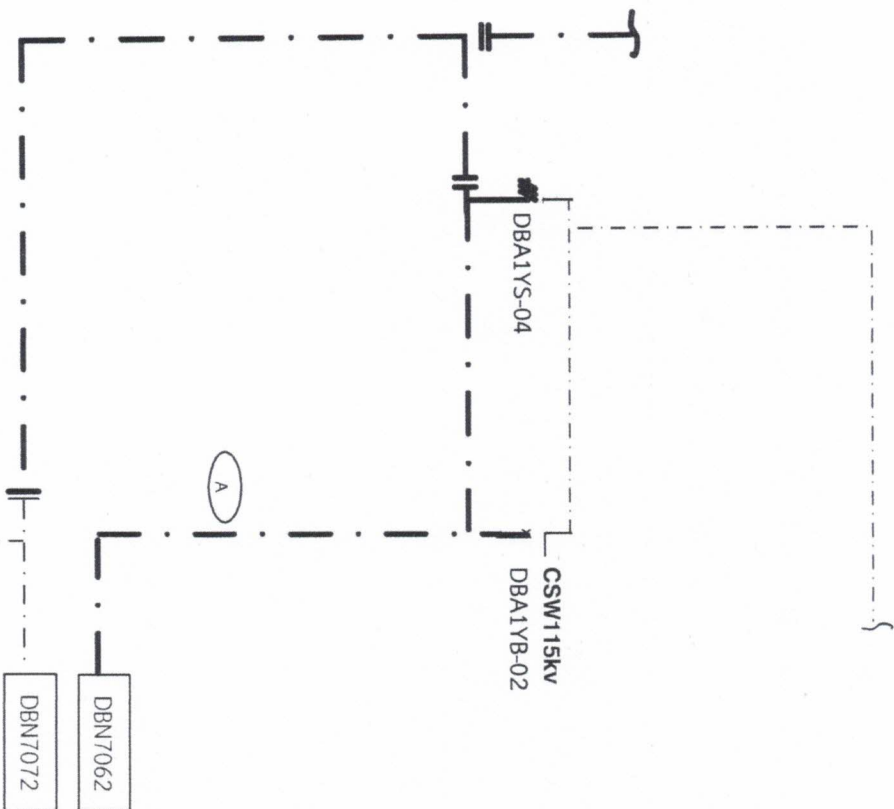

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

(Handwritten signature)

1. วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. บริษัท ศรีสวัสดิ์ จำกัด ปฏิบัติงานบึงเสนา 22 เมตร

(SD-UG-3) หน้า สฟฟ.กฟผ.เดิมบางนางบวช

หมายเหต — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

จุด A บริเวณที่ปฏิบัติงาน บึงเสนา หน้า สฟฟ.กฟผ. ตบ.
