



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 มี.ค. 68

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.) /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟแรงสูง ๒๒ KV. และ ๑๑๕ KV. เพื่อย้ายสายแรงสูง ๒๒KV. ให้ทางหลวงตอกเสาเข็ม บริเวณ สะพานคลองบางหลวง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SPN4	14 มี.ค.68	09.00 น.	14.00 น.	ย้ายสายแรงสูง ๒๒ KV.	DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดบางน้อย	SPN4S-05 SPN4S-07	นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ผ.พ.ปบ.กฟส.บางเลน
2.	SPN9					ใน SPN9S-05	จุดตัดสาย	
3.	115 KV.					BEA	BEA4YS-04 BEA4YS-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไตรถलय

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.พ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายเอกชัย หึงสุวรรณ )

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจาก แขงทางหลวงนครปฐมร้องขอ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ A9 จาก SPN9S-05 ถึง DDE

ในวันที่ 14 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 9-00 น. ถึง 14-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 464/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ 115 จาก BEA ถึง SCL

ในวันที่ 14 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 9-00 น. ถึง 14-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 464/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก สิงหนธร ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 2 .....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....) BEA

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไทรลลวย (115 kV, วงจร SPN04,SPN09)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 มี.ค. 68 เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.บล. งานที่ท่า ย้ายเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 464/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดีbin วันที่ 12 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 12 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 12 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นางสาวสุกัษชา,นางสาวพิชชา,นายศักดิ์สิทธิ์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายจิรวัดณ์,นายวิวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟระบบ 115 เควี จ่ายไฟแบบ Close Loop						
3	ตรวจสอบ BEA04YS-04 LBS หน้าซีใจ สถานะ OPEN + ล็อคกุญแจ						
4	ตรวจสอบ BEA04S-07 SF6 อนามัยหินมูล สถานะ OPEN + ล็อคคาน						
5	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
6	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
7	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
8	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
9	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
10	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
11	2SCL0101YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ย้ายโหลด SPN04 บางส่วน ไปจ่ายจาก BEA04 และย้ายโหลด SPN09 บางส่วน ไปรับไฟจาก BEA03						
14	BEA03S-11	ปลด,ล็อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6 อนามัยหินมูล
15	BEA04S-05	ปลด,ล็อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6 บริษัทกรุงเทพกิจการ
16	SPN09S-05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS สะพานคลองบางหลวง
17	SPN04S-05	ล๊ับ	ปลด,ล็อคคาน		บลง.		SF6 ปากทาง ม.4 บางหลวง
18	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 เควี						
19	DIS ชค. SPN04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดบางน้อยใน
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE บริเวณคลองบางหลวง ได้ (จุด DDE ไม่มีโหลด)						
21	เมื่อผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE บริเวณคลองบางหลวง แล้วเสร็จ						
22	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 115 เควี						
23	2SCL0101YB-01	ล๊ับ	ปลด		SCL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BEA04YB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BEA04YS-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
26	BEA04YS-02	ล๊ับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
27	BEA04YS-06	ล๊ับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS. หลัง รร.วัดบางหลวง
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
35	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
36	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
37	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
38	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
39	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
40	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
41	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
42	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
43	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
44	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
45	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
46	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
47	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
48	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
51	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G4						
52	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
53	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี						
54	BEA04YS-01	ปลด	ล๊ับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
55	BEA04YS-02	ปลด	ล๊ับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
56	BEA04YS-06	ปลด	ล๊ับ ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS. หลัง รร.วัดบางหลวง
57	2SCL0101YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SCL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
58	BEA04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22 เควี						
60	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการจัม DDE บริเวณคลองบางหลวง ได้						
61	เมื่อผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการจัม DDE บริเวณคลองบางหลวงแล้วเสร็จ						
62	DIS ชด. SPN04	ปลด	ล๊ับ		บลง.		DIS ตรงข้ามวัดบางน้อยโน
63	ย้ายโหลด SPN04 บางส่วน กลับจาก BEA04 และย้ายโหลด SPN09 บางส่วน กลับจาก BEA03						
64	SPN04S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บลง.		SF6 ปากทาง ม.4 บางหลวง
65	SPN09S-05	ปลด	ล๊ับ		บลง.		DIS สะพานคลองบางหลวง
66	BEA03S-11	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 อนามัยหินมูล
67	BEA04S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 บริษัทกรุงเทพกิจการ
68	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
69	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
70	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
71	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
72	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
73	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
74	2SCL0101YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
75	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



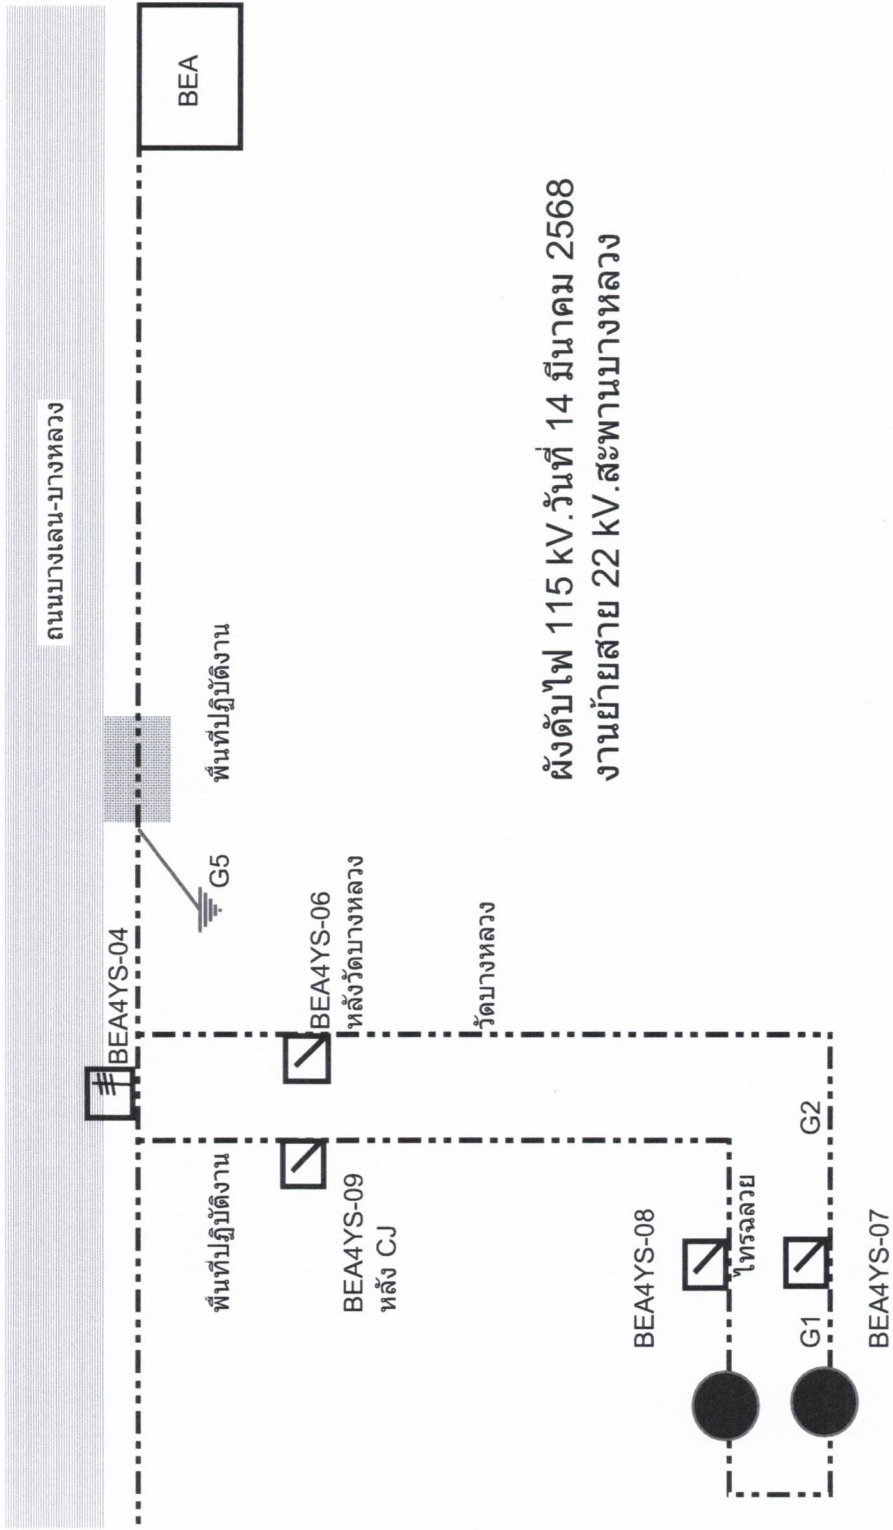

ฝั่งดับไฟ 115 kV.วันที่ 14 มีนาคม 2568  
 งานย้ายสาย 22 kV.สะพานบางหลวง
