



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พพ.น. ๑๓๕/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๘ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี) หน้าวัดสระลงเรือ - หนอง เจริญสุข	ดิสชั่วคราว หน้าวัดสระลง เรือ	ดิสชั่วคราว บ้านหนองเจริญสุข	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.จก.ป. โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๘

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก ดิสชั่วคราวหน้าวัดสระลงเรือ ถึง ดิสชั่วคราวบ้านหนองเจริญสุข
ในวันที่ 28 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 332/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุณทอง ฝาจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อนุชา ชำนาญเรือ

รับทราบ
(ทนายสุภาภรณ์ วัฒนสุข)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) กฟส. พพ.น.
เรียน ผ.จก. กฟส. พพ.น. กฟส. ลพ.
อก.ว.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

จก.๔ แทน ท.ม.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

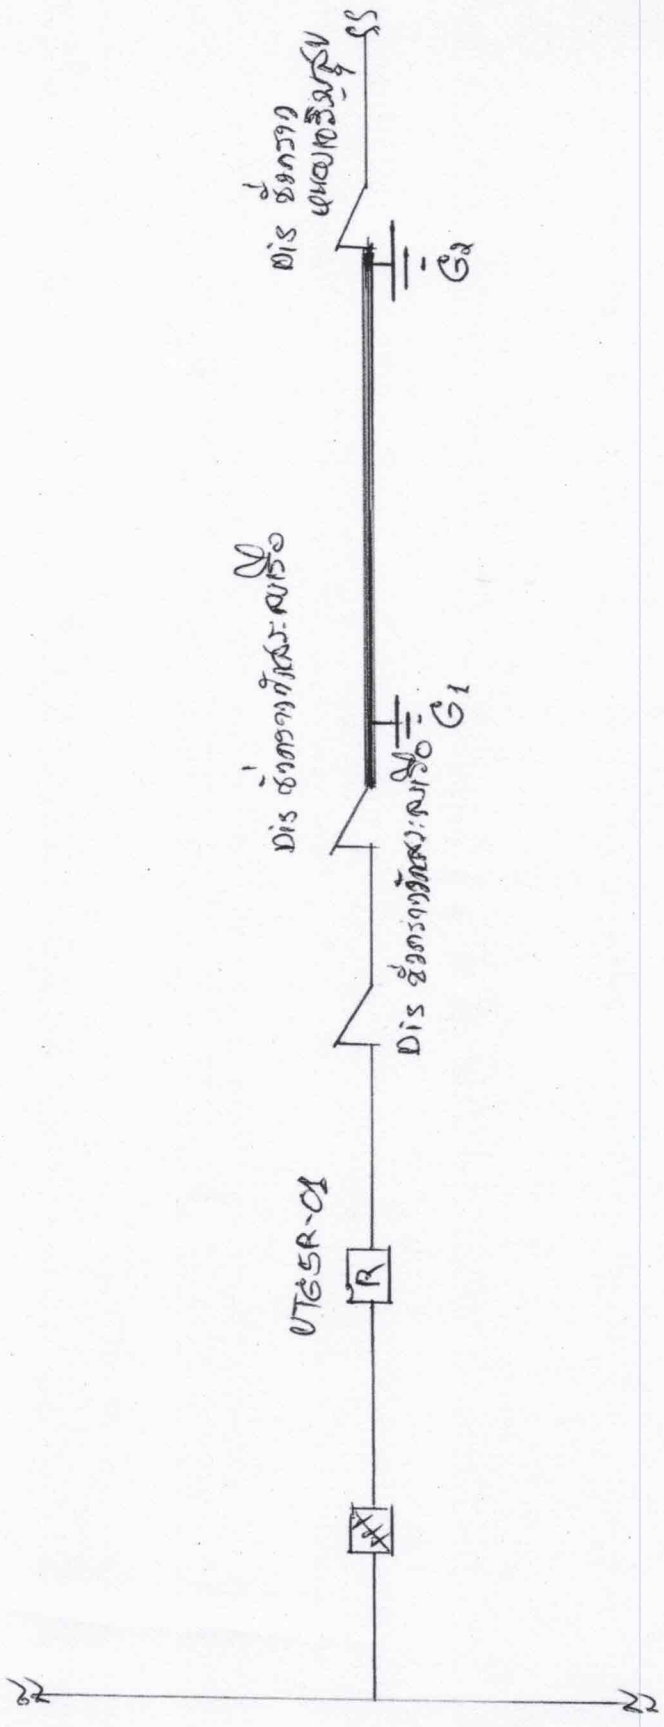
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดสระลงเรือ-บ้านหนองเจริญสุข		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.พ. 67	เวลา 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปึกเสา 22 ม. (115 kV) ตามใบขอปฏิบัติงาน 332/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัลวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R. สระลงเรือ
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
9	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
10	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดสระลงเรือ
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS บ้านหนองเจริญสุข
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R. สระลงเรือ
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G2						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
26	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R. สระลงเร็ว
29	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดสระลงเร็ว
32	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
33	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS บ้านหนองเจริญสุข
34	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
35	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
36	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
39	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R. สระลงเร็ว
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ပေးအပ်ထားသော ပုံပါ



၃
