



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปป) ๕33 /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 27 ก.พ. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางมาช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าขนาด ๒๒ ม.(เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี)ตามแผนผัง

สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA 05	8 มี.ค. 67	08.30 น.	13.00 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านหนองหิน	DAA5R-01 หนองหิน	ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่ ก่อนดิสวัดหนองหิน	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา 080-8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ช.พ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ DAA05 จาก DAA5R-01 ถึง ดิสชั่วคราว ต้นโพธิ์ใหญ่!

ในวันที่ 8 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 334/2567

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิษี ศรีพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ Le. อธิปไตย ศรีศักดิ์ดา

28 ก.พ. 67

(นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ)

รจก.5 แทน ผจก.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองหิน-หนองกระทุ่ม (DAA05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	13.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	เพื่อปักเสาแรงสูงขนาด 22 เมตร		ตามใบขอปฏิบัติงาน	334/67
			ก่อสร้างสายส่ง 115KV			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร				วันที่	29 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	29 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA05R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R หนองหิน
3	HKA07R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		น.3		R วัดวังคอไห
4	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนไปรับไฟจาก HKA07 (ดับไฟย้ายโหลดเนื่องจาก โล้น HKA07 มี D/O ป้องกันโล้น)						
5	Dis ชค. DAA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ต้นโพธิ์ใหญ่
6	DAA05S-07	ปลด	สับ		ดบ.		DIS หนองหิน - เนินขาม
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R หนองหิน
9	DAA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS Sw.Load R หนองหิน
10	D/O	สับ	ปลด		ดบ.		D/O เทศบาลหนองกระทุ่ม
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ดบ. ทราบ						
12	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการ Short Ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการ Short Ground จุด G2						
14	แจ้ง กฟอ.ดบ. Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
15	เมื่อ กฟอ.ดบ. Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปฏิบัติงานได้						
17	HKA07R-04	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		น.3		R วัดวังคอไห
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อ กฟอ.ดบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปลด Short Ground จุด G2						
21	HKA07R-04	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		น.3		R วัดวังคอไห
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DAA05R-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS Sw.Load R หนองหิน
24	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R หนองหิน
25	D/O	ปลด	สับ		ดบ.		D/O เทศบาลหนองกระทุ่ม
26	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนกลับจาก HKA07 (ดับไฟย้ายโหลดเนื่องจาก โล้น HKA07 มี D/O ป้องกันโล้น)						
27	DAA05S-07	สับ	ปลด		ดบ.		DIS หนองหิน - เนินขาม
28	Dis ชค. DAA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ต้นโพธิ์ใหญ่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DAA05R-01	Nonreclosing	Normal		ดบ.	SCADA	R	หนองหิน
30	HKA07R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		น.3		R	วัดวังค้อไ้
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 เมตร รอรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี

วงจร DAA 05 บริเวณ DAA5R-01 หมอขี้ตีน ถึง ตีลั่วควรวาวต้นไม้ใหญ่ก่อนวัดหมอนขี้ตีน

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น.

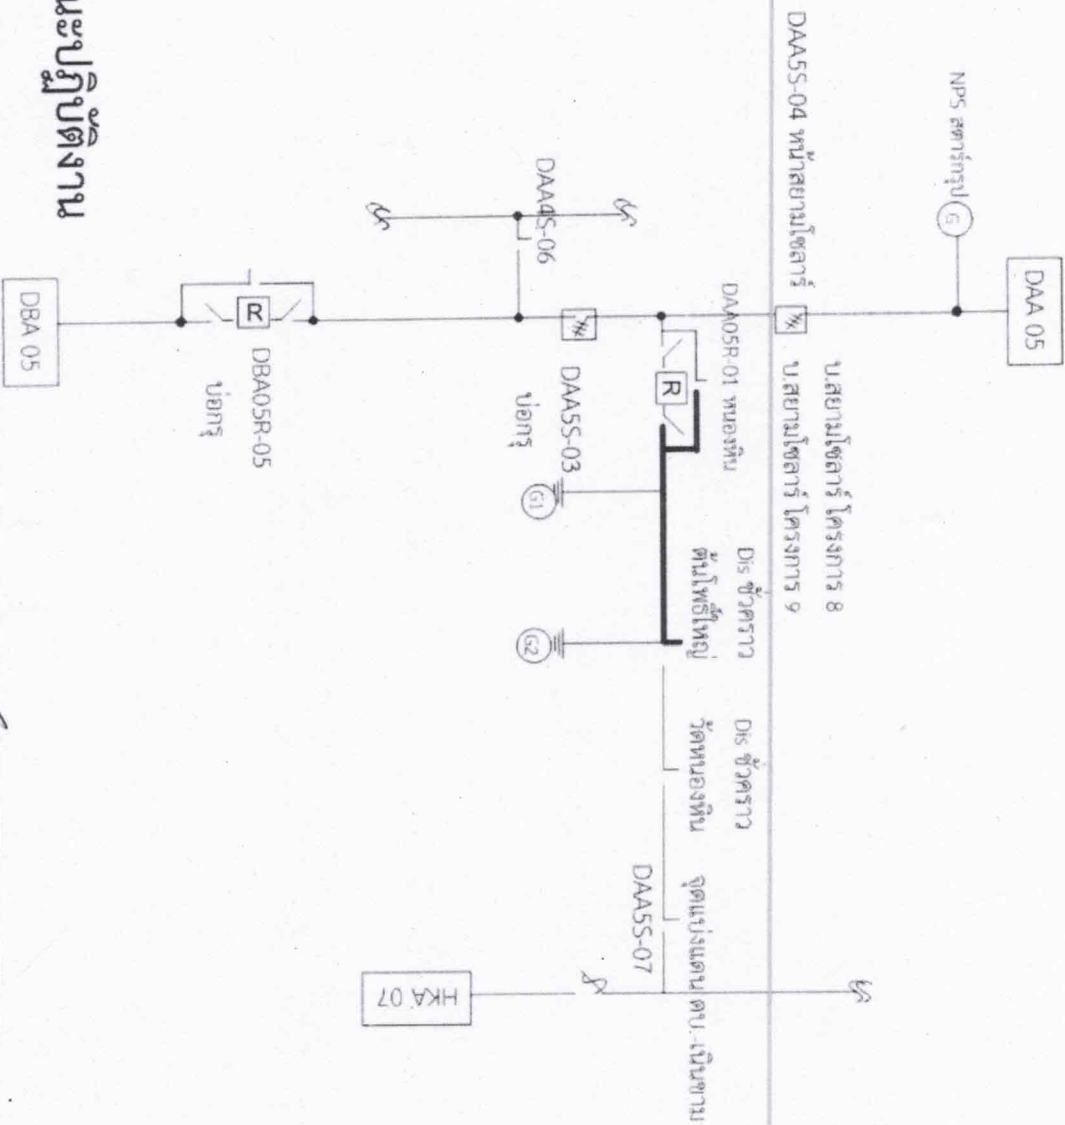

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น.

ตัดไฟ ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 เมตร

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

Signature
29 Dec 67
