



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปว) ๑๓๓๓ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันบุตร

## วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

๒๐ มี.ค. ๖๗

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ kV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMG๐๔	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ สะพานลอยคนข้ามชุมชน เคหะมหาชัย	SMG๔S-๐๔ ปาก ช.ทรัพย์ มหาโชค	SMG๓S-๐๘	นายสมพาศน์ อางน้อย โทร.๐๖๓-๘๖๔๘๓๓๓
๒	SMG๐๔	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๔S-๐๔ ปาก ช.ทรัพย์ มหาโชค	SMG๔S-๐๖ เลยสะพานลอย เคหะมหาชัย (ขาเข้า กทม)	
๓	EKA๐๗	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเข้า บ. สะพานลอย เคหะมหาชัย (ขาเข้า กทม)	EKA๗S-๑๕ ปาก ช.ทรัพย์ มหาโชค	
๔	EKA๐๗	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเข้า บ. สะพานลอย เคหะมหาชัย (ขาเข้า กทม)	EKA๗S-๑๖ เลยแยกหมู่ ๔ ต.นาดี	
๕	๑๑๕ kV SMC๓Y	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานี สค.๓	BAL๓YS-๑๔ คิงฟิชเซอร์	
๖	๑๑๕ kV SMC๓Y	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานี สค.๓	สถานี สค.๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บริเวณ ปากช.หมู่๔ นาดี ถึง รั้วหน้าวงแหวนมหาชัย.....น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ

(นายยศพัทธ์ นันบุตร)

ตำแหน่ง รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.



## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ปากซอย หมู่4นาดี ถึงร้านข้าวแกงมหาชัย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 414/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัชร์ เสมามิ่ง			วันที่	19 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>พิชชา</i>			วันที่	19 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเนติพนธ์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. จิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัชร์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ LBS BAL03YS-14 คิงพีชเซอร์ อยู่สถานะ OPEN+LOCK ญญแจ						
3	ตรวจสอบ SF6 EKA07S-15 ปากซอยทรัพย์มหาโชค อยู่สถานะ OPEN+LOCK คาน						
4	ตรวจสอบ SF6 EKA07S-16 เลยปากซอย หมู่ 4 นาดี อยู่สถานะ OPEN+LOCK คาน						
5	ตรวจสอบ SF6 SMG03S-08 คอสะพานหมู่4 นาดี อยู่สถานะ OPEN+LOCK คาน						
6	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		Load = 4.31 MW
7	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		Load = 7.31 MW
8	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
9	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
10	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
11	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load = 0.61 MW
12	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load = 0.59 MW
13	ย้ายโหลด SMG04 บางส่วนไปรับไฟจาก SMG09						
14	SMG04S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 ปากซอยหมู่บ้านกานดา กม.23
15	SMG04S-04	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยทรัพย์มหาโชค
16	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
17	ตรวจสอบผู้ใช้ไฟ 115kV บ.ลี้กิจเจริญแสง และ บ.ไทยรวมสิน ปลดโหลดออกทั้งหมดพร้อมให้ดับไฟ						
18	ตรวจสอบสถานะ SMC01YB-01 และ SMC03YB-01 อยู่สถานะ CLOSE LOOP						
19	SMG04S-06	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 เลยสะพานลอยเคหะมหาชัยขาเข้า
20	SMC03YB-01	ล๊ับ	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 kV
21	SMG01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG		เบรกเกอร์ 115 kV
22	SMC03YS-01	ล๊ับ	ปลด		SMC		ใบมิด 115 kV
23	SMC03YS-03	ล๊ับ	ปลด		SMC		ใบมิด 115 kV
24	SMG01YS-01	ล๊ับ	ปลด		SMG		ใบมิด 115 kV
25	SMG01YS-03	ล๊ับ	ปลด		SMG		ใบมิด 115 kV
26	SMC03YS-05	ล๊ับ	ปลด		สค.		ABS หน้าบริษัทลี้กิจเจริญแสง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SMC03YS-06	สับ	ปลด		สค.		ABS หน้าบริษัทไทยรวมสิน
28	แจ้งชุดควบคุมงาน โหลดตัดตั้งแต่ จุดตัดDDE สะพานลอยเคหะ มหาชัย1 ขาเข้า ถึง EKA07S-16 เลยแยก ม.4 ต.นาดี ออก						
29	เมื่อชุดควบคุมงาน โหลดตัดตั้งแต่ จุดตัดDDE สะพานลอยเคหะ มหาชัย1 ขาเข้า ถึง EKA07S-16 เลยแยก ม.4 ต.นาดี ออกแล้วเสร็จ						
30	แจ้ง HOTLINE ตัดDDE บริเวณสะพานลอยเคหะ มหาชัย1 ขาเข้า ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (โซน EKA7)						
31	เมื่อ HOTLINE ตัดDDE บริเวณสะพานลอยเคหะ มหาชัย1 ขาเข้า ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
32	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
33	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G1						
34	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G2						
35	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G3						
36	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G4						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
39	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
40	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
41	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
42	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
43	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1</u>							
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
45	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G1						
46	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G2						
47	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G3						
48	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G4						
49	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
50	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
51	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
52	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
53	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
54	จ่ายไฟ 115 KV CLOSELOOP ตามสภาพปกติ						
55	SMC03YS-01	ปลด	สับ		SMC		ใบมีด 115 kV
56	SMC03YS-03	ปลด	สับ		SMC		ใบมีด 115 kV
57	SMG01YS-01	ปลด	สับ		SMG		ใบมีด 115 kV
58	SMG01YS-03	ปลด	สับ		SMG		ใบมีด 115 kV
59	SMC03YB-01	ปลด	สับ		SMC		เบรกเกอร์ 115 kV
60	SMG01YB-01	ปลด	สับ		SMG		เบรกเกอร์ 115 kV
61	SMC03YS-05	ปลด	สับ		สค.	ABS	หน้าบริษัทลิทีกิจเจริญแสง
62	SMC03YS-06	ปลด	สับ		สค.	ABS	หน้าบริษัทไทยรวมสิน


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	จ่ายไฟ 22 kV						
64	แจ้ง HOTLINE เชื่อมDDE บริเวณสะพานลอยเคหะ มหาชัย1 ขาเข้า เข้าทั้ง 3 เฟส						
65	เมื่อ HOTLINE เชื่อมDDE บริเวณสะพานลอยเคหะ มหาชัย1 ขาเข้า เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
66	SMG04S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สค.		SF6 เลยสะพานลอยเคหะมหาชัยขาเข้า
67	ย้ายโหลด SMG04 บางส่วนกลับจาก SMG09						
68	SMG04S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สค.		SF6 ปากซอยทรัพย์มหาโชค
69	SMG04S-05	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยหมู่บ้านกานดา กม.23
70	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
71	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
72	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
73	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
74	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
75	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
76	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

โครงการพัฒนาระบบขนส่ง

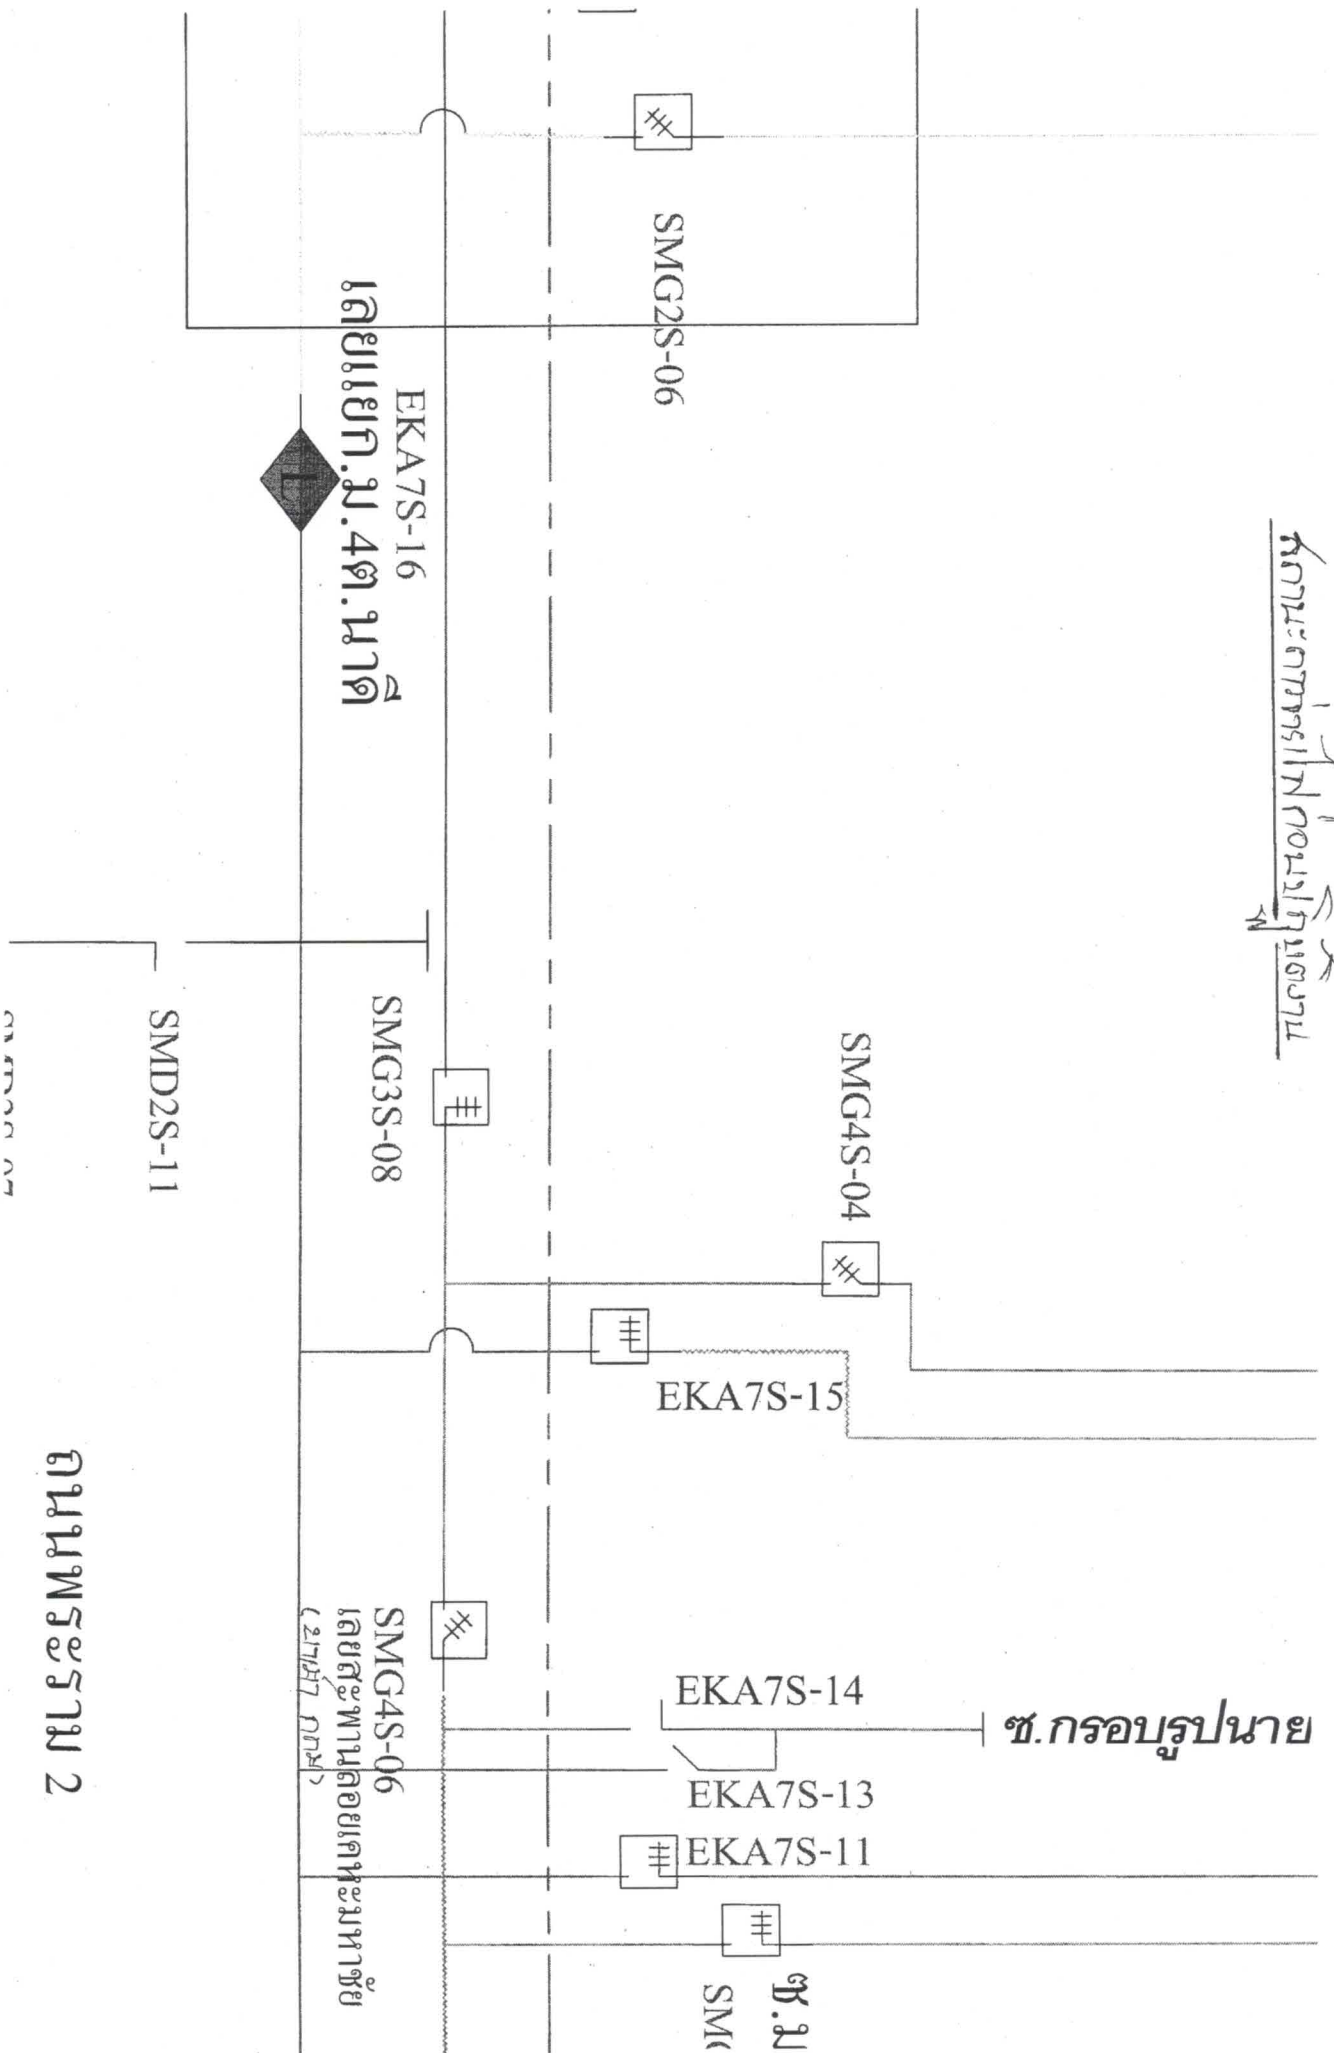

ถนนพระราม 2

การประกอบตู้ควบคุมอัตโนมัติ

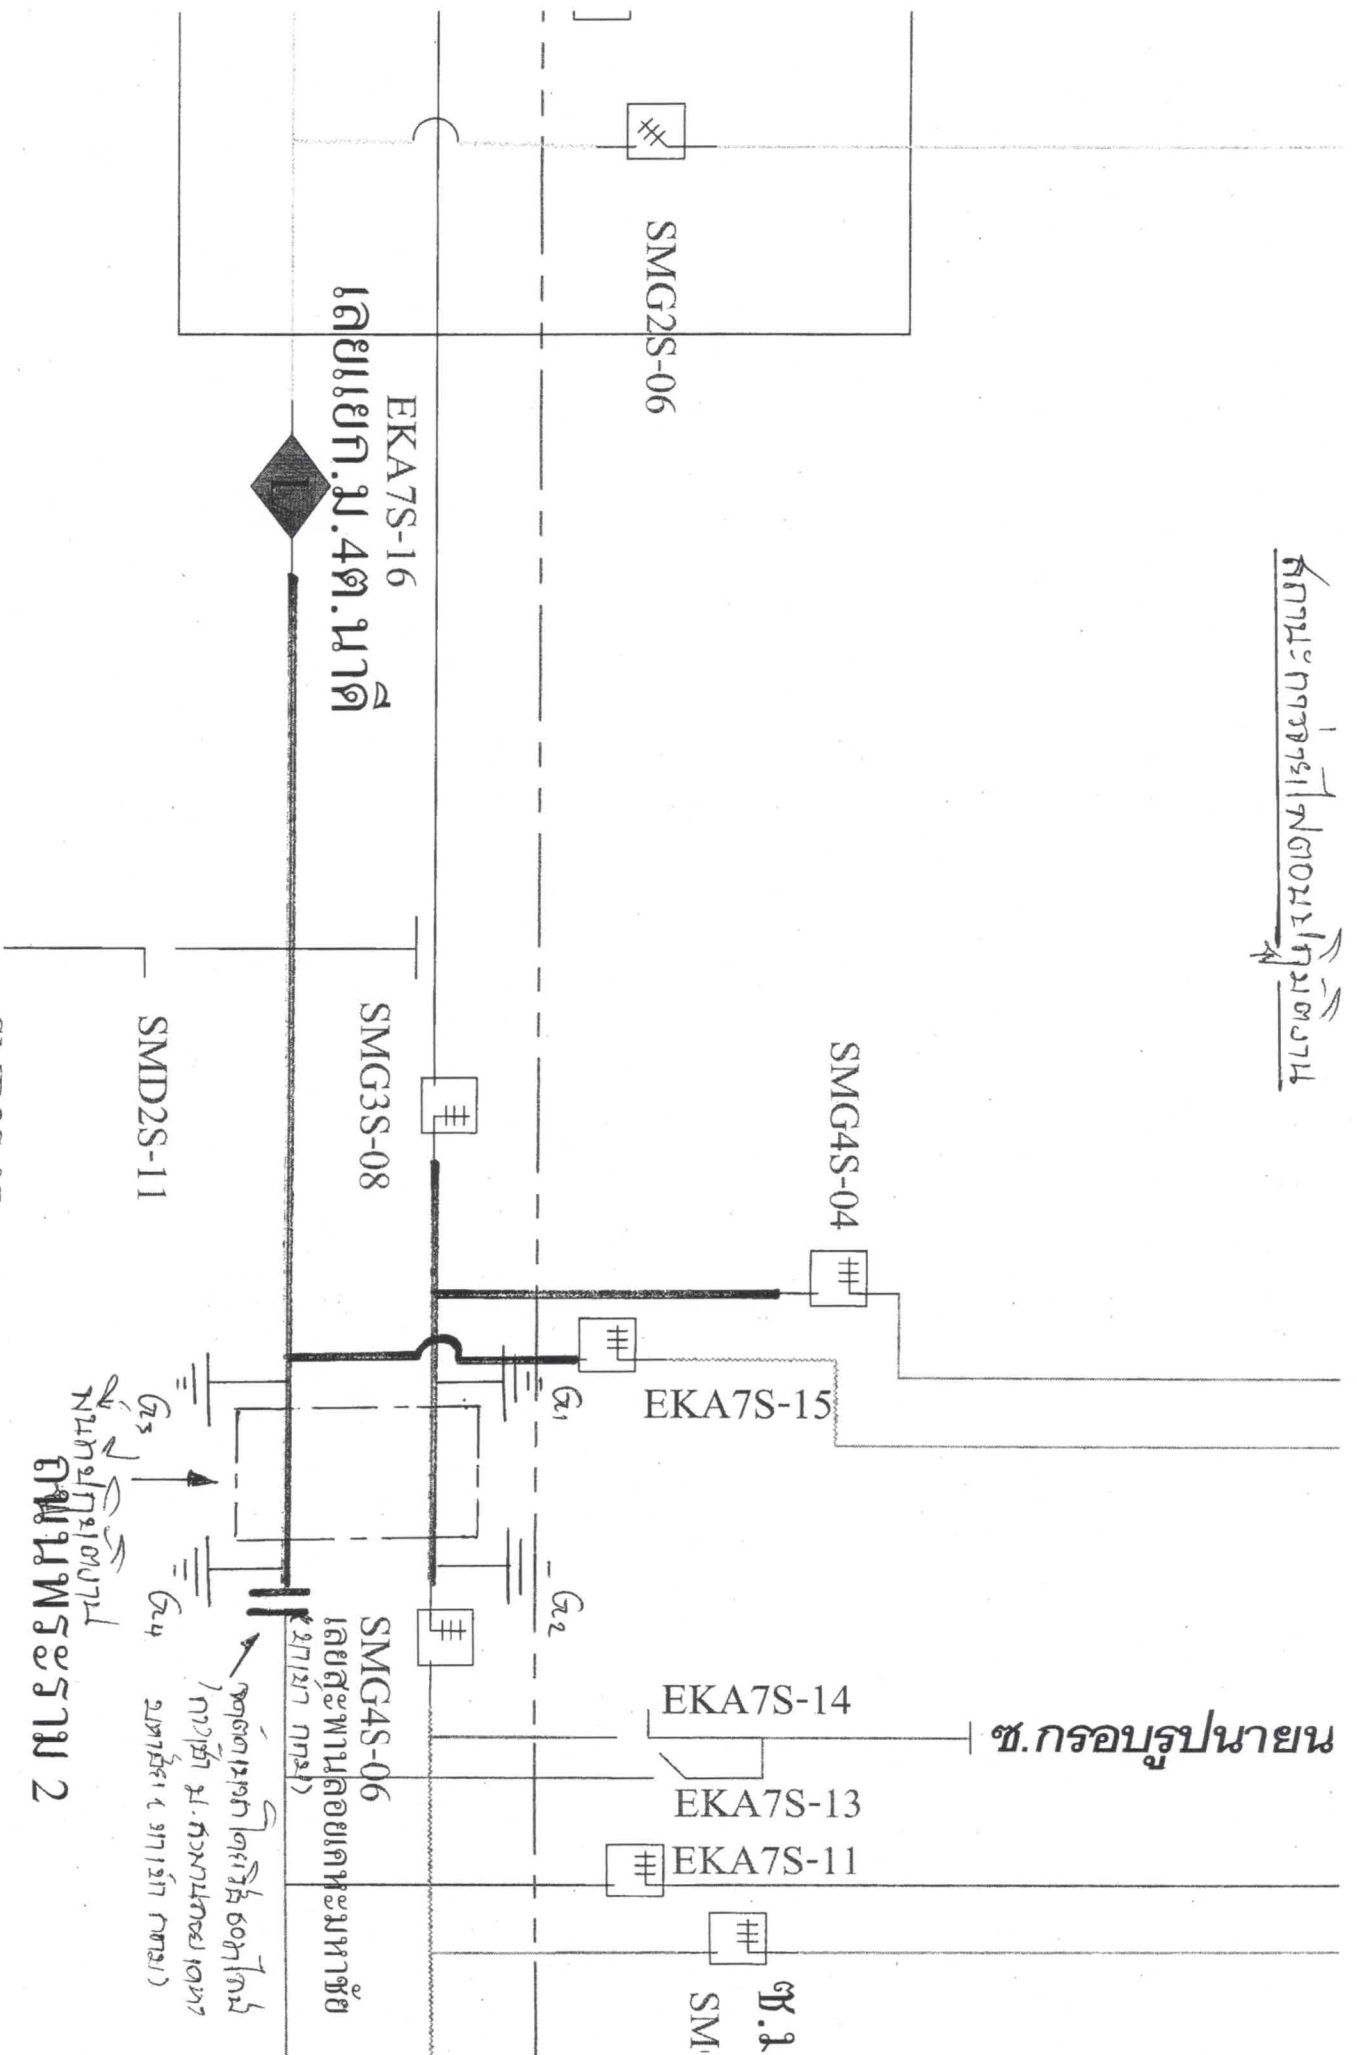

โครงการพัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้า

KTB2YS-06  
 10 MVA  
 2 MW

43YS-06  
 10 MVA  
 2 MW

