



Switching Deadline

02/04/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นญช. ๑๖๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พิชราสุวรรณชค
ชื่อผู้ส่ง นายรัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอคืนกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)

P:TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๑๐ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสัมเขปนแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA๐๓	๕ เม.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ชุดแก้กระแสไฟฟ้า นญช.๐๑ เปิด สวิตซ์ ไบมีดชั่วคราว บ้านคันทอง	วงจรพิดเตอร์ ๓ สถานีเสาขวัญ LWA๐๓	สวิตซ์ไบมีดชั่วคราวบ้านคันทอง วงจร LWA๐๓ สถานีเสาขวัญ	SF๖ รร.หนองหญ้าไซวิทยา DAA๐๒S-๐๕ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง	นายสุกฤษณ์ อังศิริ
๒.	DAA๐๒	๕ เม.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ชุดขอลโหนดกรรเข้าสุพรรณบุรีตัดสายเปิดวงจรต้น DDE บ้านบ่อหว้า	วงจรพิดเตอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๐๒	จุดตัดต้น DDE บ้านบ่อหว้า วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง	SF๖ รร.หนองหญ้าไซวิทยา DAA๐๒S-๐๕ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเวียง ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๐๒๖๔๓๐๑๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายรัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ LWA3 จาก DIS ๓๓. บ้านคันทอง ถึง DAA 25-05
ในวันที่ 5 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 470/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ DAA2 จาก ODE บ้านบ่อหว้า ถึง DAA 25-05
ในวันที่ 5 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิมลภา วิมลศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสำเริง ทวีไธสง

(นายวิมลภา วิมลศิริโพธิ์แก้ว)
ช่าง (วิมลศิริโพธิ์แก้ว) ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓๑๙.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น


ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านโค้งบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภพส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	470/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	29 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA6R-03	Normal	Nonreclosing		นญช	SCADA	- วัดทองเงิน
3	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
5	DIS ชค.บ้านคันทนอง	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นญช		DIS ชค. บ้านคันทนอง
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน โหลด DAA02 ตั้งแต่ จุดตัด DDE บ้านบ่อหว่า ถึง DAA02S-05 (ตามผังแนบ)						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตัด DDE DAA02 บริเวณบ้านบ่อหว่า โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
8	เมื่อผู้ควบคุมงาน ตัด DDE DAA02 บริเวณบ้านบ่อหว่า โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
13	DAA6R-03	Nonreclosing	Normal		นญช	SCADA	- วัดทองเงิน
14	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	DAA6R-03	Normal	Nonreclosing		นญช	SCADA	- วัดทองเงิน
21	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE DAA02 บริเวณบ้านบ่อหว่า โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
24	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อม DDE DAA02 บริเวณบ้านบ่อหว่า โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
25	DIS ชค.บ้านคันทนอง	ปลด	สับ		นญช		DIS ชค. บ้านคันทนอง
26	DAA6R-03	Nonreclosing	Normal		นญช	SCADA	- วัดทองเงิน
27	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
(บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๑๐๐

วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าตำบลช้าง
วันศุกร์ ที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

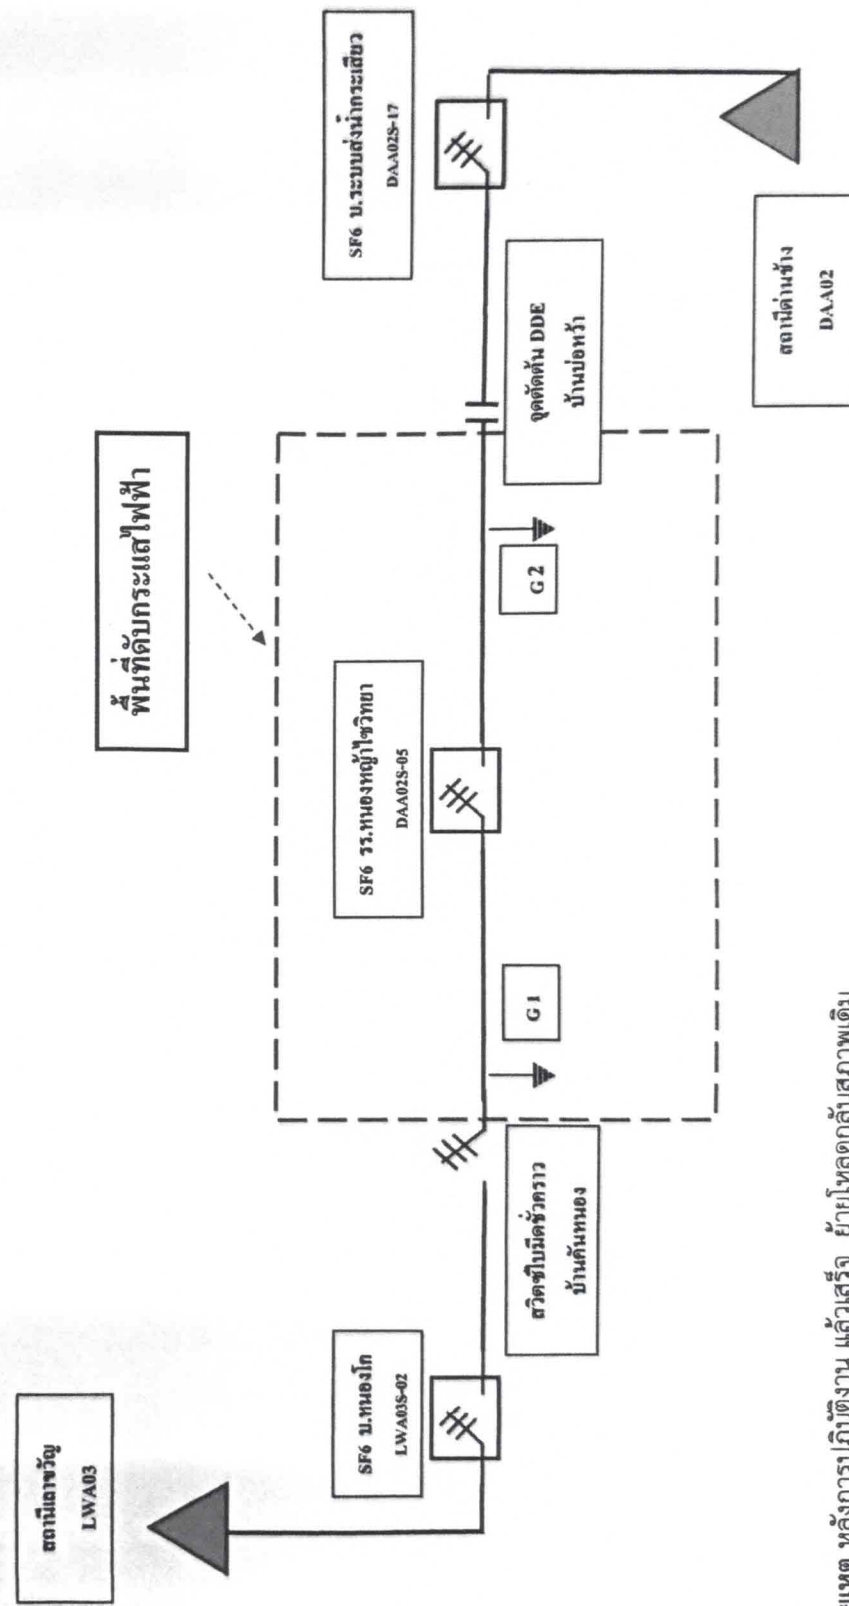

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม
