



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 เม.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทน. ๒๐๗ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายอนุชา ชำนาญเรือ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ชม.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ<br>และบริเวณที่ปฏิบัติงาน         | จาก                                       | ถึง   | ผู้ควบคุม<br>งาน      |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|---|---|-----------------------|
| ๑   | UTG09    | ๓ เม.ย. ๖๗   | ๐๘.๓๐ น.    | ๑๖.๓๐ น. | ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี)<br>บ้านห้วยลึก - บ้านตลุงเหนือ | ดิสชั่วคราว<br>หน้า บริษัท<br>ไทยควอลิตี้ | ดิสชั่วคราว<br>บ้านตลุงเหนือ<br>(กฟส.เลขาวิบูลย์) | นายอนุชา<br>ชำนาญเรือ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓๐ ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ชม.ก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๑๑๕

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)

ตำแหน่ง ชม.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ UTG09 จาก D๒๓.ใหม่ดงใหญ่ ถึง  
ในวันที่ ๕ เม.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 475/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)  
ว.ก. 5 กกน.น.ก.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) ผจก. ผจก. กฟส.อ.  
เรียน ผจก. อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |   |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ไลน์ UTG09 บ้านห้วยลึก - บ้านตลุงเหนือ   |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 3 เม.ย. 67   | ระหว่าง  | 08.30 น. ถึง 16.30 น.                           |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.พทน.   | งานที่ทำ | ปักเสา 22 เมตร (115kV) ตามใบขอปฏิบัติงาน 475/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวรรณพงษ์ นกเทศ  |          |   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   | วันที่ 1 เมษายน 2567   |          |   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | วันที่ 1 เมษายน 2567   |          |   |
|                        | 1. นายพรินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ                           |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)                       |
|                        | 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร                                 |          | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)                       |
|                        | 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต                      |          | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)                       |


| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                              |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง   |                                      |                      |      |              |            |                                       |
| 2   | UTG-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | UTG          |            |                                       |
| 3   | UTG-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | UTG          |            |                                       |
| 4   | UTG09VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | UTG          |            |                                       |
| 5   | LWA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | LWA          |            |                                       |
| 6   | LWA05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | LWA          |            |                                       |
| 7   | UTG05R-01  | Normal                               | Nonreclose,Block GND |      | หจจ.         | R          | R.สระลงเร็ว                           |
| 8   | UTG09R-01  | Normal                               | Nonreclose,Block GND |      | หจจ.         | R          | บ้านตลุงเหนือ                         |
| 9   | - ย้ายโหลด UTG09 ไปจ่ายจาก UTG05   |                                      |                      |      |              |            |                                       |
| 10  | UTG0BVB-01   | ปลด                                  | สับ                  |      | UTG          |            | CB 22 kV.ขนานเมนบัส                   |
| 11  | UTG05S-07  | ปลด                                  | สับ                  |      | ลข.          | SCADA      | SF6 บ้านตลุงเหนือ                     |
| 12  | UTG09S-07  | ปลด                                  | สับ                  |      | ลข.          |            | DIS บ้านหนองปรือ(ข้ามถนน)             |
| 13  | UTG09R-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | หจจ.         | R          | บ้านตลุงเหนือ                         |
| 14  | SW.SOURCE  | สับ                                  | ปลด                  |      | หจจ.         |            |                                       |
| 15  | SW.LOAD  | สับ                                  | ปลด                  |      | หจจ.         |            |                                       |
| 16  | UTG05S-07  | สับ                                  | ปลด                  |      | ลข.          | SCADA      | SF6 บ้านตลุงเหนือ                     |
| 17  | - ย้ายโหลด บ.ไทยควอลิตี้UTG09 ไปรับไฟจาก UTG05 **ผ่านไลน์ ชค.ดึงข้ามถนน ตามผังแนบ**              |                                      |                      |      |              |            |                                       |
| 18  | TIE LINE UTG05/09  | ปลด                                  | สับ                  |      | ลข.          |            | DIS จ่ายให้ บ.ไทยควอลิตี้(ข้ามถนน)ชค. |
| 19  | DIS ชค.UTG09   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | หจจ.         |            | DIS ชค.บริษัท ไทยควอลิตี้             |
| 20  | UTG0BVB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | UTG          |            | CB 22 kV.ขนานเมนบัส                   |
| 21  | - ดับไฟ เวลา 08.30 น.  |                                      |                      |      |              |            |                                       |
| 22  | DIS ชค.UTG09   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | ลข.          |            | DIS บ้านตลุงเหนือ                     |
| 23  | D/O UTG09  | สับ                                  | ปลด                  |      | ลข.          |            | D/O ธนาชีวทรัพย์                      |
| 24  | แจ้งกฟส.พทน.ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด PG เข้า บ.ไทยควอลิตี้(UTG09) ออกจากทั้ง 3 เฟส **ตามผังแนบ** |                                      |                      |      |              |            |                                       |
| 25  | หลังจาก HOTLINE ดำเนินการปลด PG เข้า บ.ไทยควอลิตี้(UTG09) ออกจากทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ             |                                      |                      |      |              |            |                                       |
| 26  | **มี CT มิเตอร์จุดแบ่งแดน Hotline แจ้งว่าสามารถดำเนินการปลดจุดจัมได้**                           |                                      |                      |      |              |            |                                       |
| 27  | UTG-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | UTG          |            |                                       |

| ที่   | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ             | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                                    |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------|------------|----------|------------------------------------|
| 28  | UTG-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto           |      | UTG          |            |          |                                    |
| 29  | UTG09VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | UTG          |            |          |                                    |
| 30  | LWA-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto           |      | LWA          |            |          |                                    |
| 31  | LWA05VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose     |      | LWA          |            |          |                                    |
| 32  | UTG05R-01   | Nonreclose,Block GND                 | Normal                |      | หจจ.         |            | R        | R.สระลงเรือ                        |
| 33  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พท. รับทราบ  |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 34  | แจ้งกฟส.พท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1                                   |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 35  | แจ้งกฟส.พท. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2                                   |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 36  | แจ้งกฟส.พท.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน  |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 37  | แจ้งกฟส.พท.ปฏิบัติงานได้  |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%% |   |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 38  | หลังจากกฟส.พท.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ                          |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 39  | แจ้งกฟส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก   |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 40  | แจ้งกฟส.พท.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก   |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 41  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง                                    |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 42  | UTG-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual         |      | UTG          |            |          |                                    |
| 43  | UTG-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual         |      | UTG          |            |          |                                    |
| 44  | UTG09VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | UTG          |            |          |                                    |
| 45  | LWA-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual         |      | LWA          |            |          |                                    |
| 46  | LWA05VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose    |      | LWA          |            |          |                                    |
| 47  | UTG05R-01   | Normal                               | Nonreclose,Block GND  |      | หจจ.         |            | R        | R.สระลงเรือ                        |
| 48  | - จ่ายไฟ  |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 49  | แจ้งกฟส.พท.ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG เข้า บ.ไทยควอลิตี้(UTG09) เข้าทั้ง 3 เฟส    |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 50  | หลังจาก HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG เข้า บ.ไทยควอลิตี้(UTG09) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 51  | DIS ชค.UTG09  | ปลด                                  | สับ                   |      | ลข.          |            | DIS      | บ้านตลุงเหนือ                      |
| 52  | D/O UTG9  | ปลด                                  | สับ                   |      | ลข.          |            | D/O      | ธนาชีวทรัพย์(ข้ามถนน)              |
| 53  | - ย้ายโหลด บ.ไทยควอลิตี้UTG09 กลับจาก UTG05 **ผ่านไลน์ ชค.ตั้งข้ามถนน ตามผังแนบ**     |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 54  | UTG08VB-01  | ปลด                                  | สับ                   |      | UTG          |            | CB       | 22 kV.ชานานเมนบัส                  |
| 55  | DIS ชค.UTG09  | ปลด                                  | สับ                   |      | หจจ.         |            | DIS      | ชค.บริษัท ไทยควอลิตี้              |
| 56  | TIE LINE UTG05/09   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)  |      | ลข.          |            | DIS      | จ่ายให้ บ.ไทยควอลิตี้(ข้ามถนน) ชค. |
| 57  | - ย้ายโหลด UTG09 ไปจ่ายจาก UTG05  |                                      |                       |      |              |            |          |                                    |
| 58  | UTG05S-07   | ปลด                                  | สับ                   |      | ลข.          | SCADA      | SF6      | บ้านตลุงเหนือ                      |
| 59  | SW.SOURCE   | ปลด                                  | สับ                   |      | หจจ.         |            |          |                                    |
| 60  | SW.LOAD   | ปลด                                  | สับ                   |      | หจจ.         |            |          |                                    |
| 61  | UTG09R-01   | ปลด                                  | สับ คง Non, Block GND |      | หจจ.         |            | R        | บ้านตลุงเหนือ                      |
| 62  | UTG09S-07   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)  |      | ลข.          |            | DIS      | บ้านหนองปรือ(ข้ามถนน)              |



| ที่                                       | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                   |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 63  | UTG05S-07   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน      |      | ลข.          | SCADA      | SF6      | บ้านตลุงเหนือ     |
| 64  | UTG0BVB-01  | สับ                                  | ปลด               |      | UTG          |            | CB       | 22 kV. ขนานเมนบัส |
| 65  | HOTLINE จะรีเซ็ตออนไลน์ซค. ที่จ่ายให้ไทยควอลิตี้หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ(ในบริเวณลพบุรี ข้ามถนน ) |                                      |                   |      |              |            |          |                   |
| 66  | UTG-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | UTG          |            |          |                   |
| 67  | UTG-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | UTG          |            |          |                   |
| 68  | UTG09VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | UTG          |            |          |                   |
| 69  | LWA-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | LWA          |            |          |                   |
| 70  | LWA05VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | LWA          |            |          |                   |
| 71  | UTG05R-01   | Nonreclose, Block GND                | Normal            |      | ทกจ.         |            | R        | R. สระลงเรือ      |
| 72  | UTG09R-01   | Nonreclose, Block GND                | Normal            |      | ทกจ.         |            | R        | บ้านตลุงเหนือ     |
| %%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% |   |                                      |                   |      |              |            |          |                   |

แผนผังเดินสาย 3 พ.ย. 67

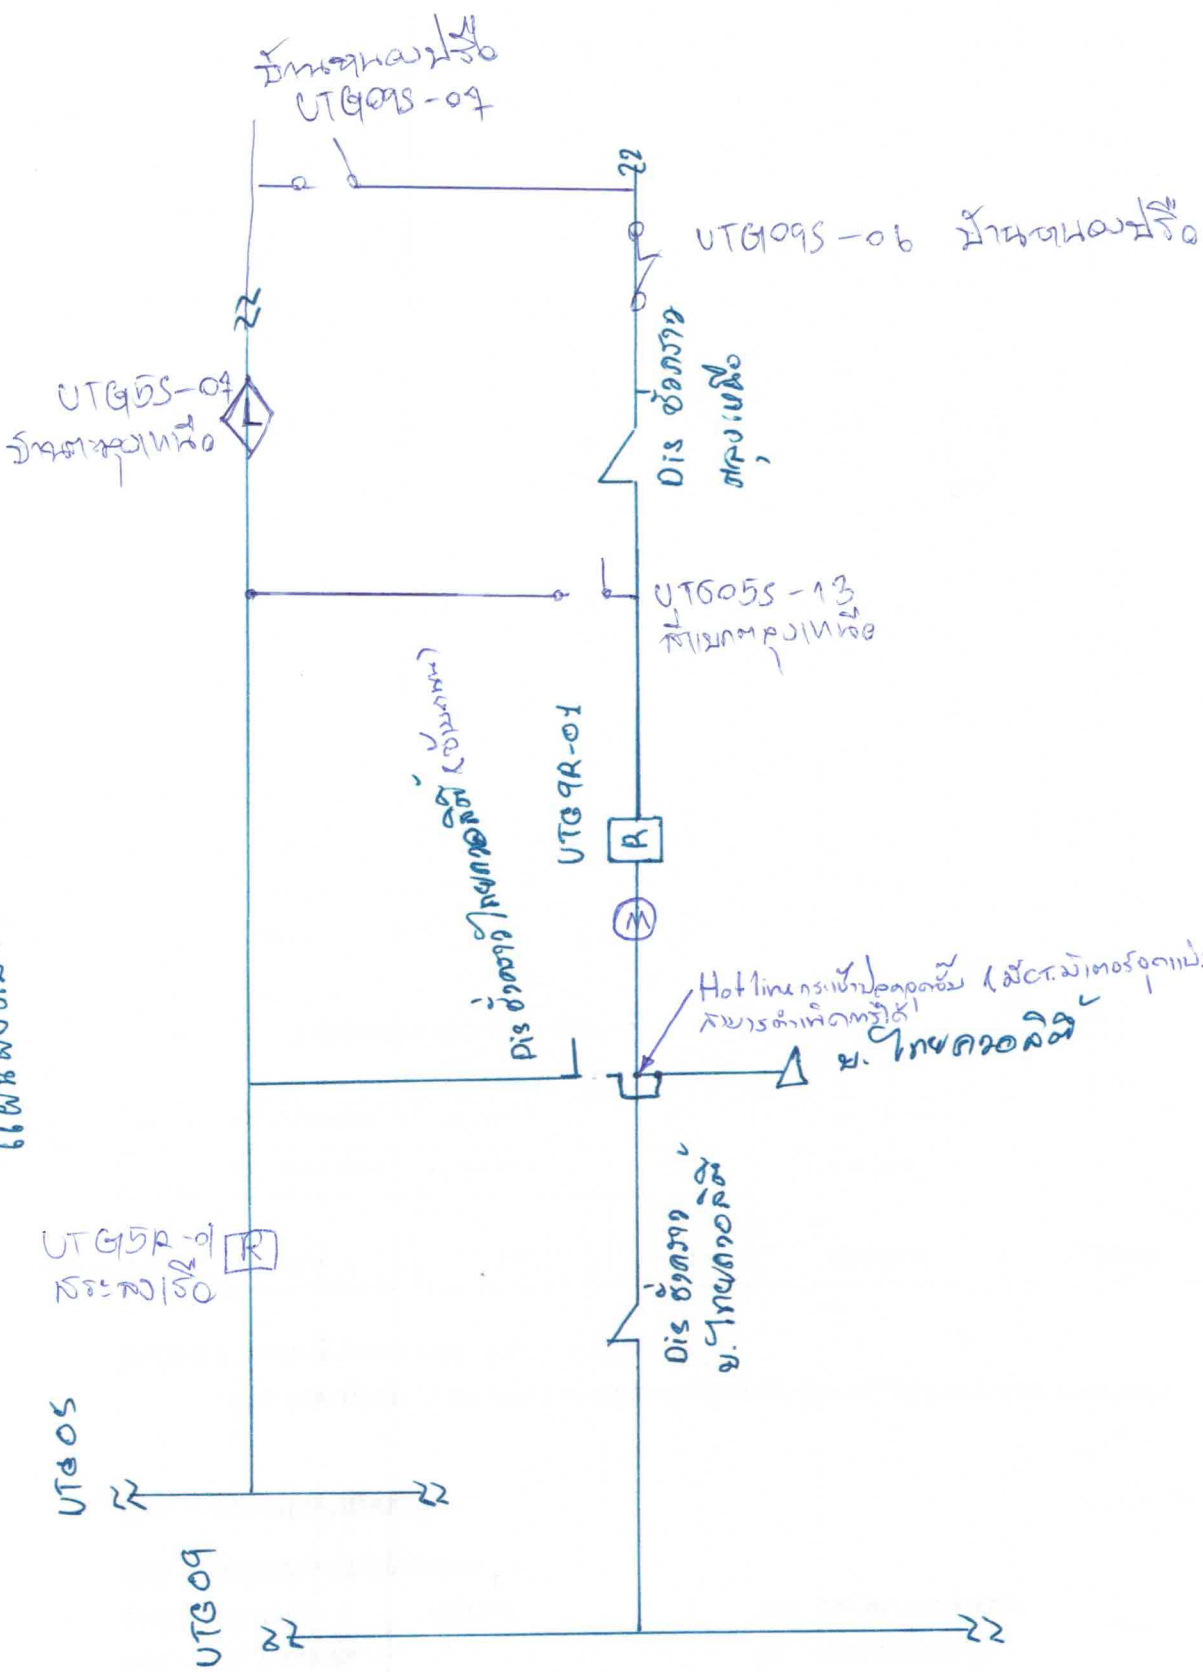

Hot line กรณีเข้าสายหรือขั้ว (ใช้กรณีที่มีสายหรือขั้ว Hot line หรือ) และกรณีที่มีขั้ว

ช. 10402020

