



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 เม.ย. 67

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปน) 402/2567

วันที่ 10 เม.ย. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานพาดสาย ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA 05	27 เม.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	พาดสายก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี หลังรีโคลสเซอร์หนองหิน	DAA5R-01 รีโคลสเซอร์ หนองหิน	ดิสชั่วคราวตันโพธิ์ใหญ่	นายอานวย กิตติโพธิ์นันท์ วทศ.9 กรย.(ก3) 086-2691259
2.	DAA 05	4 พ.ค.67	08.30 น.	16.30 น.		DAA5R-01 รีโคลสเซอร์ หนองหิน	ดิสชั่วคราวตันโพธิ์ใหญ่	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขม.ปน โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DAA05 จาก DAA05R-01 ถึง DJS ชด. ตันโพธิ์ใหญ่
ในวันที่ 27 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 520/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ DAA05 จาก DAA05R-01 ถึง DJS ชด. ตันโพธิ์ใหญ่
ในวันที่ 4 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ ๒๖กั้วอินโ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาง อริพันธ์ ศรีศักดิ์

12 เม.ย. 67

(นาย จิรวัฒน์ ๒๖กั้วอินโ)

๑๕๖-๕ ๒๓๓ ขน-กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑ข.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หนองหิน (DAA05)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
	4 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เครี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	520/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	12 เมษายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 เมษายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 เมษายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายโนช,นายวรรณพงษ์						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง					
2	DAA05R-01	Normal	Nonreclosing			ดบ.	R	หนองหิน
3	HKA07R-104	Normal	Nonreclosing			น.3	R	วัดวังคอไ้
4	ดับไฟย้ายโหลด 08.30 น.							
5	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนไปรับไฟจาก HKA07							
6	DIS ชั่วคราว DAA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ดบ.	DIS	ต้นโพธิ์ใหญ่
7	DAA05S-07	ปลด	สับ			ดบ.	DIS	หนองหิน - เนินขาม
8	ดับไฟทำงาน							
9	DAA05R-01	สับ	ปลด			ดบ.	R	หนองหิน
10	SW.LOAD	สับ	ปลด			ดบ.	R	หนองหิน
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.ดบ. รับทราบ							
12	แจ้ง กพอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
13	แจ้ง กพอ.ดบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
14	แจ้งให้ กพอ.ดบ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
15	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
16	HKA07R-104	Nonreclosing	Normal			น.3	R	วัดวังคอไ้
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****								
17	เมื่อ กพอ.ดบ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
18	แจ้ง กพอ.ดบ. ทำการปลด Short ground จุด G1							
19	แจ้ง กพอ.ดบ. ทำการปลด Short ground จุด G2							
20	HKA07R-104	Normal	Nonreclosing			น.3	R	วัดวังคอไ้
21	SW.LOAD	ปลด	สับ			ดบ.	R	หนองหิน
22	DAA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			ดบ.	R	หนองหิน
23	ย้ายโหลด DAA05 บางส่วนกลับจาก HKA07							
24	DAA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ดบ.	DIS	หนองหิน - เนินขาม
25	DIS ชั่วคราว DAA05	ปลด	สับ			ดบ.	DIS	ต้นโพธิ์ใหญ่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
		26	DAA05R-01						
27	HKA07R-104	Nonreclosing		Normal		น.3		R	วัดวังค้อไ้
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด									

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานพาดสายก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี

วงจร DAA 05 บริเวณ DAA5R-01 หนองหิน ถึง ต.ล.ชั่วคราวจุดดับไฟใหญ่

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน และวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

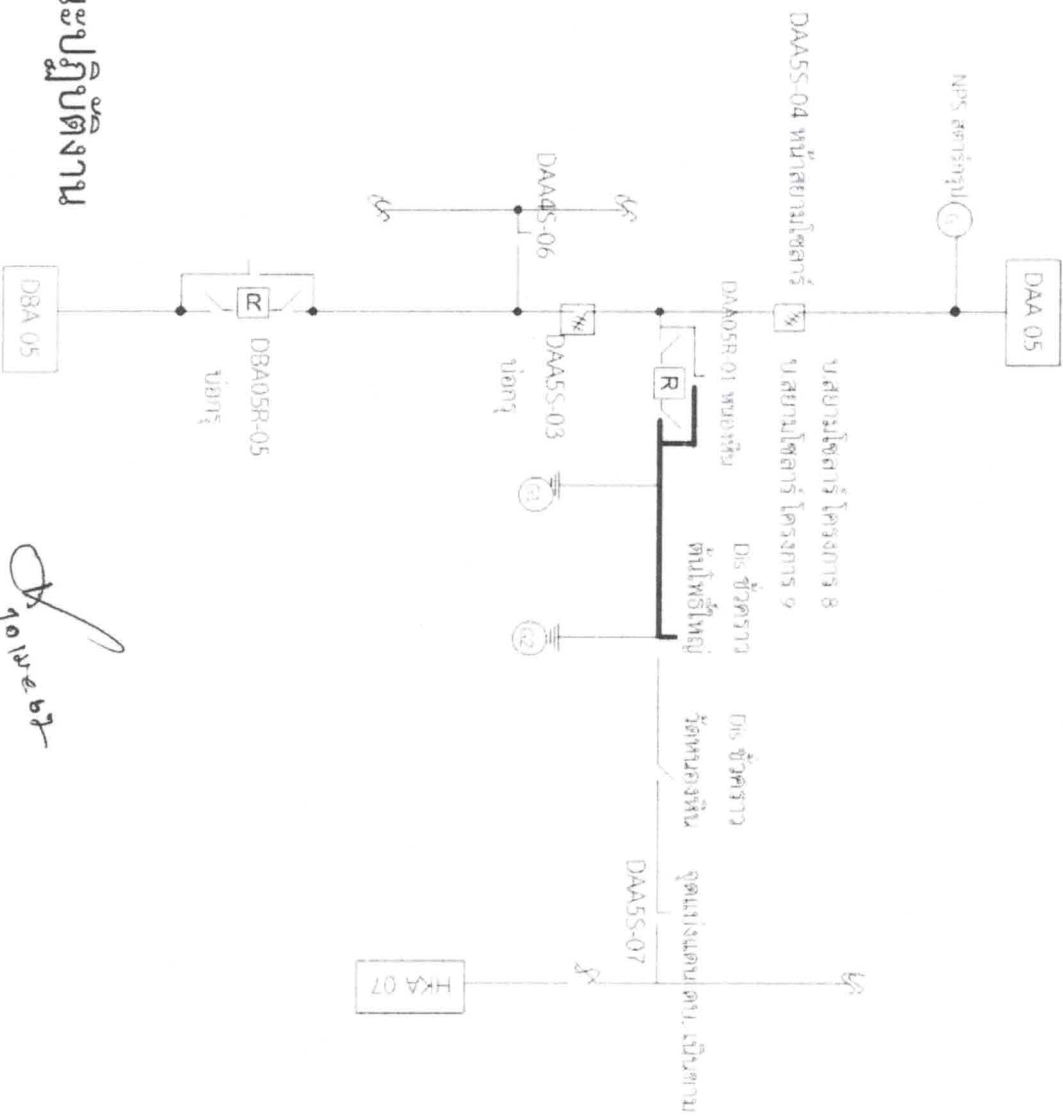

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

Signature

1. วันเสาร์ที่ 27 เมษายน และวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดับไฟ ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี

หมายเลข — บริเวณที่จ่ายไฟปฏิบัติงาน
