



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.) ๒๕๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณฉล
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๓	๑๗ พ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่	DOA๓R-๐๑ รีโคสเซอร์ สะพานดำ	SF๖ บ้านลาด สิงห์DBA ๓S- ๑๔	นาย รณชัย แสงทงศ์ ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓๐ เครื่อง ๙๐๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๐ ภาย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงทงศ์ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสรูด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พีดเดอร์ DOA๓R-๐๑ จาก DOA๓R-๐๑ ถึง DOA๓R-๑๔
ในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 615/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย คำดี สักดิ์ เจริญสมบัติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

(นายคำดี สักดิ์ เจริญสมบัติ)
๒๗.๔.๖๗ ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ผจก.กฟส.อ.ดจ.
ออ.บช.(ก.๓), ออ.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผน
แผนผังแนบ ๑ แผน



ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานดำ - ลาดสิงห์ (DOA03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟล.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DOA03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 615/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จีรวัดณ์, วัฒนา, พิษชา, วีรวัชร, อมร 2. นครินทร์, พิษยา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
4	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านลาดสิงห์
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1 -
6	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
7	- ย้ายโหลด DOA03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA03						
8	DBA03S-13	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 สะพานบ้านสระ
9	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.	SCADA	SF6 บ้านลาดสิงห์
10	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
11	DOA03R-01	สับ	ปลด		ดจ.		R สะพานดำ
12	Sw.load	สับ	ปลด		ดจ.		DIS DOA03R-01 (R. สะพานดำ)
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
17	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
18	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
19	DBA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
20	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP1 -
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
26	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
27	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
28	DBA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านลาดสิงห์
29	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1 -
30	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Sw.load	ปลด	สับ		ดจ.		DIS DOA03R-01 (R. สะพานดำ)
32	DOA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดจ.		R สะพานดำ
33	- ย้ายโหลด DOA03 บางส่วน กลับจาก DBA03						
34	DBA03S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 บ้านลาดสิงห์
35	DBA03S-13	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 สะพานบ้านสระ
36	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
37	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
38	DBA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
39	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP1 -
40	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

DOA3R-01



จุดเชื่อมต่อกราวด์ G1

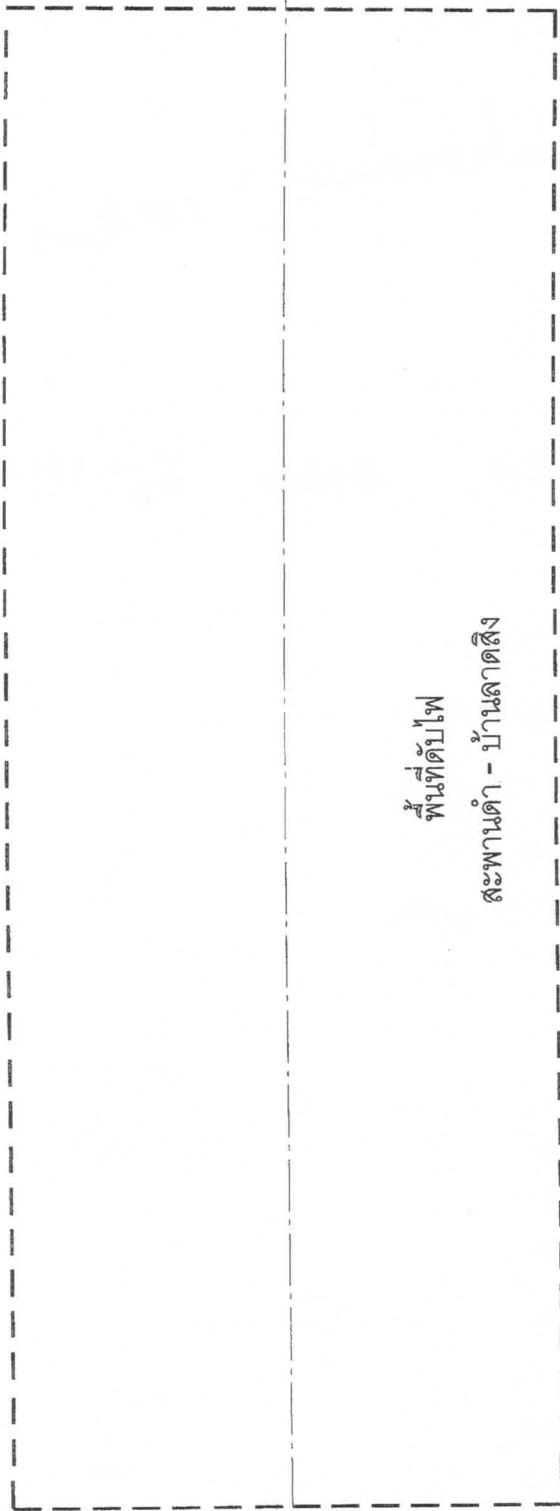

พื้นที่ปลูก

สะพานดำ - บ้านลาดสิง

DBA 3S-14



จุดเชื่อมต่อกราวด์ G2
