



วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปป) ๒๕๖๗ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง รีโคลสเซอร์ บริเวณ หน้า หมู่บ้านพีช ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMD๐๓	2 มิ.ย. 67	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ติดตั้ง รีโคลสเซอร์ บริเวณ หน้า หมู่บ้านพีช	จุดตัดเบรกโดยวิธี ขอตไลน์กระเช้า บริเวณ ผังตรงข้าม ร.นิวเฟรน	SMD๓S-๐๒ หน้าหมู่บ้านพีช	นายไชรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร.๐๙๐-๙๑๗๗๑๙๑
๒	SMD๐๘	2 มิ.ย. 67	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		จุดสายกลาง Span โดยวิธีขอตไลน์ กระเช้า บ.หน้า พิพิธภัณฑ์ประมง	SMD๘S-๐๔ หน้าหมู่บ้านพีช	
๓	๑๑๕ KV SME๒Y	2 มิ.ย. 67	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		SME๒YS-๐๘ หน้าวัดกลาง อ่างแก้ว	สถานีฯ สค.๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ท.พ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMD3 จาก DDE สายพินจิวเฟลง ถึง SMD35-02
ในวันที่ 2 มิ.ย.67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 664/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMD8 จาก DDE สายพินจิวเฟลง ถึง SMD88-04
ในวันที่ 2 มิ.ย.67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 15kv. จาก SME245-08 ถึง SMD34B-01
ในวันที่ 2 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริธรา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ.อำนวยการ (เทคนิค)


(นายสิริธรา กลิ่นประทุม)
ผคฟ. วิศวกรระบบ นคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจฟ. ๕ (สถานี SMD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

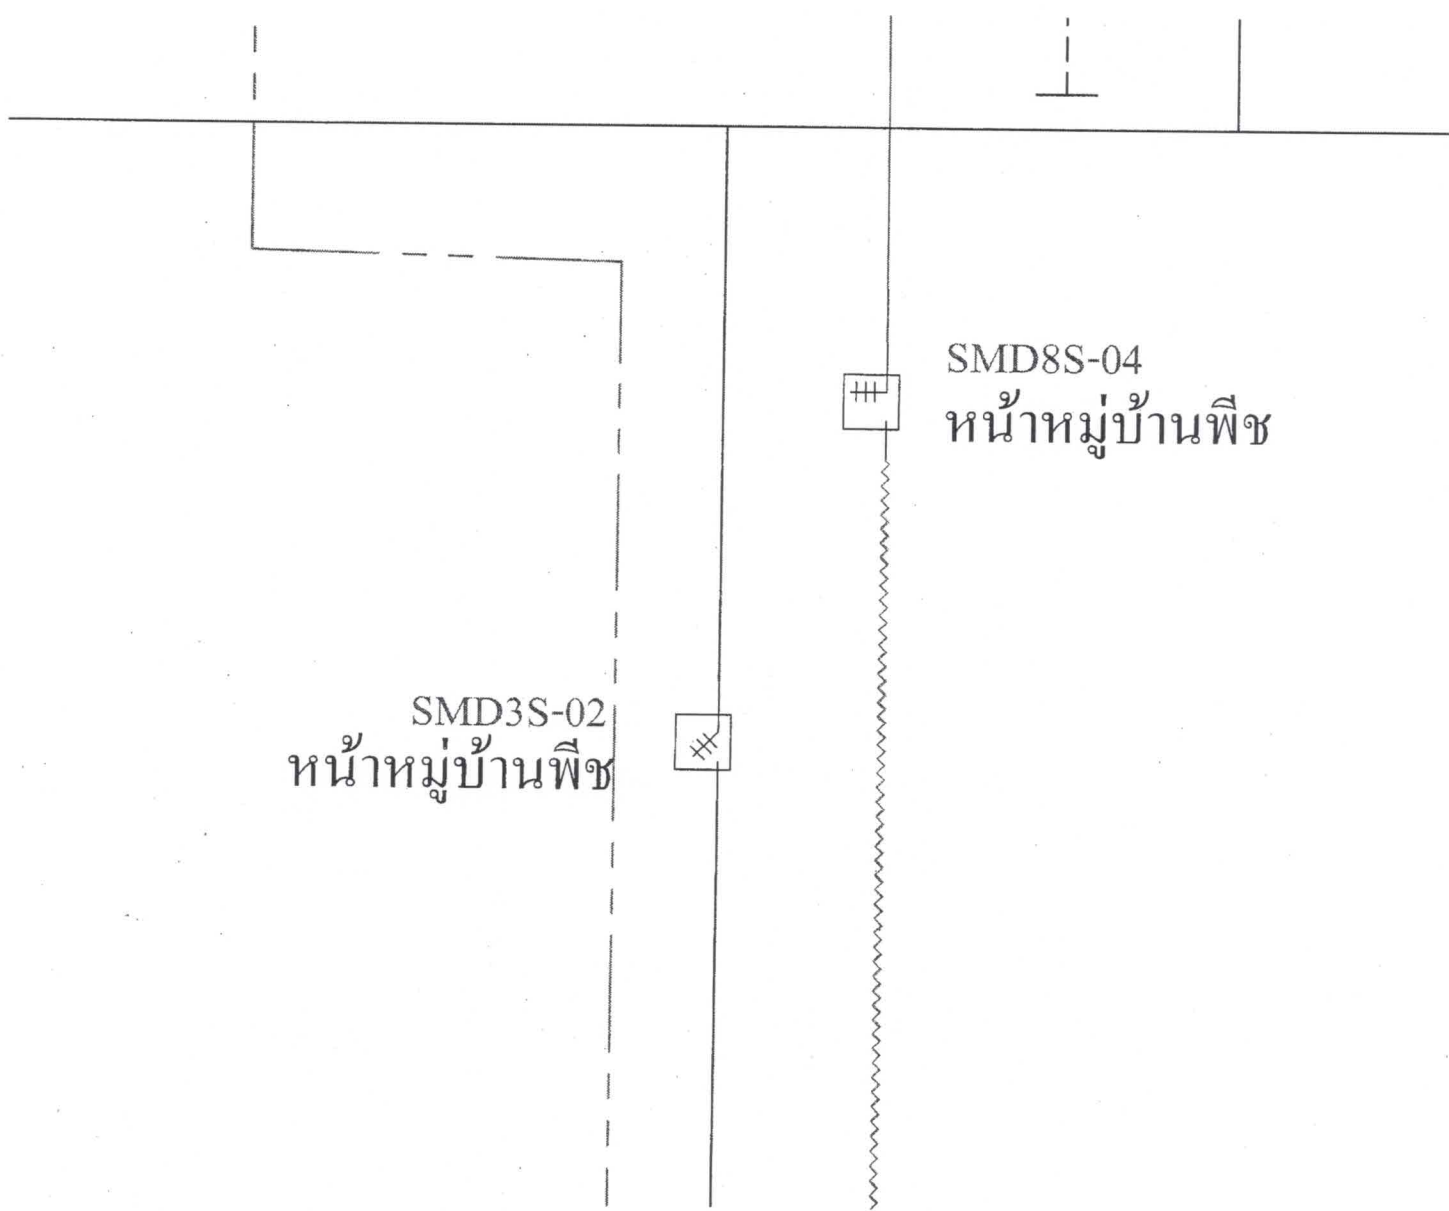
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหมู่บ้านพีช				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 มิ.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser แทน SF6 SMD3S-02		ตามใบขอปฏิบัติงาน 664/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	24 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	** งานที่ทำ ติดตั้ง Recloser แทน SF6 SMD3S-02 **						
3	** หลังงานเสร็จ จะทำการสับ SW. BYPASS ไว้ก่อน ยังไม่นำเข้าระบบ **						
4	SMD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- Load 2.8 MW.
5	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- Load 4.1 MW.
6	SMD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- Load 3.2 MW.
7	ย้ายโหลด SMD 3 บางส่วนไปจ่ายจาก SMD 1						
8	SMD03S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้า รร.นิเวเฟรน
9	SMD03S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 หน้าหมู่บ้านพีช (บน)
10	ตรวจสอบสถานะ SMD8S-04 SF6 หน้าหมู่บ้านพีช สถานะ OFF และ ล๊อคคาน						
11	ตรวจสอบสถานะ Close Loop SME-BAL-KTE-SMD สถานะ Close Loop อยู่						
12	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SMD03YS-02	สับ	ปลด		SMD		- ใบมีด 115 เควี
18	SMD03YS-03	สับ	ปลด		SMD		- ใบมีด 115 เควี
19	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
20	SME02YS-08	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		สค.		ABS วัดกลางอ่างแก้ว
21	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงออก ก่อนทำการตัด DDE						
22	หลังจากหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงออก เรียบร้อย						
23	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณตรงข้ามนิเวเฟรน (SMD3) ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
24	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ประมง (SMD8) ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
25	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE ทั้ง 2 จุด ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ (ตามแผนผังแนบ)						
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซัดกราวด์ จุด G3						
30	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซัดกราวด์ จุด G4						
31	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซัดกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
32	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
33	SMD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
34	SMD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
35	SMD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
36	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
37	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
38	** ตรวจสอบสถานะ SW. Source , Load , BYPass สถานะ " ปลด " อยู่ทั้งหมด **						
39	SMD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
40	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
41	SMD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
42	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	แจ้งหน่วยงาน ปลดซัดกราวด์ จุด G1						
44	แจ้งหน่วยงาน ปลดซัดกราวด์ จุด G2						
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดซัดกราวด์ จุด G3						
46	แจ้งหน่วยงาน ปลดซัดกราวด์ จุด G4						
47	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
48	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามนิวเฟรน (SMD3) เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
49	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าพิพิธภัณฑน์ประมง (SMD8) เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
50	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE ทั้ง 2 จุด เข้าเรียบร้อย แล้วเสร็จ						
51	SME02YS-08	ปลด	สับ		สค.		ABS วดกลางอ่างแก้ว
52	ย้ายโหลด SMD 3 บางส่วนกลับจาก SMD 1						
53	SW.Bypass Recloser	ปลด	สับ		สค.		DIS BYPASS Recloser
54	SMD03S-04	สับ	ปลด		สค.		SF6 หน้า ร.นิวเฟรน
55	ให้ทำการปลดล๊อคคาน SMD8S-04 หน้าหมู่บ้านพีช						
56	จ่ายไฟ Close Loop กลับสภาพปกติ						
57	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SMD03YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ใบมีด 115 เควี
61	SMD03YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ใบมีด 115 เควี
62	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SMD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-

ลักษณะการวางไฟก่อนเปิดผนัง



SMD3S-02
หน้าหมู่บ้านพีช

SMD8S-04
หน้าหมู่บ้านพีช

สถานการณ์การขยายไปของหม้อแปลง

