



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กฟส.อ.ดจ. ๑๔ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านสระด่าน
สถานีไฟฟ้านครราชสีมา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA06	20 ม.ค.2567	08.00 น.	16.30 น.	ดับไฟปักเสา พาดสายใหม่ บริเวณบ้านสระด่าน	DIS ชั่วคราว สะพานโคกหม้อ	DBA03S-16 ดิสบ้านสระด่าน	นายสำเร็จ นิลแดง ๐๘๔-๘๓๖๘๑๔๔
๒	DOA06	27 ม.ค.2567	08.00 น.	16.30 น.	ดับไฟปักเสา พาดสายใหม่ บริเวณบ้านสระด่าน	DIS ชั่วคราว สะพานโคกหม้อ	Dis ชั่วคราว ๑๓๐๖ 13	นายสำเร็จ นิลแดง ๐๘๔-๘๓๖๘๑๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟบริเวณบ้านสระด่าน, บ้านดอนมะเกลือ, บ้านหนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ นิลแดง ตำแหน่ง พง.๗ ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร ๐๘๔-๘๓๖๘๑๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ DOA06 จาก Dis. สะพานโคกหม้อ ถึง Dis. สะพาน ๑๓๐๖ 13

ในวันที่ 27 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 68/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสิทธิ์ เทียมพจน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสำเร็จ นิลแดง

(นายอนุสิทธิ์ เทียมพจน์
๐๘๔.5 แทน นพ.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.จ., กฟส. สช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสระด่าน (DOA06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	ภพส.ดจ.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 68/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	11 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรวีร์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
4	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดจ.	R	โคกหม้อ
5	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.	R	บ้านสระด่าน
6	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA03						
7	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	-	ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	สับ		สช.	DIS	บ้านสระด่าน
9	Dis.ไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	ชั่วคราว คลอง 13
10	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	Dis.ไลน์ DOA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	ชั่วคราว สะพานโคกหม้อ
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
18	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
19	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดจ.	R	โคกหม้อ
20	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.	R	บ้านสระด่าน
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
25	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
26	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
27	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
28	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ดจ.	R	โคกหม้อ
29	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.	R	บ้านสระด่าน
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis.ไลน์ DOA06	ปลด	ล๊ับ		ดจ.	DIS	ชั่วคราว สะพานโคกหม้อ
32	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนกลับจาก DOA03						
33	DOABVB-01	ปลด	ล๊ับ		DOA	-	ขนานบัส
34	Dis.ไลน์ DOA06	ปลด	ล๊ับ		ดจ.	DIS	ชั่วคราว คลอง 13
35	DBA03S-16	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	บ้านสระด่าน
36	DOABVB-01	ล๊ับ	ปลด		DOA	-	ขนานบัส
37	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
38	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
39	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ดจ.	R	โคกหม้อ
40	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.	R	บ้านสระด่าน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ก่อนดับไฟ งานปรับปรุงขบวนรถบ้านสระด่าน-R. โคกหม้อ(ช่วง 3) วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น.

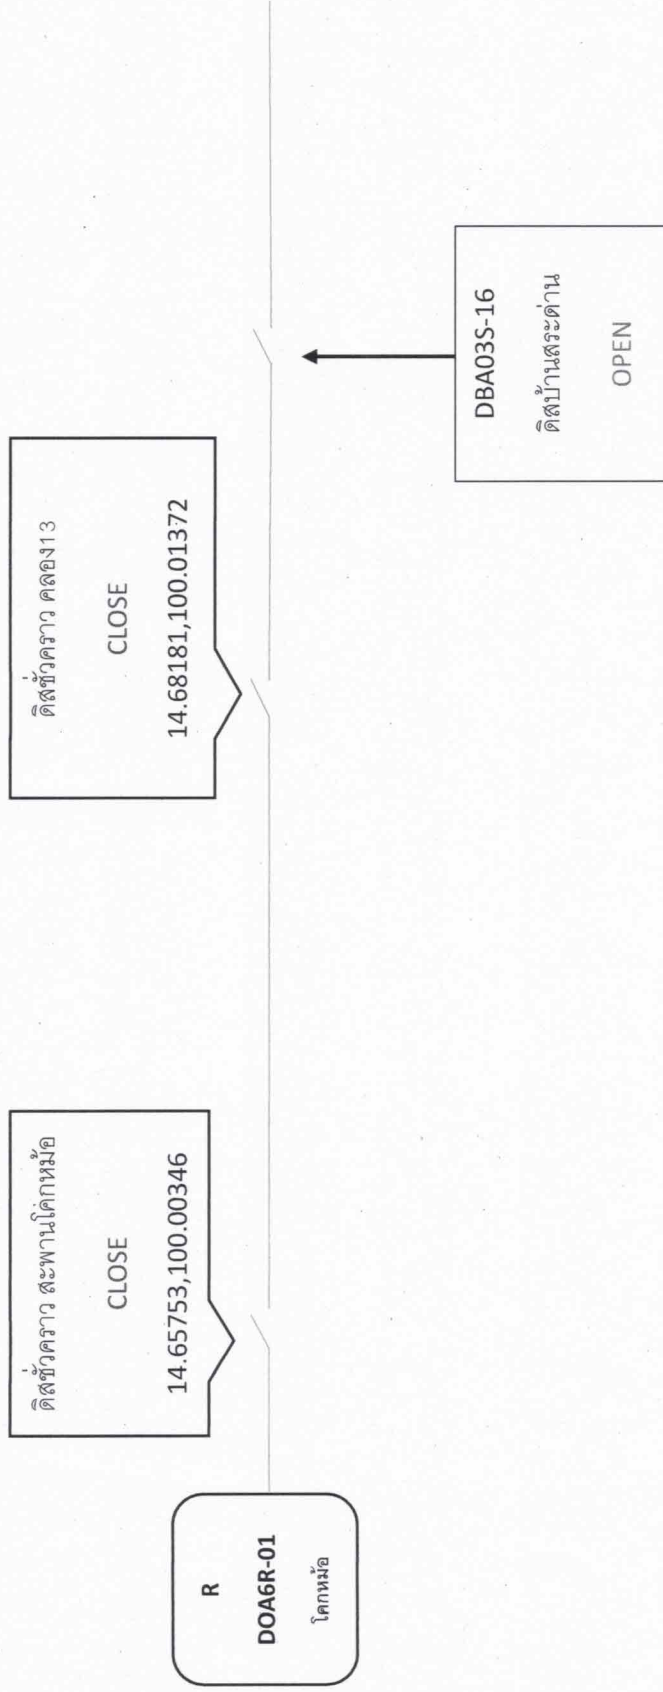

หลังดับไฟ งานปรับปรุงขบวนรถบ้านสระด่าน-R. โคกหม้อ(ช่วง 3) วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น.

