



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. Sukhavan, Parkkiet.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผ่น

แผนผังแนว.....1.....แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง


|                        |   |          |                       |                   |                 |    |
|------------------------|---|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน        | แยกไฟสี่ - หน้าวัดสระลงเรือ (ดับเข้า-จ่ายเย็น)  |          |                       |                   |                 |    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 20 - 22 พ.ค. 2567   | เวลา     | 08.30 น.              | ถึง               | 16.30           | น. |
| กำหนดวันที่ทำงาน       | 24 - 27 พ.ค. 2567   | เวลา     | 08.30 น.              | ถึง               | 16.30           | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.พทน.  | งานที่ทำ | ก่อสร้างระบบ 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 708/2567        |    |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นาย พิศาล วัฒนศิริ  |          |                       | วันที่            | 16 พฤษภาคม 2567 |    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                       | วันที่            | 16 พฤษภาคม 2567 |    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          |                       | วันที่            | 16 พฤษภาคม 2567 |    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒน, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                       |                   |                 |    |

| ที่                               | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1                                 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                                       |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 2                                 | UTG-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | UTG          |            | TP1 -                   |
| 3                                 | UTG-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | UTG          |            | TP2 -                   |
| 4                                 | UTG05VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | UTG          |            | CB -                    |
| 5                                 | UTG05R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | หจก.         | SCADA      | R สระลงเรือ             |
| 6                                 | UTG09R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | หจก.         | SCADA      | R บ้านตลุงเหนือ         |
| 7                                 | - ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 8                                 | UTGBVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | UTG          |            | CB ขนานบัส              |
| 9                                 | UTG05S-13  | ปลด                                  | สับ                  |      | หจก.         |            | DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ |
| 10                                | DIS ชค. UTG05  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | หจก.         |            | DIS หน้าวัดสระลงเรือ    |
| 11                                | UTGBVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | UTG          |            | CB ขนานบัส              |
| 12                                | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 13                                | SF6 ชค. UTG05  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | หจก.         |            | SF6 แยกไฟสี่            |
| 14                                | ตรวจสอบ UTG05S-08 (SF6 แยกไฟสี่) อยู่สถานะ " OPEN+LOCK"                                  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 15                                | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 16                                | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 17                                | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 18                                | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe                     |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 19                                | UTG-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | UTG          |            | TP1 -                   |
| 20                                | UTG-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | UTG          |            | TP2 -                   |
| 21                                | UTG05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | UTG          |            | CB -                    |
| 22                                | UTG09R-01  | Nonreclosing                         | Normal               |      | หจก.         | SCADA      | R บ้านตลุงเหนือ         |
| 23                                | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 24                                | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| <b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b> |  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 25                                | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 26                                | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1   |                                      |                      |      |              |            |                         |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์                              | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 27                        | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 28                        | UTG-TP1                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | UTG          |            | TP1 -                   |
| 29                        | UTG-TP2                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | UTG          |            | TP2 -                   |
| 30                        | UTG05VB-01                               | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | UTG          |            | CB -                    |
| 31                        | UTG09R-01                                | Normal                               | Nonreclosing         |      | หจก.         | SCADA      | R บ้านตลุงเหนือ         |
| 32                        | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ                       |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 33                        | SF6 ชค. UTG05                            | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | หจก.         |            | SF6 แยกไฟสี่            |
| 34                        | - ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับจาก UTG09    |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 35                        | UTGBVB-01                                | ปลด                                  | สับ                  |      | UTG          |            | CB ขนานบัส              |
| 36                        | DIS ชค. UTG05                            | ปลด                                  | สับ                  |      | หจก.         |            | DIS หน้าวัดสละลงเร็ว    |
| 37                        | UTG05S-13                                | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | หจก.         |            | DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ |
| 38                        | UTGBVB-01                                | สับ                                  | ปลด                  |      | UTG          |            | CB ขนานบัส              |
| 39                        | UTG-TP1                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | UTG          |            | TP1 -                   |
| 40                        | UTG-TP2                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | UTG          |            | TP2 -                   |
| 41                        | UTG05VB-01                               | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | UTG          |            | CB -                    |
| 42                        | UTG05R-01                                | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | หจก.         | SCADA      | R สละลงเร็ว             |
| 43                        | UTG09R-01                                | Nonreclosing, ALT                    | Normal               |      | หจก.         | SCADA      | R บ้านตลุงเหนือ         |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |  |                                      |                      |      |              |            |                         |

๕๕๓๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

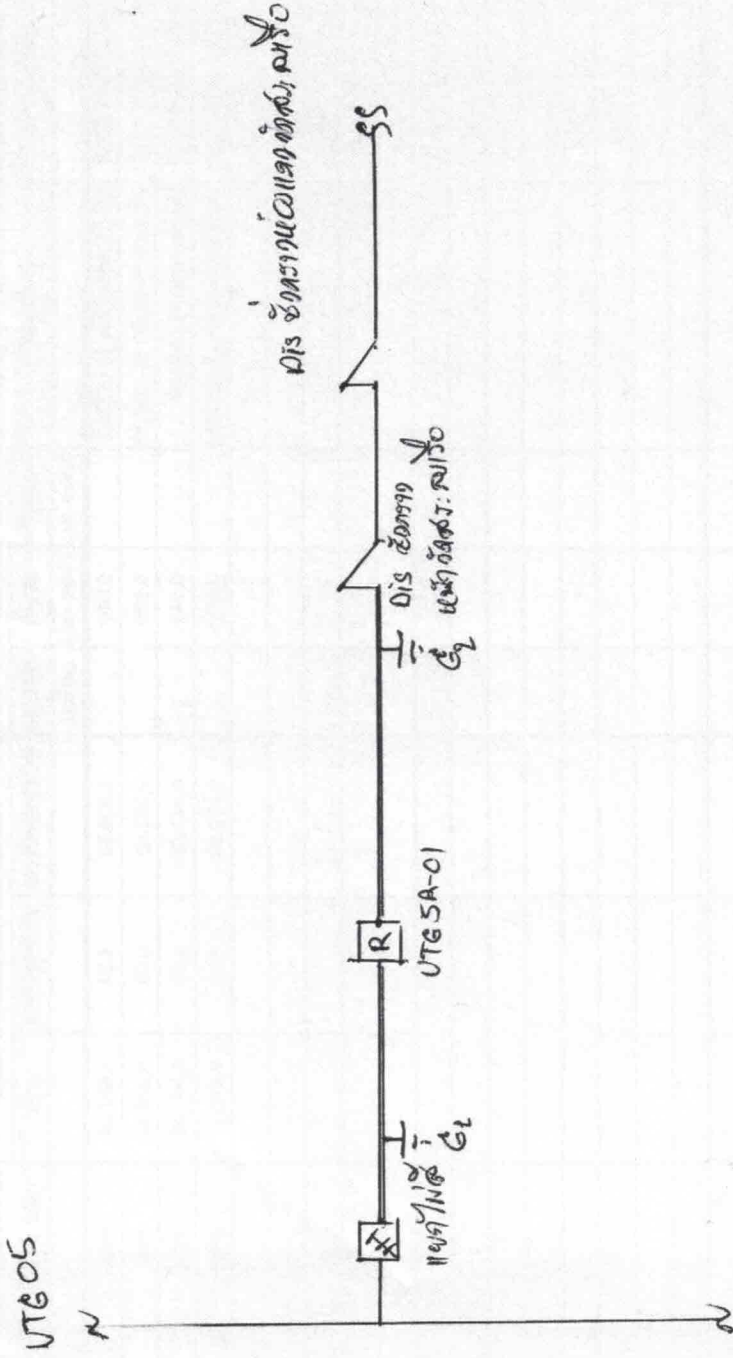

  
 ( นายอนุชา ชำนาญเรือ )  
 ขณ.กป.กฟส.อ.ททท.
