



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๓๒๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๒๕ พ.ค.๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านห้วยลึก-บ้านหนองแร้ง	ดิสชั่วคราว บ้านผู้ใหญ่	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผจก.ป โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๑.๑  มีโอกาสชำรุด
- ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สุรวุฒิ บุญนาค  
( นายสุรวุฒิ บุญนาค )  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UTG09 จาก บ.ป.๒ บ้านผู้ใหญ่ ถึง บ.ป.๓ ไทยควอลิตี้  
ในวันที่ 25-31 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 733/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ลามศิริโชติแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ กอ.๐๓๖ ๕๖๗๖ ๑๕๐  
22 พ.ค. 67

วิวัฒน์ ลามศิริโชติแก้ว  
( นายวิวัฒน์ ลามศิริโชติแก้ว )  
ตำแหน่ง วิศวกรแผนก กอ.๐๓๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ลพ. , กฟผ. นคร. , กฟผ. พกน.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผน

แผนผังแนบ.....1.....แผน


ผจพ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis.บ.ไทยควอลิตี้ - DIS ชค.บ้านผู้ใหญ่ (UTG09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-31 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 733/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนเช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีร์วิษฐ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	**ทำงานวันที่ 25-31 พ.ค. 67 **							
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		
5	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		
6	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		
7	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			กกจ.	R	สละลงเรือ
8	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND			ลช.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
9	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG05							
10	Bypass Recloser บ้านตลิ่งเหนือ รหัส UTG09R-01							
11	Sw.Bypass	ปลด	สับ			ลช.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
12	UTG09R-01	สับ	ปลด			ลช.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
13	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG	-	ขนานบัส
14	UTG05S-13	ปลด	สับ			ลช.	DIS	สื่แยกบ้านตลิ่งเหนือ
15	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			กกจ.	DIS	ชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้
16	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG	-	ขนานบัส
17	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
18	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			กกจ.	DIS	ชั่วคราวบ้านผู้ใหญ่
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ							
20	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
21	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
22	แจ้งให้ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
23	แจ้ง กฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
24	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		
25	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		
26	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
27	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		
28	UTG05R-01	Normal	Normal,ALT			ทกจ.	R	สละลงเรือ
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****								
29	เมื่อ กฟส.พทน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
30	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		
31	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		
32	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		
33	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		
34	UTG05R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT			ทกจ.	R	สละลงเรือ
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
36	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G1							
37	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G2							
38	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.	DIS	ชั่วคราวบ้านผู้ใหญ่
39	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน คินจาก UTG05							
40	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG	-	ขนานบัส
41	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.	DIS	ชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้
42	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.	DIS	สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
43	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG	-	ขนานบัส
44	นำ Recloser บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG09R-01 เข้าระบบ							
45	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
46	Sw.Bypass	สับ	ปลด			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
47	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG	-	
48	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG	-	
49	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG	-	
50	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG	-	
51	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			ทกจ.	R	สละลงเรือ
52	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****								

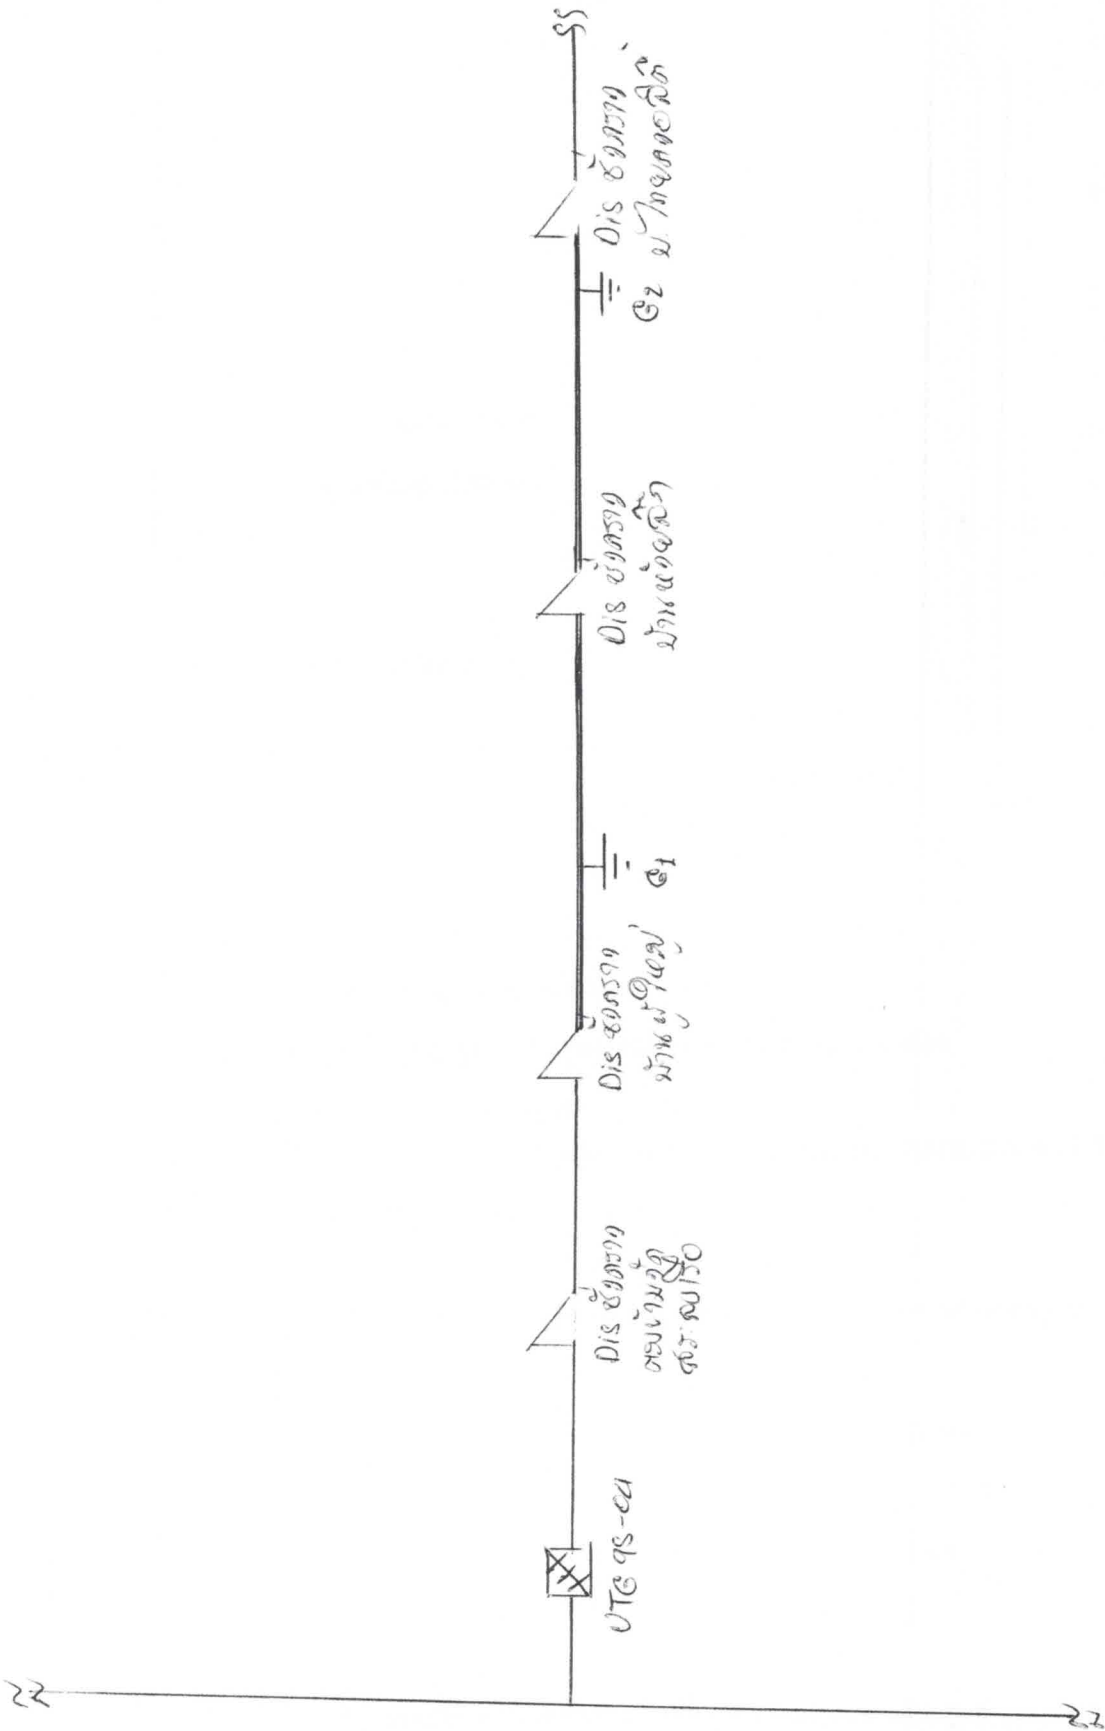

*[Handwritten Signature]*

( นายอนุชา ชำนาญเชื้อ )  
 ๑๗.๑๒.๑๓.๑๔.๑๕.๑๖.๑๗.๑๘.๑๙.๒๐.๒๑.๒๒.๒๓.๒๔.๒๕.๒๖.๒๗.๒๘.๒๙.๓๐.๓๑.๓๒.๓๓.๓๔.๓๕.๓๖.๓๗.๓๘.๓๙.๔๐.๔๑.๔๒.๔๓.๔๔.๔๕.๔๖.๔๗.๔๘.๔๙.๕๐.
