



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 มิ.ย. 64.

28/5/64
[Signature]

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๙๕๐๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน. พาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมรองรับสถานีฯ สค.๑๐ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน=๒=..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	KTE ๑๐	๖ มิถุนายน ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดก่อสร้าง กฟอ.กทบ. พาดสายเคเบิลแรงสูงวงจรใหม่เพิ่มเติมระบบ ๒๒ เครือ เพื่อรองรับสถานีฯ สค.๑๐ ถาวร	DIS ชั่วคราวติดตั้งใหม่ หน้าเสาไฟฟ้า	SFB KTE ๖S-๑๐ หน้าเสาไฟฟ้า	นายปรีชา แก้วสีม่วง ท.ผ.ส.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงานจำนวน ๓๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๙๕๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

[Signature]

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ KTE 10 จาก Dis.๑๐ หน้าเสาไฟฟ้า ถึง KTE 6S-10
ในวันที่ 6 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 744

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย [Signature] ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ [Signature] ข้าราชการสามัญ

26 พ.ค. 64

[Signature]
[Signature]
[Signature]

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าโรงงานแอสต้าโพน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มิ.ย. 64	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 744/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 4 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมโนช 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		L= 3.2 MW
3	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		L= 5.1 MW
4	ย้ายโหลด KTE10 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก KTE06						
5	KTE06S-07	ปลด	ล๊ပ်		กทบ.		DIS ชอยมมงคล
6	DIS ชค.	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		หน้าโรงงานแอสต้าโพน
7	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
8	KTE06S-10	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 หน้าโรงงานแอสต้าโพน
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
12	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
14	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
17	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
20	KTE06S-10	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		กทบ.		SF6 หน้าโรงงานแอสต้าโพน
21	ย้ายโหลด KTE10 (บางส่วน) กลับจาก KTE06						
22	DIS ชค.	ปลด	ล๊ပ်		กทบ.		DIS หน้าโรงงานแอสต้าโพน
23	KTE06S-07	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชอยมมงคล
24	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
25	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดำเนินการบริเวณช่วงให้แยกเทศมอดอเปิดดี - ไร่ขิงมะม่วง
 เพื่อให้ เทศ.ภทท. ปฏิบัติงานทดสอบแรงสูงเพิ่มเติมรองรับการจ่ายไฟสายไฟให้แยกอาคาร 10 อาคาร
 ในวันที่อาทิตย์ ที่ 6 มีนายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.
 (ตามอนุมัติ ก.3 ททบ.(กต.)-070 ลว. 11 มี.ค. 2564)
 WBS:P-TDD02.3-I-KYNNA.0003

หมายเหตุ มีผู้เข้าใช้ร่วมจะกะทบจำนวน 30 ราย

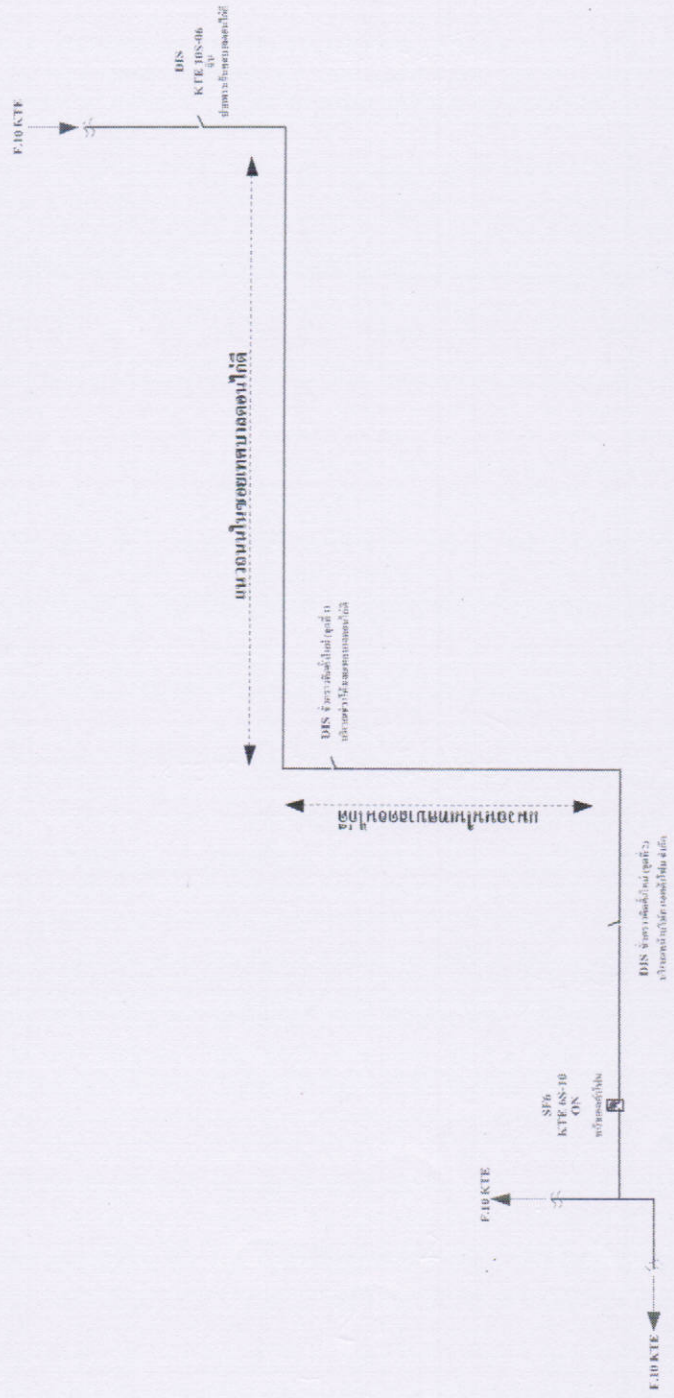


แผนผังสถานะปิดจุดดับ มัสซังบ่ไฟ บริเวณช่วงโค้งเขยทมาลงบ่ไฟดี - โค้งมะঝิด
 เพื่อให้ ผศ.กทท. ปฏิบัติงานทดสอบแรงสูงเพิ่มเติมรองรับการจ่ายไฟสองบ่ไฟให้ขุมทรมาตร 10 ถาวร
 ในวันที่ออกกิตช์ ที่ 6 ฝ่จนุขน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทท.(กส.).-070 สว. 11 ม.ค. 2564)
 WBS:P-TDD02.3-I-KYNNA.0003

หมายเหตุ มีผู้เข้าไฟได้รับผลกระทบจำนวน 30 ราย

เส้นทึบสีม่วงไล่ยาวที่ตลอด 10 กทท.ร.ค.บ่ไฟปฏิบัติงาน

จุด A - จุด B พื้นที่ล้นไฟปฏิบัติงาน

Shot Ground (G.1 - G.2)

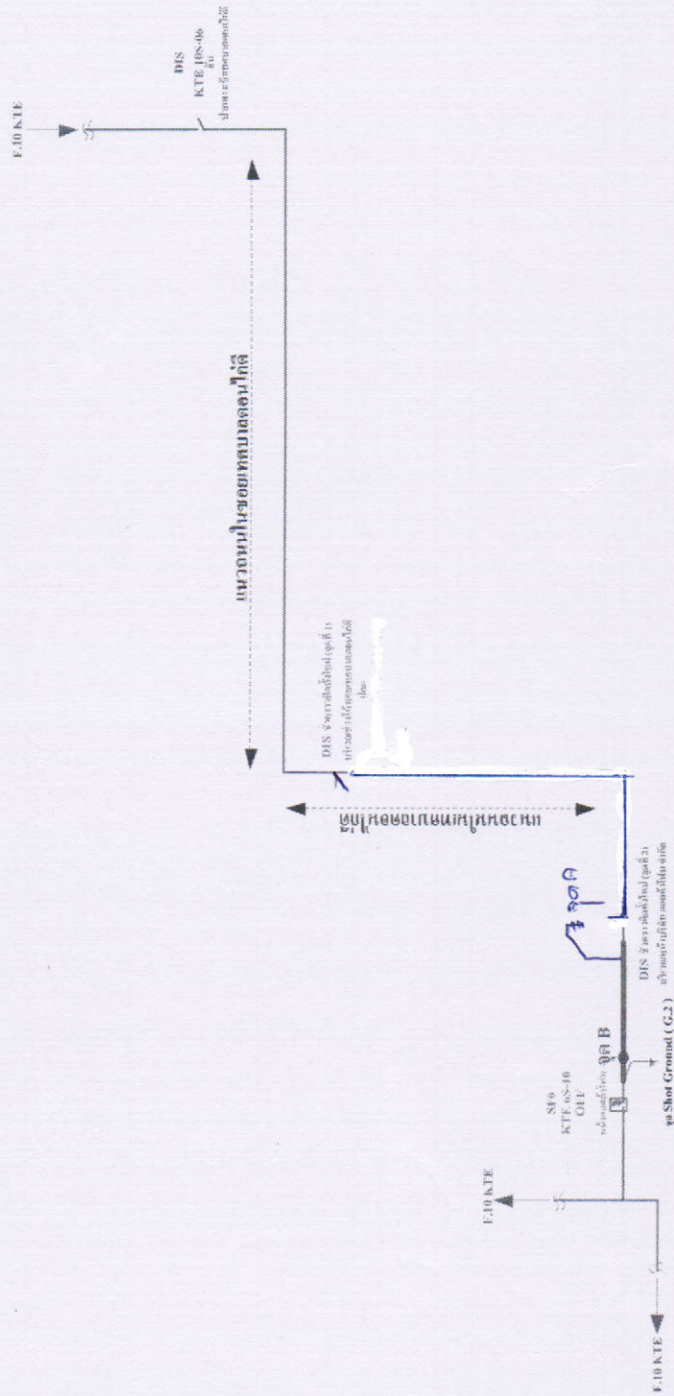

แนวถนนในขุมทรมาตรมาลงบ่ไฟดี

DPS 3 ขุมทรมาตรมาลงบ่ไฟดี 3ขุมทรมาตรมาลงบ่ไฟดี

จุดหยุดรถเบรกที่หน้าบ่ไฟ

DPS 3 ขุมทรมาตรมาลงบ่ไฟดี 3ขุมทรมาตรมาลงบ่ไฟดี

Shot Ground (G.1 - G.2)

E10 KTE

E10 KTE
