

Switching Deadline

10/06/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สช.(กป.) ๓๐๓ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายทศพันธ์ พิชิตสุวรรณพงษ์
 ชื่อผู้ส่ง นายพิษพงษ์ ภาวทอง

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒,๓ สถานีไฟฟ้า เดิมบวงวา และฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2,3 SPC 3	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟปักเสา Mono Pole และทาดสาย	DIS ชั่วคราว วงจรม DBAF3 บ้าน วังหว่า DIS ชั่วคราว วงจรม DBAF2 บ้าน วังหว่า SPC3S-09	DIS ชั่วคราว วงจรม DBAF3 บ้านวังหว่า DIS ชั่วคราว วงจรม DBAF2 บ้านวังหว่า SPC3S-10	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓ เครื่อง ๑๑๑.๑๕ ครัว. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๕ ครัว.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิษพงษ์ ภาวทอง)
 ผจก.กฟส.สช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียบน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA2,3 จาก Dis ๕๑ บ้านวังหว่า ถึง Dis ๕๑ บ้านวังหว่า
 ในวันที่ 13, 27 มิ.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 754/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPC3 จาก SPC3S-09 ถึง SPC3S-10
 ในวันที่ 13, 27 มิ.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เหลืองขจร ประสานงานการขอตัดไฟกับ สาขา กฟภ.๓ ไทย พิชิตพันธ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียบน ผจก. กฟส. ๕๕.
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายอภิสิทธิ์ เหลืองขจร)
 ๑๒๖. 5 แทน นพอ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า สฟพ.สามชุก (ถาวร) (DBA02,03, SPC03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13, 27 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสา Mono Pole และพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 754/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง		วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching							
2	หลังจาก กฟส.สามชุก แจ้ง VSPP บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเออี จำกัด (วงจร SPC03) หยุดขนานเรียบร้อย							
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
4	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-	
5	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.	R	หน้าราชวมงคล	
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-	
7	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 4.8 MW	
8	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	Load 4.3 MW	
9	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	ดงชี้เหล็ก	
10	ย้ายโหลดวงจร DBA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร SPC05 และย้ายโหลดวงจร DBA03 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร SPC03							
11	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
12	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
13	DBA03S-11	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	วังห้ว
14	Dis.ไลน์ DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังห้ว (กลาง)
15	Dis.ไลน์ DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังห้ว (บน)
16	DBA03S-11	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	วังห้ว
17	เมื่อพร้อมดับไฟ							
18	SPC03S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	โรงงานทิพย์สุพรรณ
19	Dis.ไลน์ DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังห้ว (กลาง)
20	Dis.ไลน์ DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังห้ว (บน)
21	SPC03S-09	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS	สะพานจองชัย
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
29	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
31	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
32	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
33	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
34	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
35	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
36	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R	ดงชี้เหล็ก
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ							
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
40	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
42	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4							
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5							
44	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6							
45	หลังจากทำการปลด Short ground ออกครบจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
46	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
47	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
48	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.		R	หน้าราชมงคล
49	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	-
50	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
51	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
52	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R	ดงชี้เหล็ก
53	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
54	Dis.ไลน์ DBA02	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังหิน (กลาง)
55	Dis.ไลน์ DBA03	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังหิน (บน)
56	SPC03S-09	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS	สะพานจองชัย
57	กฟส.สามชุก แจ้ง VSPP บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนออี จำกัด (วงจร SPC03) พร้อมรับไฟ							
58	SPC03S-10	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		SF6	โรงงานทิพย์สุพรรณ
59	ย้ายโหนดวงจร DBA02 บางส่วน กลับจากวงจร SPC05 และย้ายโหนดวงจร DBA03 บางส่วน กลับจากวงจร SPC03							
60	DBA03S-11	ปลด	ล๊ับ		สช.	SCADA	SF6	วังหั่ว
61	Dis.ไลน์ DBA02	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังหั่ว (กลาง)
62	Dis.ไลน์ DBA03	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS	ชั่วคราว บ้านวังหั่ว (บน)
63	DBA02S-08	ล๊ับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
64	DBA03S-07	ล๊ับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
65	DBA03S-11	ล๊ับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	วังหั่ว
66	กฟส.สามชุก แจ้ง VSPP บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนออี จำกัด (วงจร SPC03) ทำการขนานได้							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
68	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
69	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
70	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
71	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
72	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
73	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R	ดึงชี้เหล็ก
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

ต้นโพงน้ำสถานีไฟฟ้าสามชุก ปักเสา Mono Pole และพาดสายส่ง
และปักเสา Riser Pole

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
และวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

สถานีไฟฟ้าสามชุก

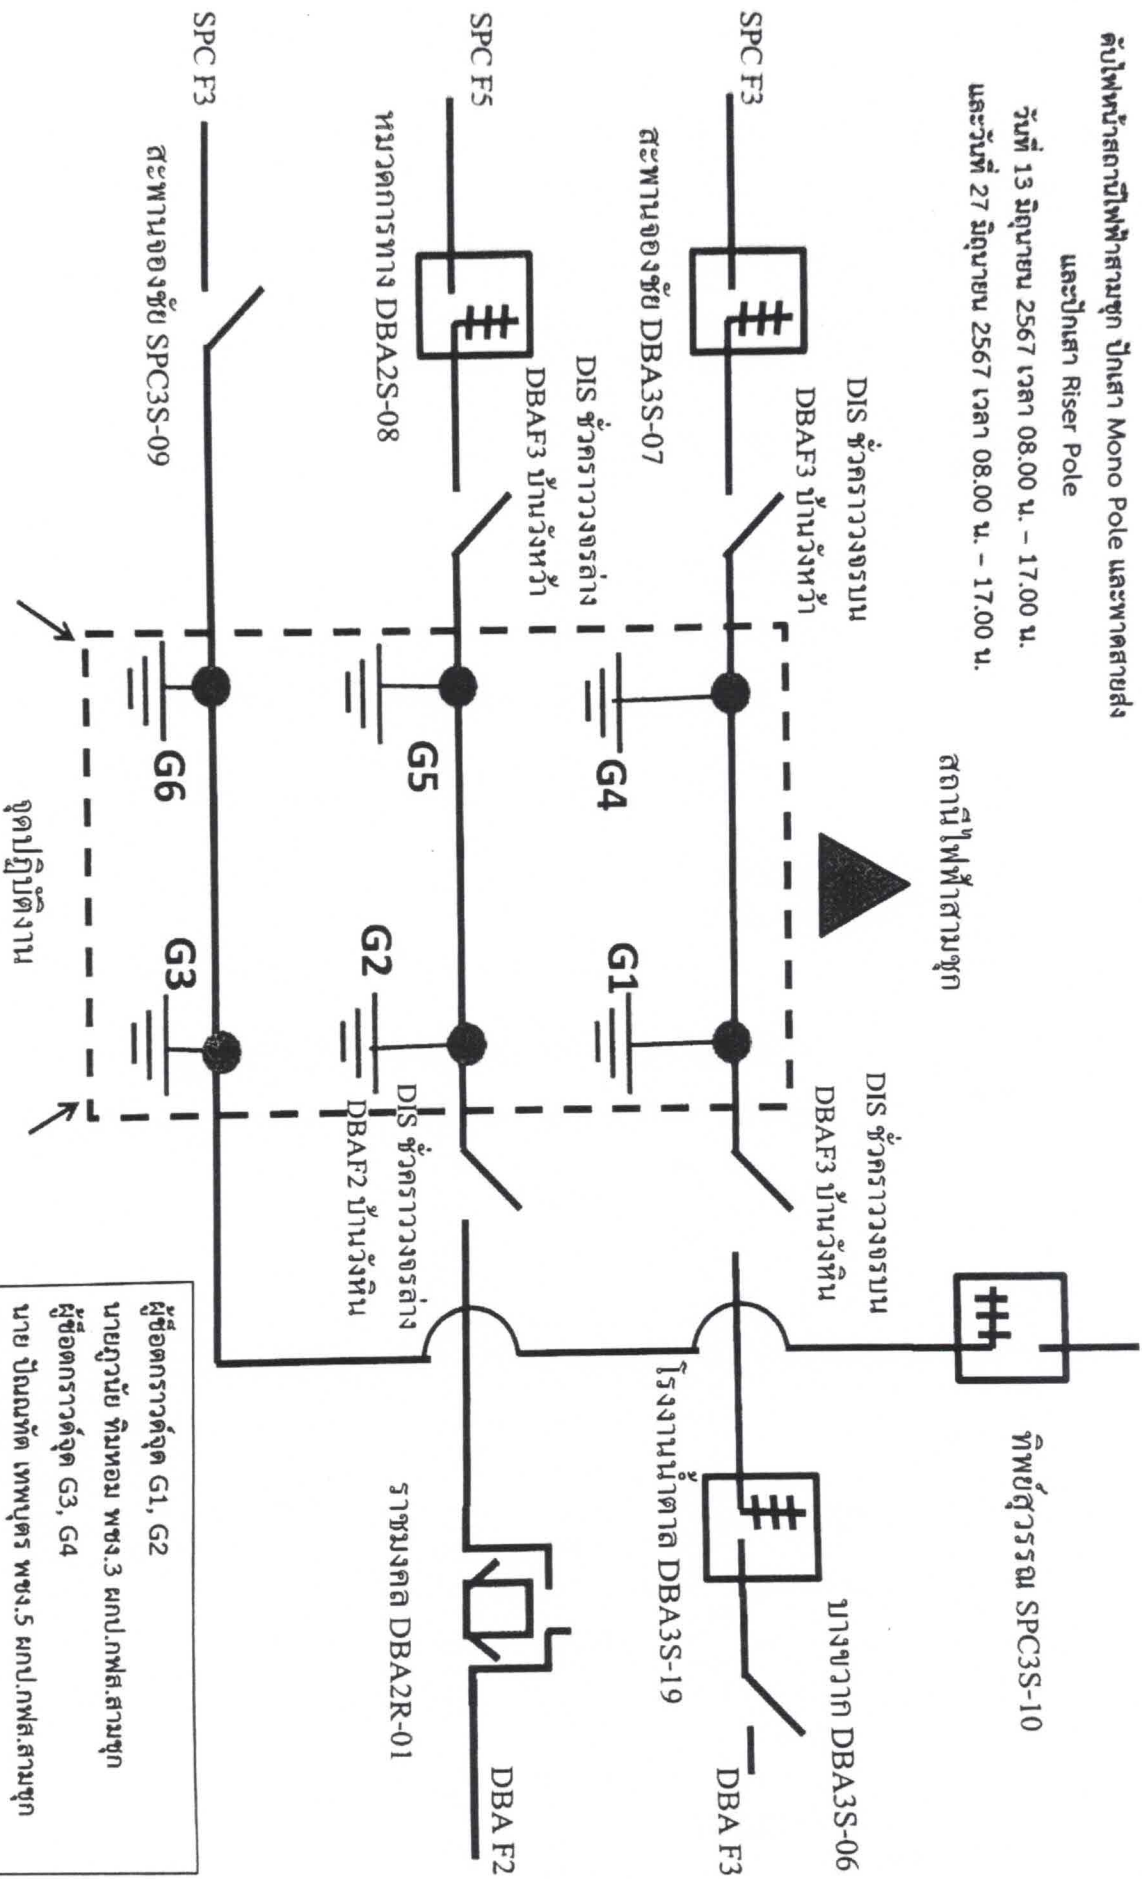

ผู้ซื้อคกราวจุดจุด G1, G2
นายภูวนัย ทิมหอม พงจ.3 ผกป.ภส.สามชุก
ผู้ซื้อคกราวจุดจุด G3, G4
นาย ปณณทัต เทพบุตร พงจ.5 ผกป.ภส.สามชุก
ผู้ซื้อคกราวจุดจุด G5, G6
นายธนัช จันทร์เพ็ญ ชชง. ผกป.ภส.สามชุก
