

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 575/2567
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 6 มิ.ย. 2567
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบนางนางวช. ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงาน บ.บริษัทเอ็นดีไซน์พาวเวอร์ ปฏิบัติงานติดตั้ง LBS ๑๑๕ เควี ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	9,10,11,12 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ติดตั้ง LBS ๑๑๕ เควี บ้านหนองกระทุ่ม	DBA 1YS-03 โหลด เบรก 115 เควี เปิดนายยิ้ม	DAA 1YB-01 สถานีด่านช้าง	นายอำนาจ กิตติ โพธิ์นันท์ วศก.9 กรย.(ก3) 086-2691259
2.	DAA 04	9,10,11,12 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.		ดิสชั่วคราวหน้าร้าน ครัวน้องไอซ์	ดิสชั่วคราวตรงข้าม รุ่งสวัสดิ์ค้าไม้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DAA 1YB-01 ถึง DBA 1YS-03 ณ โพนม
 ในวันที่ 9, 10, 11, 12 ก.ค. (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 768/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ DAA 4 จาก DBA 4YB-01 ถึง DBA 4YB-01 ณ โพนม
 ในวันที่ 9, 10, 11, 12 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัชชานันท์ ลาวศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวราภรณ์ ศักดิ์คง

9 มิ.ย. 67

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
 รจก.6 ปฏิบัติงานแทน ผจก.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหนองกระทุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9,10,11,12 ก.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง LBS 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	768/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	1 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ในวันที่ 9,10,11 ก.ค. 67 ดับไฟ 8.30 น. และจ่ายไฟคืนระบบ 16.30 น. ทั้งระบบสายส่ง 115 เควี และ 22 เควี							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ทำการ OFF ATS สถานีฯตามข้าง						
3	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 2.5 MW
4	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 2.2 MW
5	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
6	ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA05						
7	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
8	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านครัวน้องไอซ์
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
11	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอ็ม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
12	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอ็ม
13	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
14	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
18	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
20	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
21	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า (วันที่ 9, 10, 11 ก.ค. 67)							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
25	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
26	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบัว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้
29	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
30	DBA01YS-03	ปลด	สับ		ดบ.		LBS หน้าก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
31	ตรวจสอบสถานะ DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ close และโชว์สีแดงทั้ง 3 เฟส						
32	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
33	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
34	ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนกลับจาก DAA05						
35	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านครัวน้องไอซ์
36	DAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
37	ทำการ ON ATS สถานีฯ ด่านช้าง						
38	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
39	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
40	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น (วันที่ 9, 10, 11 ก.ค. 67)							
ในวันที่ 12 ก.ค. 67 ดับไฟ 8.30 น. และจ่ายไฟคืนระบบ 16.30 น. ทั้งระบบสายส่ง 115 เควี และ 22 เควี							
และ นำ LBS 115 เควี บ้านหนองกระทุ่ม (ติดตั้งใหม่) เข้าระบบ							
41	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
42	ทำการ OFF ATS สถานีฯ ด่านช้าง						
43	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
44	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
45	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัว
46	ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA05						
47	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
48	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านครัวน้องไอซ์
49	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
50	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้
51	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
52	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก๊าซเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
53	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
54	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
55	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
56	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
57	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
58	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
60	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
61	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัวช
62	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า (วันที่ 12 ก.ค. 67)							
63	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และทดสอบ AC-Withstand LBS 115 เควี บ้านหนองกระทุ่ม (ติดตั้งใหม่)						
64	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
65	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
66	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัวช
67	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
68	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้
69	ตรวจสอบ LBS 115 เควี บ้านหนองกระทุ่ม (ติดตั้งใหม่) อยู่สถานะ close โขว์สีแดงทั้ง 3 เฟส และ ไม่ Low gas						
70	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
71	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
72	เมื่อพร้อมทดสอบ AC-Withstand LBS 115 เควี บ้านหนองกระทุ่ม (ติดตั้งใหม่) เป็นเวลา 15 นาที						
73	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	เมื่อทำการทดสอบ AC-Withstand LBS 115 เควี บ้านหนองกระทุ่ม (ติดตั้งใหม่) เป็นเวลา 15 นาที แล้วเสร็จ						
75	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS กว้างเดี่ยวเปิดนายเย้ม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
77	DBA01YS-03	ปลด	สับ		ดบ.		LBS หน้ากวางเดี่ยวเปิดนายเย้ม
78	ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนกลับจาก DAA05						
79	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านครัวน้องไอซ์
80	DAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
81	ทำการ ON ATS สถานีฯด่านช้าง						
82	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
83	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
84	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางนางบัวช
สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น (วันที่ 12 ก.ค. 67)							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง Load Break Switch 115 เควี
 สายส่ง 115 เควีตั้งแต่ DBA1YS-03 โหลดเบรกเบรคเป็นด้ายเข็ม ถึง DAA1YB-01 สถานีต้นข้าง
 วงจร DAA 04 ตั้งแต่ DISชั่วคราวหน้าบ้านครัวร่องโอบซ์ ถึง DISชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสัดค้าไม้

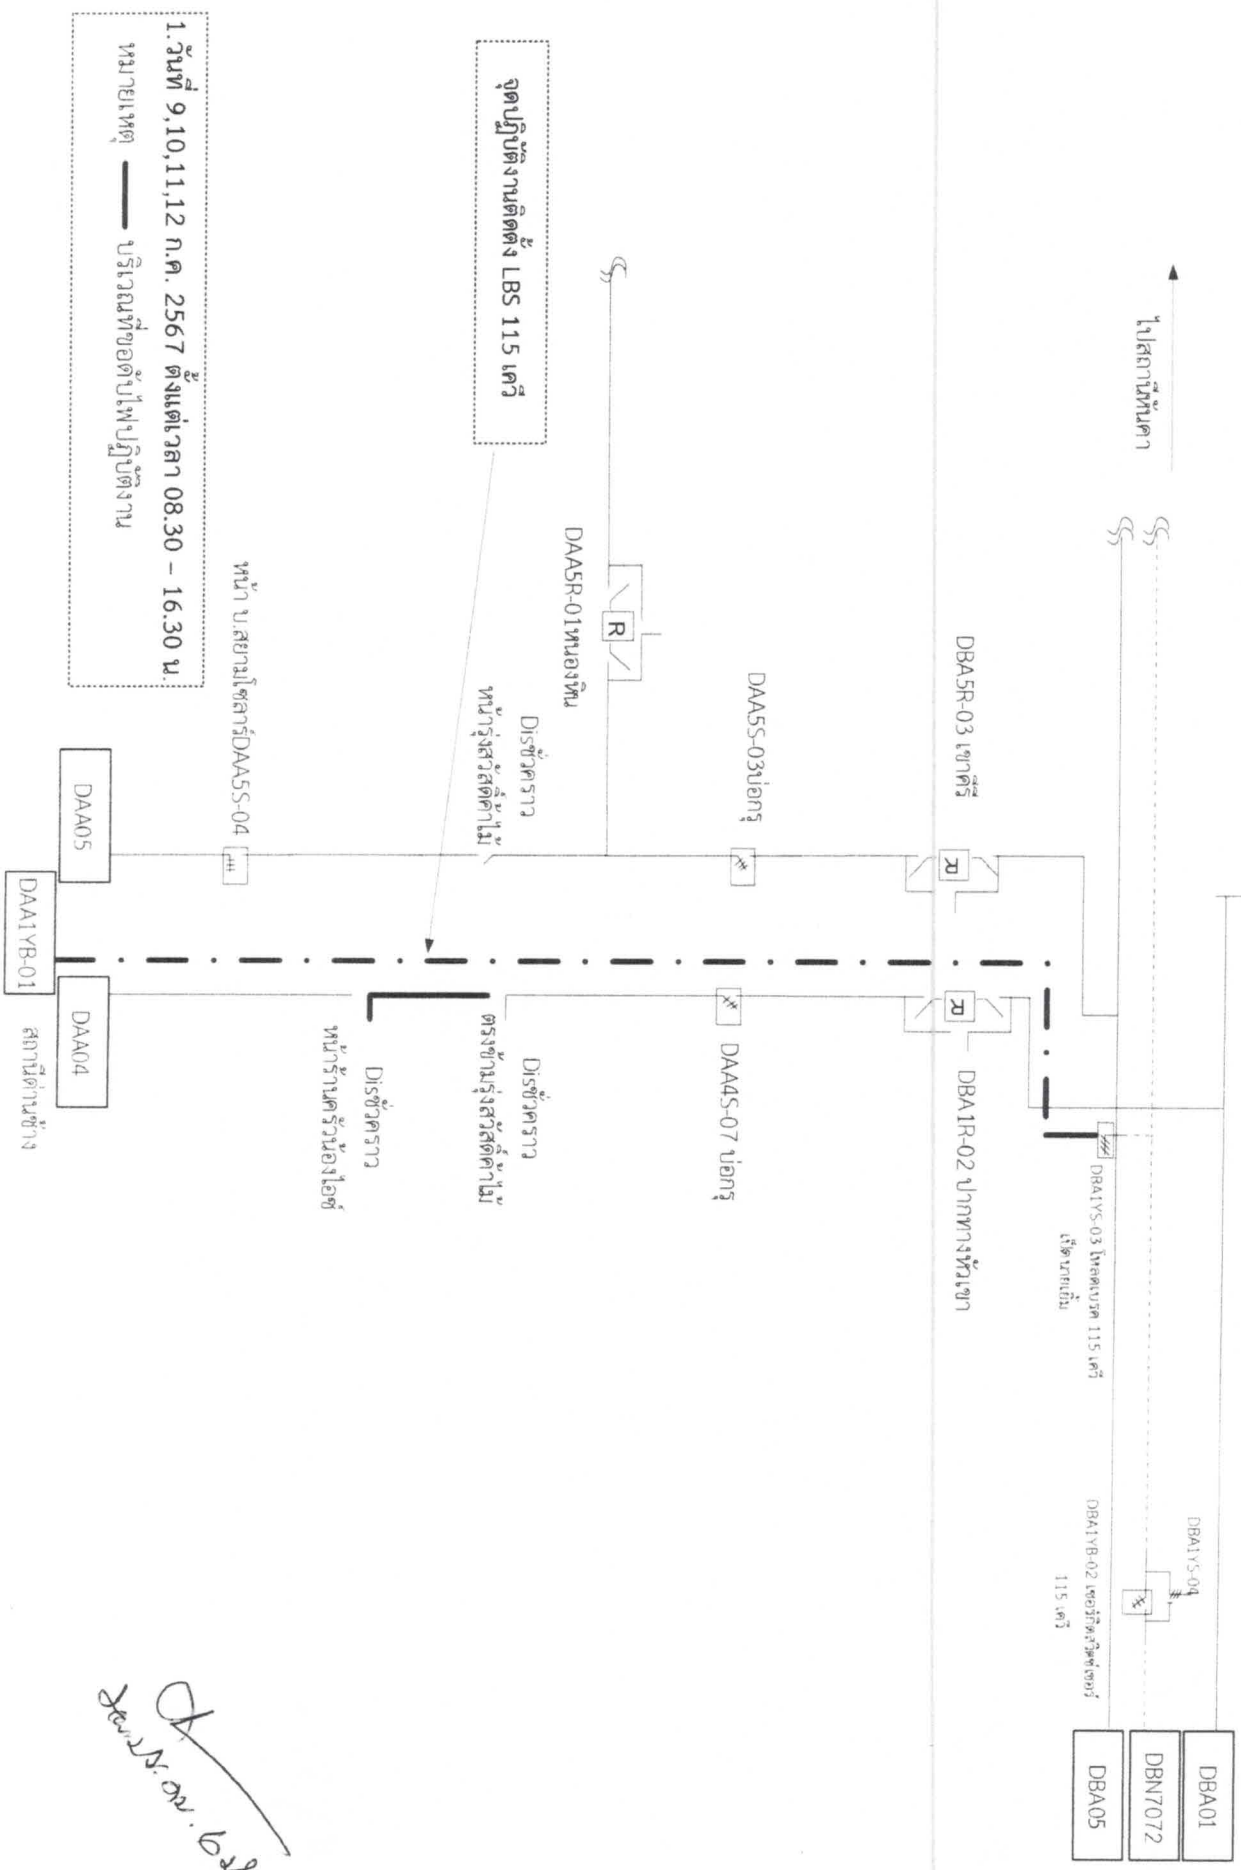

1. วันที่ 9, 10, 11, 12 ก.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Handwritten signature and date: ๒๕๖๗



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-24-480

วันที่ 1 มิถุนายน 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง กำหนดการดับไฟเพื่อติดตั้ง Load Break Switch 115 kV

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายวิริยะ พิทักษ์ตันสกุล)

สำเนาเรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วกศ.9 กรย.(ก3))

อ้างอิง สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน 1 ชุด

ตามที่อ้างอิง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟระบบ 22- 115 เควี เพื่อติดตั้ง Load Break Switch 115 kV ช่วงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3350 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชื่อมโยงสายส่ง 115 เควีที่ก่อสร้างใหม่เข้ากับระบบจำหน่ายเดิม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรภัทร ลือขจร)

ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา
นางสาวกัญญ์วารินธุ์ วงษ์สนอง
093-329-8963

ແມ່ນາບຕັດຕັ້ງ Load Break Switch 115 kV

ຕາມບັນທຶກ P264 (4 ວັນ)

ຕໍາແໜ່ນໄຟສະເໜີ 22 - 115 ເຕັ້

- ກຸ້ວທີ່ 1 ວັນທີ່ 9 ກສະຫວາຍ 2567
- ກຸ້ວທີ່ 2 ວັນທີ່ 10 ກສະຫວາຍ 2567
- ກຸ້ວທີ່ 3 ວັນທີ່ 11 ກສະຫວາຍ 2567
- ກຸ້ວທີ່ 4 ວັນທີ່ 12 ກສະຫວາຍ 2567

