



Switching Deadline
๕ มิ.ย. ๖๔

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๕๑๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงศ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมวงจรใหม่.....ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTE ๑๐	๕ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดก่อสร้าง กฟอ.กทบ. พาดสาย เคเบิลแรงสูงวงจรใหม่เพิ่มเติม	DIS ชั่วคราวติดตั้งใหม่ บริเวณช่วงโค้งเลย เทศบาลต่อนไถ่	DIS ชั่วคราวติดตั้งใหม่ บริเวณหน้าบริษัท แอตต้าโพน จำกัด	นายปรีชา แก้วสีม่วง ทพ.กส.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

M.
(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ KTE10 จาก Dis 101100001 ถึง Pl 110๓๓1/10
ในวันที่ 5 มิ.ย.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๕๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก.กฟอ.กทบ.
๑๕ มิ.ย. ๖๔

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	โค้งเทศบาลดอนไก่อี - หน้าโรงงานแอสต้าโพน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มิ.ย. 64	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 792/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง	วันที่ 4 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมนอช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		L= 5.1 MW
3	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		L= 7.0 MW
4	ย้ายโหลด KTE10 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก KTE06						
5	KTE06S-07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ชอยมมงคล
6	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS โค้งเทศบาลดอนไก่อี
7	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
8	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าโรงงานแอสต้าโพน
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
12	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
14	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
17	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2 ชื่อผู้ดำเนินการ.....เวลา.....						
20	DIS ชค.	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าโรงงานแอสต้าโพน
21	ย้ายโหลด KTE10 (บางส่วน) กลับจาก KTE06						
22	DIS ชค.	ปลด	สับ		กทบ.		DIS โค้งเทศบาลดอนไก่อี
23	KTE06S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชอยมมงคล
24	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
25	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

แผนผังสถานะปัจจุบัน ถัดมาจะมีไป บริเวณช่วงโค้งแยกเทศบาลดอนใต้ - ใต้มะขาม
 เพื่อให้ กศ.กทท. ปฏิบัติงานเพื่อขยายถนนจราจรบริเวณระยะ 22 หลี เพิ่มเติม
 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.
 (ตามอนุวัติ ก.3 กทท.(กศ.)-070 ตว. 11 น.ก. 2564)

WBS: P-TDD02.3-1-KYNNA.0003

มีผู้ใช้ได้รับผลกระทบจำนวน 10 ราย

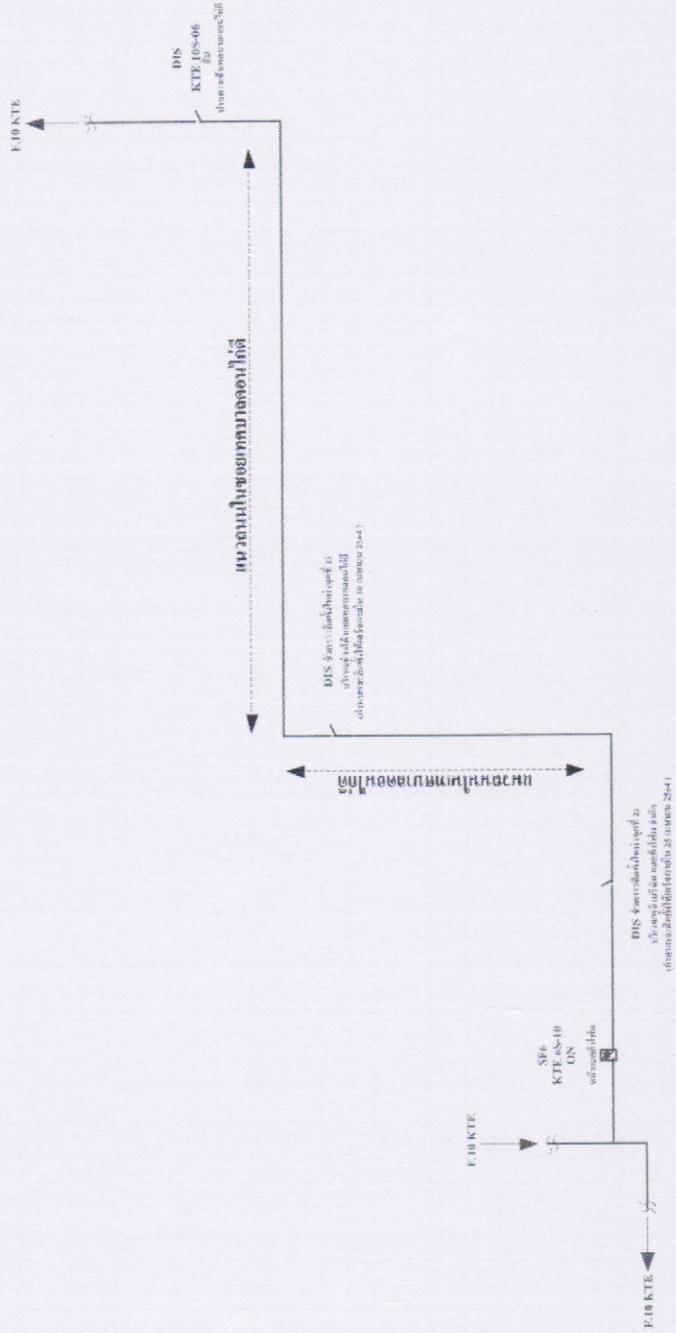

แผนผังสถานะปัจจุบัน ขณะเปิดไฟ บริเวณช่วงโถงเชื่อมต่อห้อง - โถงระฆัง
เพื่อให้ ผด.กทบ. ปฏิบัติงานทดสอบติดตั้งเครื่องรับวงจรระบบ 22 ครี เพิ่มเดิม

ในวันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.

(ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(กส.)-070 อ.ว. 11 ม.ภ. 2564)

WBS:P-TDD02.3-1-KYNNA.0003

