



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

15 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๓๑๕๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณขลิ
ชื่อผู้ส่ง นายวีโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV เพื่อ ติดตั้ง SF๖ ปากทางชอย ๑๕ นิคมฯสมุทรสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๐๓	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV เพื่อ ติดตั้ง SF๖ ปากทางชอย ๑๕ นิคมฯสมุทรสาคร	SF๖ ติดตั้งใหม่ ตรงข้าม บ.แม่ไก่ โชเฟ้น	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้าหน้า บริษัท ชิวามาลา	นายไชยรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร. ๐๘๐๙๑๗๗๑๙๑
๓๒	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ชอย ๑๔	THS๖S-๐๗ ก่อน นิคมฯ ชอย ๑๔	
๒	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ชอย ๑๔	THS๖S-๐๔ บ.อุตสาหกรรม สลักภัณฑ์	
๓	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ชอย ๑๔	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า บริเวณ ทางเข้านิคมฯ ชอย ๑๕	
๔	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ชอย ๑๔	THU๔S-๐๔ ปากทางนิคมฯ ชอย๑๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..บริเวณ ..ปากทางนิคมฯ ชอย ๑๔ - ๑๕ จำนวน ๔ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๑๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสดำรง ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๑.๓ พิกัด 13.550187, 100.224550 - 13.550364, 100.225213
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายวีโรจน์ เอกอำไพ)


ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ THS3 จาก 3 ฟิวส์บ้าน A.1.1.1 ถึง DDE U. ไคมาว
ในวันที่ 16 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 813/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ THUY จาก THUY1-03 ถึง DDE 1กพ.15 THUY45-04
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนุสรณ์ อรรถปภินันท์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น บล.พร้อม


(นายอนุสรณ์ อรรถปภินันท์)
206.5 กก. นว.ฉ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟ.ส.๓.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

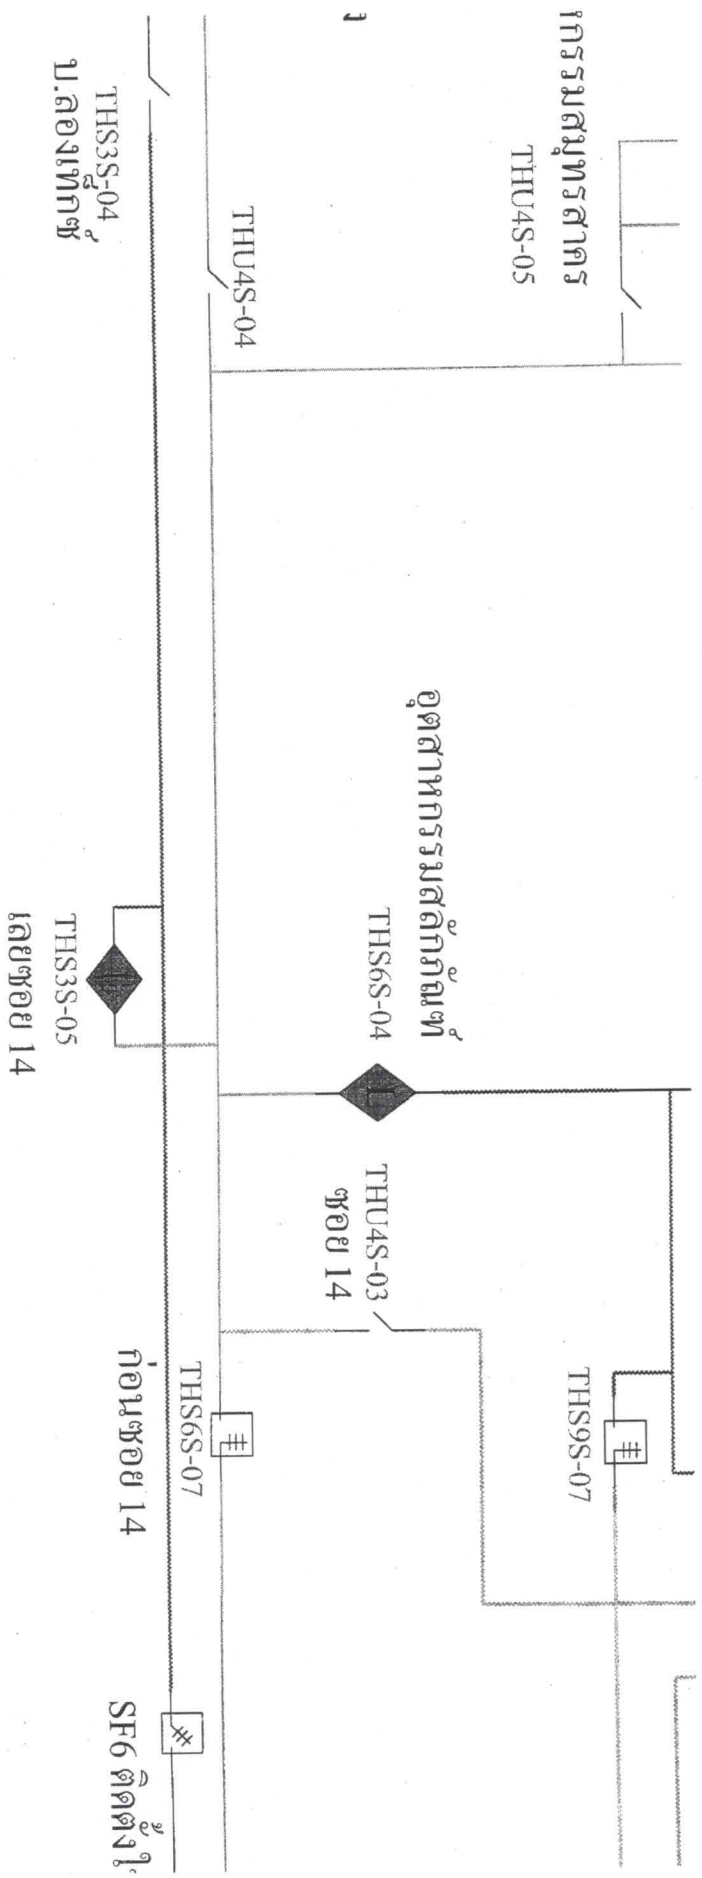
1. สถานที่ทำงาน ไลน์ THU03,04 บริเวณ ปากทางซอย 15 นิคมท่าทราย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 มิ.ย. 67 เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบและติดตั้ง SF6 THU04S-07 ตามใบขอปฏิบัติงาน 813/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิช,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
3	THU0BR-03	Normal	Nonreclosing,GND		THU		
4	THU0BR-04	Normal	Nonreclosing,GND		THU		
5	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
6	SMZ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
7	SMZ04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
8	SMZ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
9	- ย้ายโหลด THS03 ไปจ่ายจาก THU04						
10	THS03S-05	ปลด	ล๊اب		สค.	SF6	เลขช.14 (Loopบน-ล่าง)
11	SF6ไลน์ THS03	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ตรงข้ามบ.แม่โขงเพ้น (ล่าง)
12	- ย้ายโหลด THU04 ไปจ่ายจาก THU03						
13	THU03S-04	ปลด	ล๊اب		สค.	SCADA SF6	ปากช.14
14	THU04S-03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ปากช.14
15	- ย้ายโหลด THS03 ไปจ่ายจาก SMZ04 และ THU04 ไปจ่ายจาก SMZ05 ,SMZ02						
16	THS05S-09	ปลด	ล๊اب		สค.	SCADA SF6	หน้าบ.ลองเท็กซ์ (บน)
17	THS03S-04	ปลด	ล๊اب		สค.	DIS	หน้าบ.ลองเท็กซ์ (ล่าง)
18	THS03S-05	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	เลขช.14 (Loopบน-ล่าง)
19	SMB12S-06	ปลด	ล๊اب		สค.	DIS	ปากช.ร.ร.บ้านยกกระบัตร
20	THU04S-04	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	เลขช.15 (บน)
21	THU03S-04	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SCADA SF6	ปากช.14
22	- ดับไฟไลน์ THU03,THU04 เวลา 08.00 น.						
23	กฟจ.สค.ตรวจสอบ SF6 รหัส THS06S-04 บริเวณก่อนซอย 14 (บน) ให้ปลดโซว"OFF"พร้อมล๊อคคานไว้						
24	แจ้งกฟจ.สค.ทำการปลดโหลดไลน์ THU03(ล่าง) ,THU04(บน) ออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.ออกทั้ง 2 จุด						
25	หลังจากกฟจ.สค.ทำการปลดโหลดไลน์ THU03,THU04 ออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
26	แจ้ง HL. 22 KV ทำการตัด DDE.ไลน์ THU03 บริเวณหน้าบ.ชีวมามา (ล่าง) ออกจากกันทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
27	หลังจาก HL. 22 KV ทำการตัด DDE.ไลน์ THU03 บริเวณหน้าบ.ชีวมามา (ล่าง) ออกจากกันทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
28	แจ้ง HL. 22 KV ทำการตัด DDE.ไลน์ THU04 บริเวณปากซอย 15 ออกจากกันทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
29	หลังจาก HL. 22 KV ทำการตัด DDE.ไลน์ THU04 บริเวณปากซอย 15 ออกจากกันทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สค.รับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	แจ้งกฟส.สค.ทำการทดสอบไฟดับแล้วช็อตกราวด์ จุด G1						
32	แจ้งกฟส.สค.ทำการทดสอบไฟดับแล้วช็อตกราวด์ จุด G2						
33	แจ้งกฟส.สค.ทำการทดสอบไฟดับแล้วช็อตกราวด์ จุด G3						
34	แจ้งกฟส.สค.ทำการทดสอบไฟดับแล้วช็อตกราวด์ จุด G4						
35	แจ้งกฟส.สค.ลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
36	แจ้งกฟส.สค.ปฏิบัติงานทำงานได้ทุกชุด						
37	หมายเหตุ : แจ้งกฟส.สค.ให้รับทราบว่ามีสายส่ง 115 KV.ด้านบนมีไฟอยู่						
38	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
39	THU0BR-03	Nonreclosing,GND	Normal		THU		
40	THU0BR-04	Nonreclosing,GND	Normal		THU		
41	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		
42	SMZ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		
43	SMZ04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		
44	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
45	หลังจากกฟส.สค.ปฏิบัติงานทำงานเสร็จทุกชุด						
46	แจ้งกฟส.สค.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
47	แจ้งกฟส.สค.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
48	แจ้งกฟส.สค.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3 ออก						
49	แจ้งกฟส.สค.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4 ออก						
50	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
51	THU0BR-03	Normal	Nonreclosing,GND		THU		
52	THU0BR-04	Normal	Nonreclosing,GND		THU		
53	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
54	SMZ02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
55	SMZ04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
56	SMZ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		
57	- จ่ายไฟ THU03,THU04						
58	กฟจ.สค.ตรวจสอบ SF6 รหัส THU04S-07 บริเวณข้างบ.ส.ขอนแก่น (ติดตั้งใหม่วงจรบน THU04) ให้ปลดโซลาร์"OFF"พร้อมล็อคคานไว้						
59	แจ้ง HL. 22 KV ทำการจี้ม DDE.ไลน์ THU03 บริเวณหน้าบ.ชีวามาลา (ล่าง) เข้าทั้งสามเฟส						
60	หลังจาก HL. 22 KV ทำการจี้ม DDE.ไลน์ THU03 บริเวณหน้าบ.ชีวามาลา (ล่าง) เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
61	แจ้ง HL. 22 KV ทำการจี้ม DDE.ไลน์ THU04 บริเวณปากซอย 15 เข้าทั้งสามเฟส						
62	หลังจาก HL. 22 KV ทำการจี้ม DDE.ไลน์ THU04 บริเวณปากซอย 15 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
63	THU03S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากช.14
64	แจ้งกฟจ.สค.ทำการจ่ายโหลดไลน์ THU03(ล่าง) ,THU04(บน) เข้าได้						
65	- ย้ายโหลด THS03 กลับคืนจาก SMZ04 และ THU04 กลับคืนจาก SMZ05 ,SMZ02						
66	THU04S-07	ปลด	สับ		สค.	SF6	ข้างบ.ส.ขอนแก่น (บน)
67	THU04S-04	ปลด	สับ		สค.	DIS	เลขช.15 (บน)
68	SMB12S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ปากช.ร.ร.บ้านยกกระบัตร
69	THS03S-05	ปลด	สับ		สค.	SF6	เลขช.14 (Loopบน-ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	THS03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	หน้าบ.ล่องเท็กซ์ (ล่าง)
71	THS05S-09	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	หน้าบ.ล่องเท็กซ์ (บน)
72	- ย้ายโหลด THS03 กลับคืนจาก THU04							
73	SF6ไลน์ THS03	ปลด	สับ		สค.		SF6	ตรงข้ามบ.แม่โขงเฟ้น (ล่าง)
74	THS03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	เลขช.14 (Loopบน-ล่าง)
75	- ย้ายโหลด THU04 กลับคืนจาก THU03							
76	THU04S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS	ปากช.14
77	THU03S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ปากช.14
78	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU			
79	THU0BR-03	Nonreclosing,GND	Normal		THU			
80	THU0BR-04	Nonreclosing,GND	Normal		THU			
81	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ			
82	SMZ02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
83	SMZ04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			
84	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

สถานะการจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน



สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

