



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
26 มิ.ย. 2567

เลขที่ ก.๓ ...../๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรีดออน RECLOSER และดำเนินการติดตั้ง SF6 แทน ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สฟ.๒	๒๙/๐๖/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายแรงสูงข้าม ถนน สฟ.๒ ช่วงที่ ๓ บริเวณ ถนนเลี้ยวเมืองบ้านสามเหลี่ยม	Dis ชั่วคราว สะพานลอย สามเหลี่ยม	DDE จุด A หน้า ปั้มน้ำมันบางจาก	โทร.๐๖๑-๘๒๖๓๓๘๑ นายเดชาวัต คงเจริญ
๒	DOA08		๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายแรงสูงข้าม ถนน สฟ.๒ ช่วงที่ ๓ บริเวณ ถนนเลี้ยวเมืองบ้านสามเหลี่ยม	DIS บ้าน สามเหลี่ยม doa๐๘s-๐๘	DDE จุด B แยกสถานีวิทยุ	โทร.๐๖๑-๘๒๖๓๓๘๑ นายเดชาวัต คงเจริญ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลงเฉพาะไลน์ ๗ เครื่อง และในระบอบ PEA ๑ เครื่อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พท.๕ (สข.) โทร. ๐๘๕-๔๘๘๔-๘๗๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา )

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟภ.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 5 PPO4 จาก PVE ๒๕-๒๖-๒๗ ถึง PVE ๒๖-๒๗  
ในวันที่ 29 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 867/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ PQA06 จาก PQA 0๖s-09 ถึง PVE (แยกสถานีวิทยุ)  
ในวันที่ 29 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กวีวรรณ์ เสงมาสิง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อิสรา เอื้อประเสริฐชัย

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา )

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๗ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี) -

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.สพ., กฟภ.อ.บ., กฟภ. ๕๐๓

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสามเหลี่ยม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	867/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	21 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายสุภกรสวัสดิ, นายอนุสรณ์, นายชนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
3	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
4	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
5	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
6	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
7	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
8	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
9	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
10	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
11	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
12	DOA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	วัดพันต่าลิง
13	UTV01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	ตรงข้ามอุโมงค์ไปโอแมส
14	UTG08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สดง.	R	R.แยกสังขจาย
15	<b>ย้ายโหลด DOA08 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG02</b>						
16	DOA08S-14	ปลด	สับ		สพ.	Scada	SF6 บ้านสามเหลี่ยม
17	DOA09S-07	ปลด	สับ		สพ.	Scada	SF6 บ้านหนองกุฎี
18	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.	Scada	SF6 รร.รัตนศึกษา
19	DOA08S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	บ.สามเหลี่ยม
20	DOA09S-07	สับ	ปลด		สพ.	Scada	SF6 บ้านหนองกุฎี
21	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	Scada	SF6 รร.รัตนศึกษา
22	<b>ย้ายโหลด SPB04 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG08</b>						
23	DOA09S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 สามเหลี่ยม
24	UTG08S-07	ปลด	สับ		สดง.	Scada	SF6 บ้านไผ่ม่วง
25	DIS ชั่วคราว SPB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	สะพานลอยสามเหลี่ยม
26	UTG08S-07	สับ	ปลด		สดง.	Scada	SF6 บ้านไผ่ม่วง
27	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
28	แจ้งชุดงานไลน์โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DISชั่วคราวสะพานลอยบ้านสามเหลี่ยม ถึง หน้าบ่ิมบางจาก ออก						
29	เมื่อชุดงานไลน์โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DISชั่วคราวสะพานลอยบ้านสามเหลี่ยม ถึง หน้าบ่ิมบางจาก ออกแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งชุดงานไลน์โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DIS DOA08S-09 บ้านสามเหลี่ยม ถึง แยกสถานีวิทยุ ออก						
31	เมื่อชุดงานไลน์โหลดหม้อแปลง ตั้งแต่ DIS DOA08S-09 บ้านสามเหลี่ยม ถึง แยกสถานีวิทยุ ออกแล้วเสร็จ						
32	แจ้งชุด HOTLINE ตัดDDE จุดA บริเวณหน้าป้อมบางจาก ออกทั้ง 3 เฟส						
33	เมื่อชุด HOTLINE ตัดDDE จุดA บริเวณหน้าป้อมบางจาก ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
34	แจ้งชุด HOTLINE ตัดDDE จุดB บริเวณแยกสถานีวิทยุ ออกทั้ง 3 เฟส						
35	เมื่อชุด HOTLINE ตัดDDE จุดB บริเวณแยกสถานีวิทยุ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
37	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
38	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
39	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G3						
40	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G4						
41	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
42	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
43	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
44	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		
45	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		
46	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
47	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
48	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
49	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
50	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
51	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
52	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
53	DOA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	วัดพันตาลีง
54	UTV01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	ตรงข้ามอุโมงค์ไปโอแมส
55	UTG08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สตง.	R	R.แยกสังขจาย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
56	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
57	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G1						
58	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G2						
59	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G3						
60	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G4						
61	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
62	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
63	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
64	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
65	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
66	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
67	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		





**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๒๙ มิ.ย.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ โค้งสะพานเลี้ยวเมืองสามเหลี่ยม(ฝั่งบึงเอสโซ่) และฝั่งตรงข้ามบริเวณแยกสถานีวิทยุ เพื่อรื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูงข้ามถนน สถานีสุพรรณบุรี ๒ ช่วงที่๓ โดยมีรายละเอียดวงจรฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ ฟีดเดอร์ ๔ สถานีฯ สุพรรณบุรี ๒ ตั้งแต่บริเวณ DISชั่วคราวสะพานลอยสามเหลี่ยม- DDEจุดA บึงบางจาก ฟีดเดอร์ ๘ สถานีฯ ดอนเจดีย์ ตั้งแต่บริเวณ DOA๐๘S-๐๙ (disบ้านสามเหลี่ยม) - DDEจุดB แยกสถานีวิทยุ

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ เดชาวัต คงเจริญ ตำแหน่ง พชง.๖ ผกส.กฟจ.สพ โทร ๐๖๑-๘๒๖ ๓๓๘๑ เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทผ.กส.กฟจ.สพ โทร ๐๙๘-๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

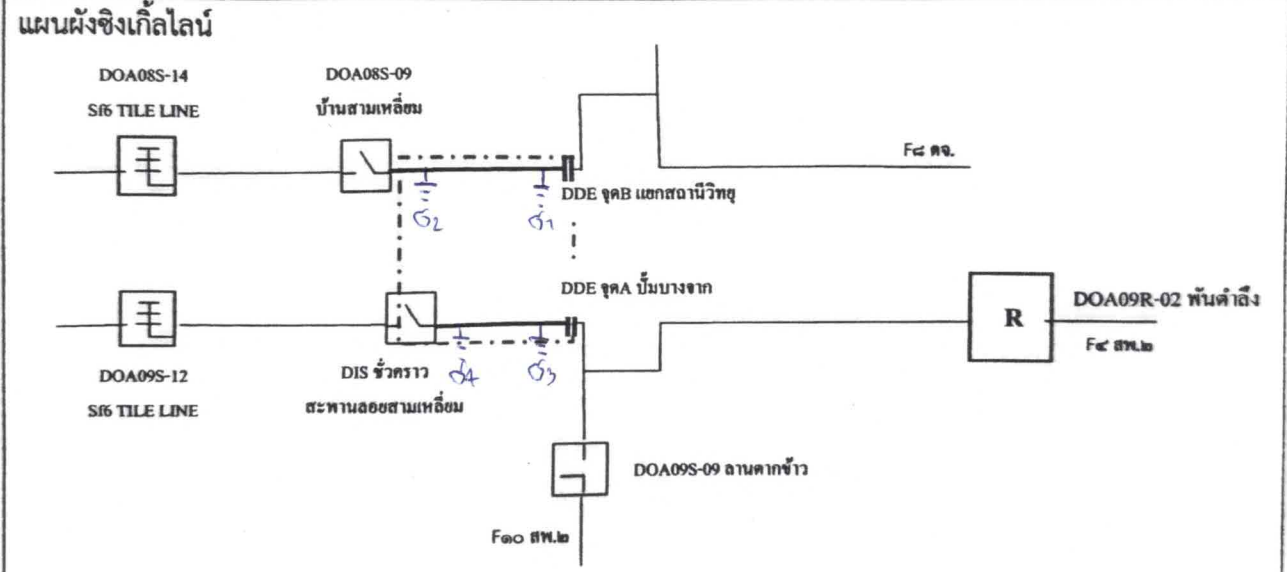

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูงข้ามถนน

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน Hotlineสพ.ตัดเขต ๒จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊สไฟช็อตกราวด์ ๔ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

ออก  
( นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย )  
พชง.๕(สช.) ผบ.กฟจ.สพ.

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา )  
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
