



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
R PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.๓ พทท. / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราวสุวรรณ์ชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๗-๒๙ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้าน สระลงเรือ-บ้านกรอกตาโพธิ์	ดิสชั่วคราว หน้าห้องแถว วัดสระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ๐ ..... ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายบรรดิษฐ์ มั่งคั่ง ตำแหน่ง ขผ.กป. โทร ๐๖๓๒-๒๑๓๓๘๘๑๐

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....  
( นายสุรวุฒิ บุญนาค )  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน  
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ UTG 5 จาก ดิสชั่วคราว หน้าห้องแถว วัดสระลงเรือ ถึง ดิสชั่วคราว บ้านกรอกตาโพธิ์  
ในวันที่ ๒๗-๒๙ มิ.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ ๘๘๒/๖๗  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัฏ บุญสุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย บรรดิษฐ์ มั่งคั่ง

ลงชื่อ .....  
( นายบรรดิษฐ์ มั่งคั่ง )  
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผ.จก. พทท.  
อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจพ. .... (สถานี ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดสระลงเรือ - บ้านตลกตาโพธิ์ (ดับเข้า-จ่ายเย็น)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 - 29 มิ.ย. 2567	เวลา	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน. งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 882/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 25 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	Block	หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	Block	หจก.	SCADA	R บ้านตลกเหนือ
7	- ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
8	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนานบัส
9	UTG05S-13	ปลด	สับ		หจก.		DIS จงเรือวัสดุก่อสร้างบ้านตลกเหนือ
10	DIS ชค. UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS ตรกตาโพธิ์
11	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
12	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
13	DIS ชค. UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS หน้าห้องแถววัดสระลงเรือ
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1 -
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
20	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R บ้านตลกเหนือ
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
28	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
29	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
31	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
32	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	DIS ชค. UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS หน้าห้องแถววัดสระลงเรือ
34	- ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับจาก UTG09						
35	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนานบัส
36	DIS ชค. UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS ตรอกตาโพธิ์
37	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS จงเรือวังสดุก่อสร้างบ้านตลุงเหนือ
38	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
39	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1
40	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2
41	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
42	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนผังวัดค่าแรงดัน

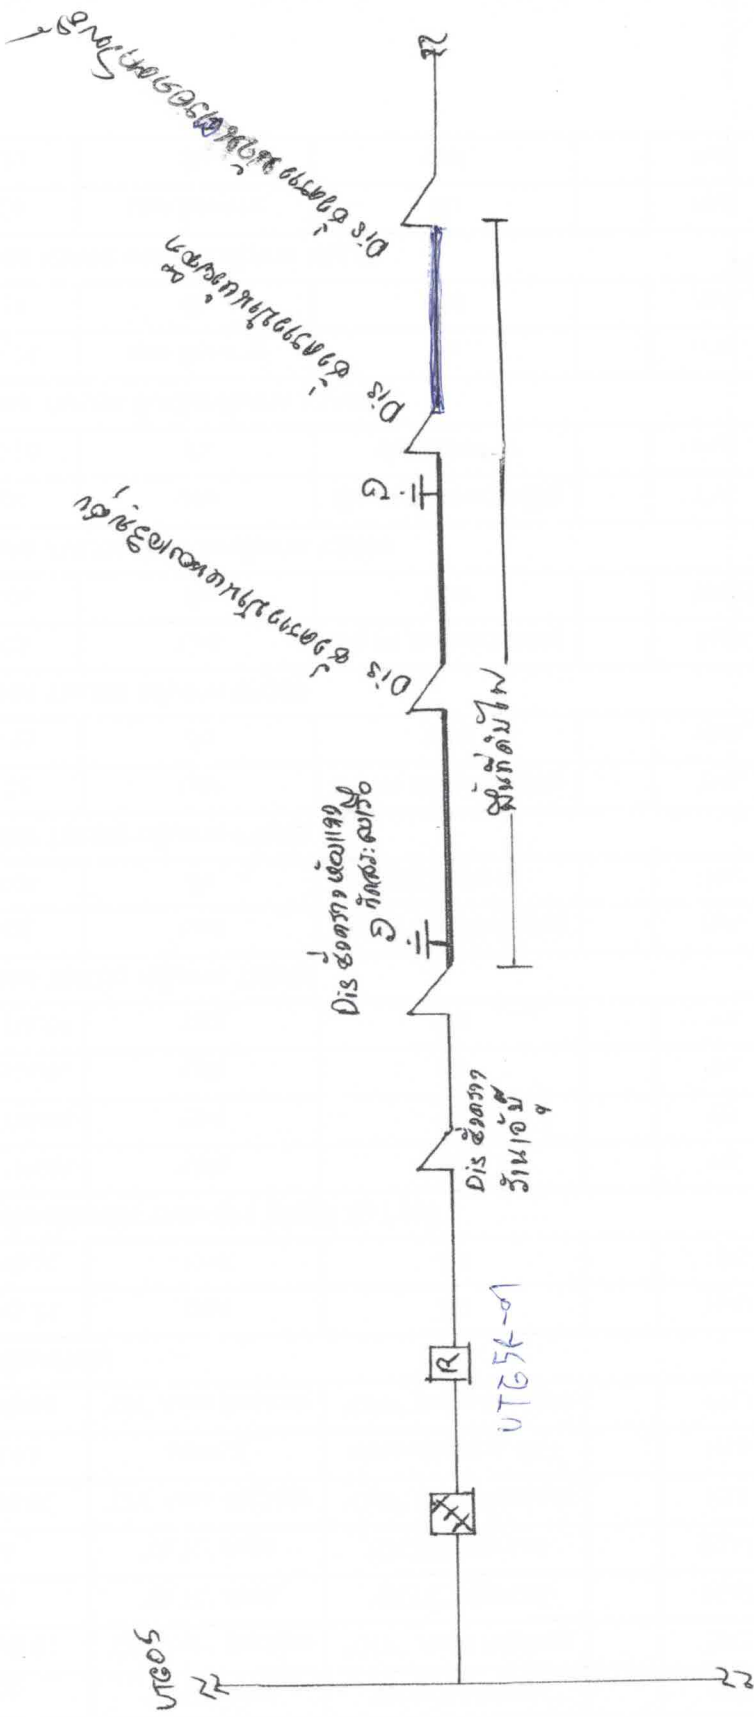

Ony

( นายอนุชา ชำนาญเรือ )  
ชน.ภป.ภพส.อ.พทน.
